

預計進度90.15%實際進度87.24% (至113/06/15止)


依據113年2月20日嘉監總字第11300334360號函，核定展延工期44日曆天

國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程預定進度甘特圖

工程金額：原契約新台幣23,230,000元整(含稅) 第一次變更設計新台幣24,112,621元整(含稅)

依據113年4月03日嘉監總字第11300348620號函，核定展延工期41日曆天

依據113年5月16日嘉監總字第11300362560號函，核定展延工期51日曆天

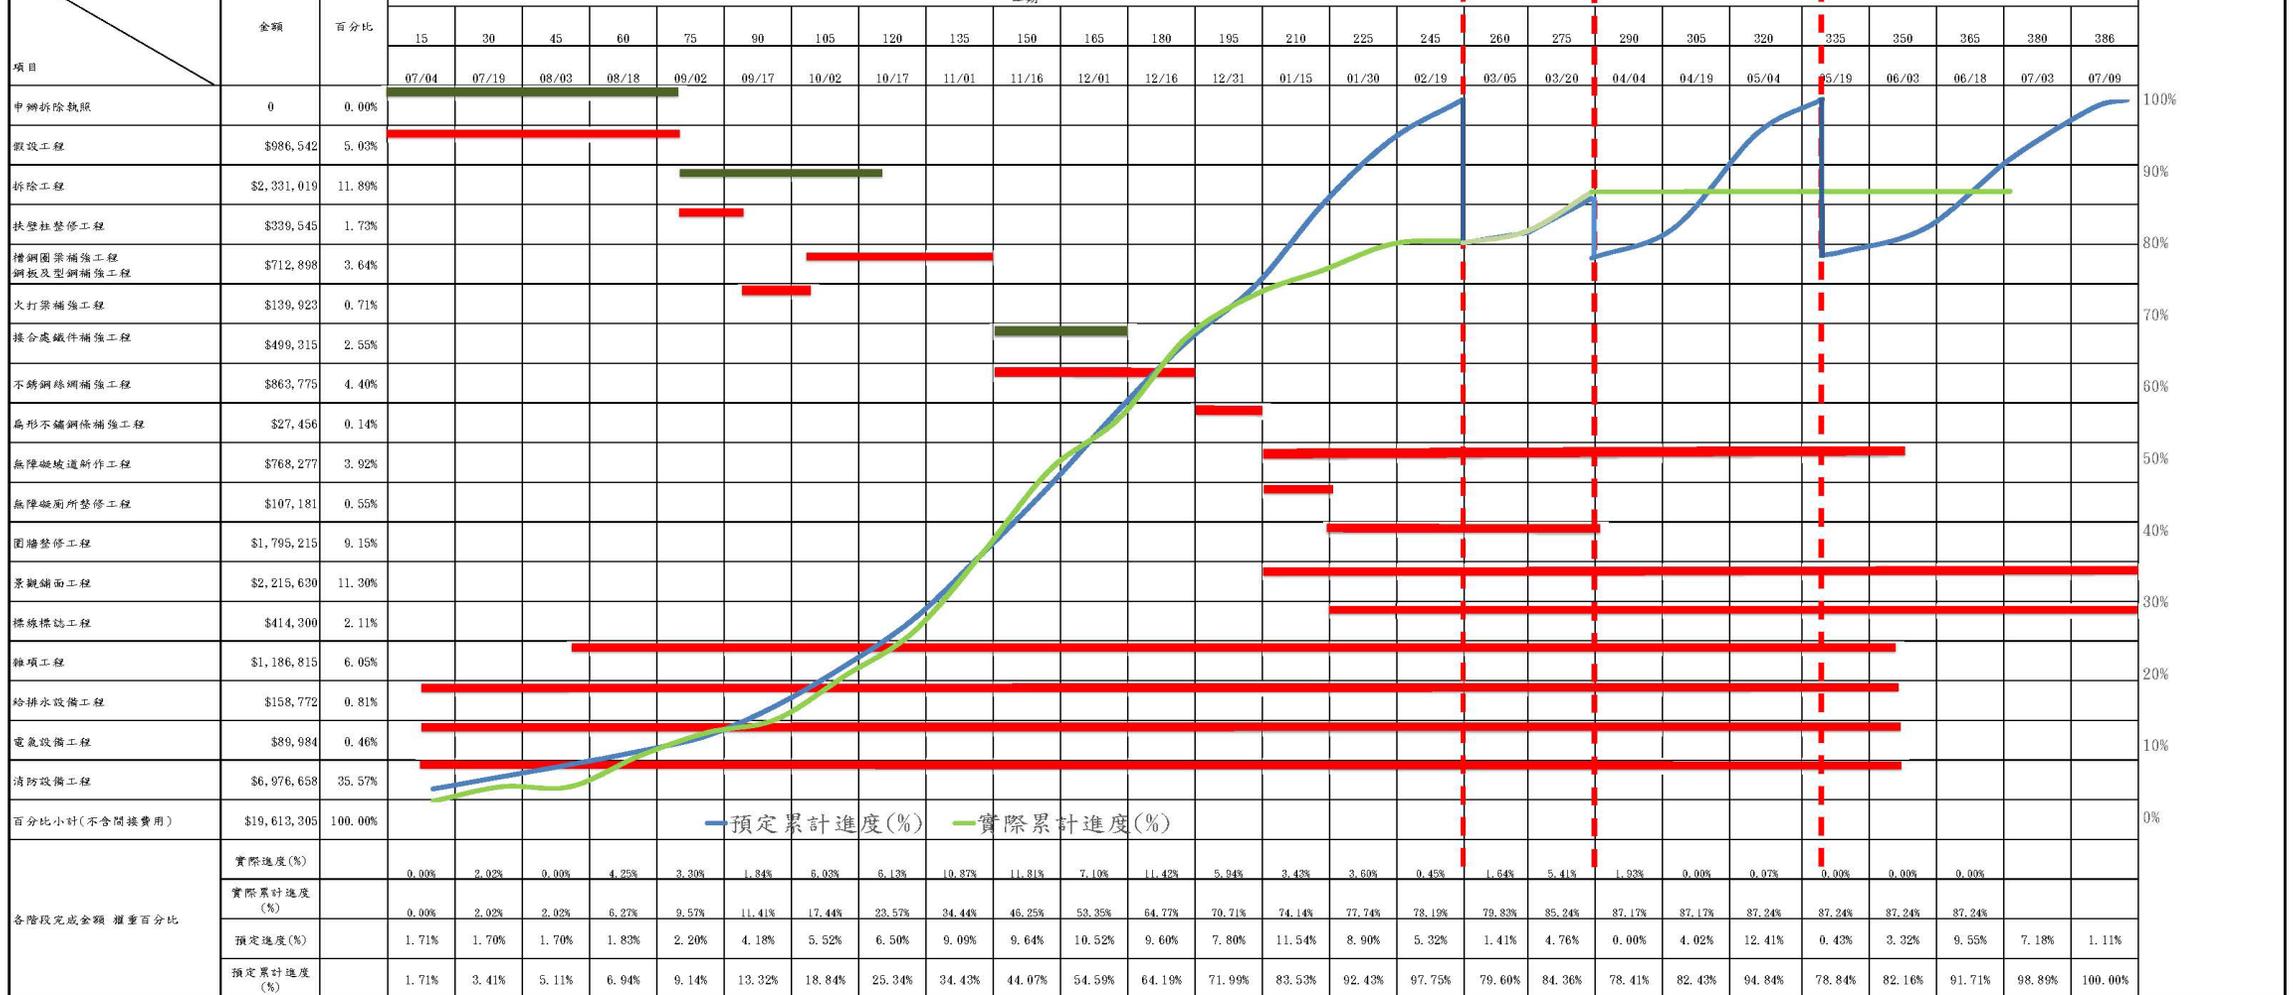

- RCP管進場及埋設



RCP、陰井進場



RCP管埋設

RCP管進場及埋設



RCP管埋設



RCP管埋設

- 太平洋鐵木、越檜進場



太平洋鐵木、越檜進場



太平洋鐵木、越檜進場

太平洋鐵木、越檜進場



太平洋鐵木、越檜進場



太平洋鐵木、越檜進場
