


預計進度78.44%實際進度80.00% (至5/30止)

工作進度報告

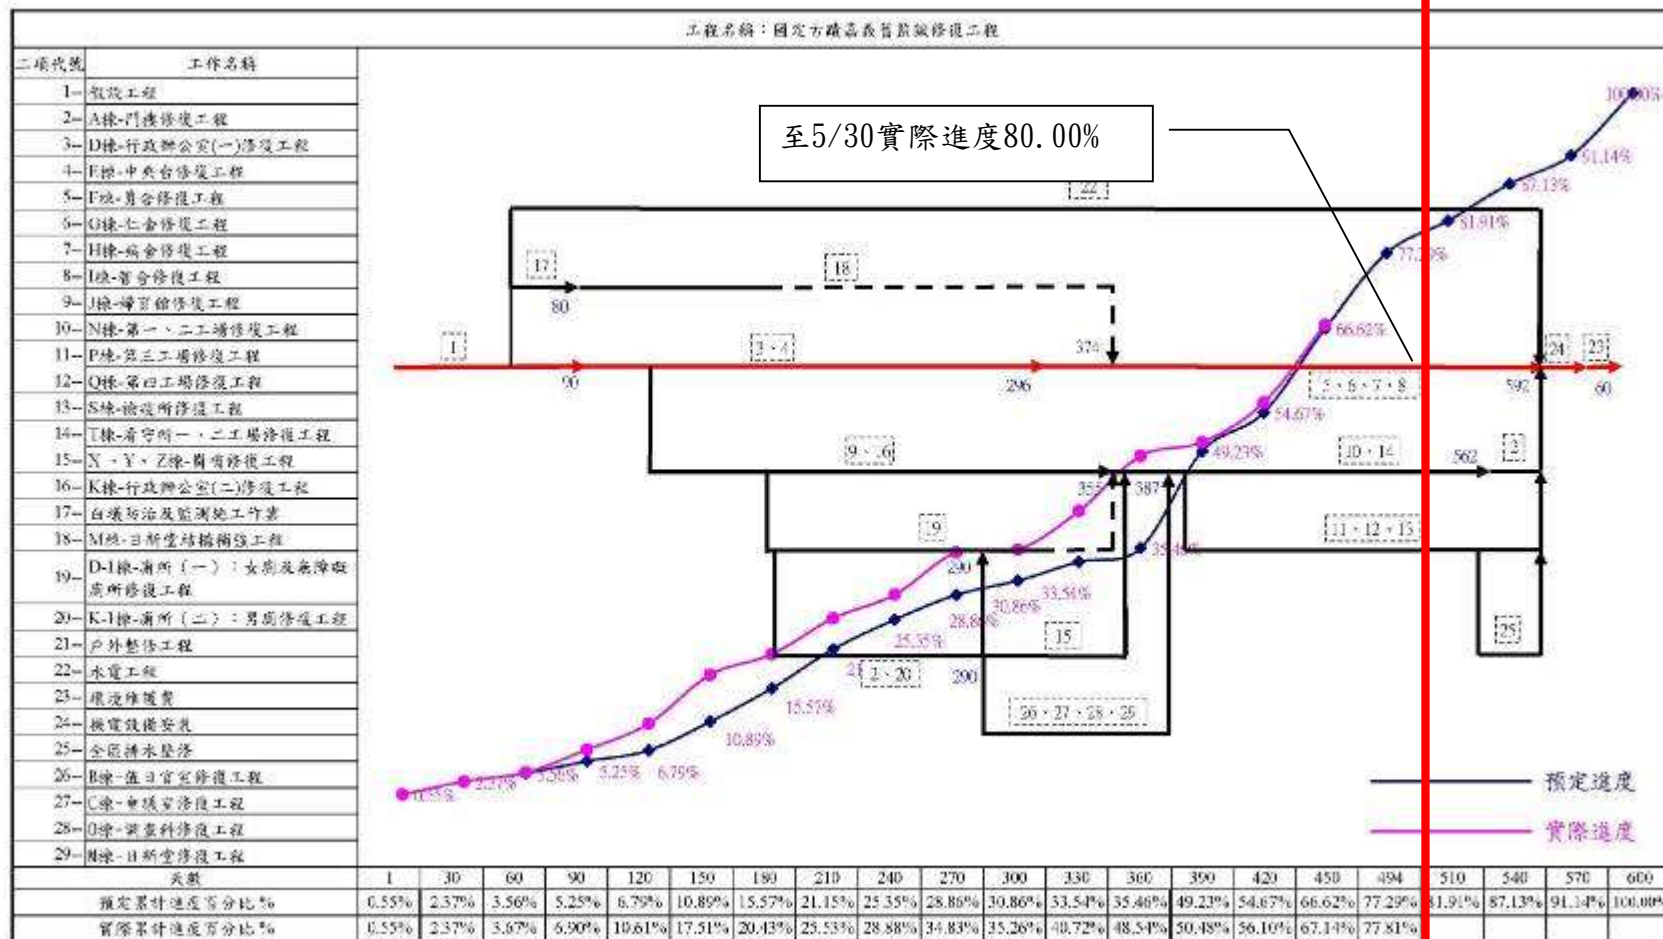

開工日期：98/12/18

竣工日期：98/12/18~100/08/09 共500日曆天，不含相關完工工期。

目前進度

※智舍施作項目：

1. 屋面防水層施作。
2. 屋架修補施作。
3. 電氣設備管線施作。
4. 鷹架施作。
5. 舍房鐵門紅丹漆施作。
6. 舍房地坪木地板整修仿作。
7. 舍房牆面防潮施作。
8. 外牆物理噴塗。
9. 屋面掛瓦條施作。
10. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
11. 門框扇整修新作。
12. 舍房天花板護木油塗刷施作。
13. 屋面水泥瓦鋪設施作。



電氣開關線路施作

智舍



天花板護木油施作

智舍



門框扇整修施作

智舍



舍房電氣配線施作

智舍

※仁舍施作項目：

1. 雨淋板整修仿作。
2. 桁木、椽條及屋面板整修仿作。
3. 舍房鐵門紅丹漆施作。
4. 舍房地坪木地板釘製。
5. 舍房牆面防潮施作。
6. 竿緣天花板剝漆施作。
7. 舍房白灰壁體粉刷層施作。
8. 門框整修安裝。
9. 屋面屋瓦、掛瓦條、屋面板及防水層拆卸施作。
10. 屋架修補施作。
11. 門板護木油施作。
12. 電氣設備配管施作。
13. 屋面防水層及水泥瓦施作。



電氣配線施作

仁舍



電氣配線施作

仁舍



牆面白灰壁體施作

仁舍



電氣開關箱安裝施作

仁舍

※病舍施作項目：

1. 屋架拆除整修仿作。
2. 桁木椽條施作。
3. 屋面板施作。
4. 屋面防水層施作。
5. 門窗剝漆施作。
6. 門窗及立柱修補施作。
7. 鷹架拆除施作。
8. 屋面水泥瓦鋪設施作。
9. 天花及立柱護木油塗刷施作。
10. 電氣設備配線施作。
11. 編竹夾泥牆施作。
12. 雨淋板整修仿作。
13. 兩底銅皮屋面新作。



兩底銅皮屋面施作

病舍



編竹夾泥牆施作

病舍

病舍



廊道電氣配線施作

病舍



立柱修補施作

病舍

※勇舍施作項目：

1. 門框整修新作。
2. 舍房鐵門紅丹漆施作。
3. 舍房地坪木地板拆除。
4. 舍房牆面防潮施作。
5. 舍房門窗剝漆施作。
6. 外牆面物理噴塗。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
8. 屋架桁木整修仿作。
9. 雨淋板及木襯板整修仿作。
10. 屋面水泥瓦、防水層、屋面板拆卸
11. 屋面防水層鋪設施作。



屋面板批土施作

勇舍



屋面防水層鋪設施作

勇舍



舍房天花板整修仿作

勇舍



電源開關施作

勇舍

※第一二工場施作項目：

1. 屋面板鋪設及屋面防水層施作。
2. 屋面構架及門窗檢測原有門窗拆卸。
3. 屋面水泥瓦鋪設施作。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 牆面物理噴塗防潮灌注施作。
7. 雨庇整修施作。
8. 門窗整修仿作。
9. 木構架、桁木、椽條拆卸仿作。
10. 電氣管路配線施作。
11. 編竹夾泥牆仿舊新作。
12. 護木油塗刷。
13. 地坪整修施作。
14. 結構補強地樑施作。



高拉力鋼棒施作

第一二工場



地坪鑿修施作

第一二工場



雨淋板整修施作

第一二工場




雨庇整修施作

第一二工場

※第三工場施作項目：

1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 舊有管線拆除。
4. 屋面水泥瓦拆卸施作。
5. 屋架桁木椽條及屋面板整修施作。
6. 屋面防水層鋪設施作。
7. 編竹夾泥牆整修仿作。

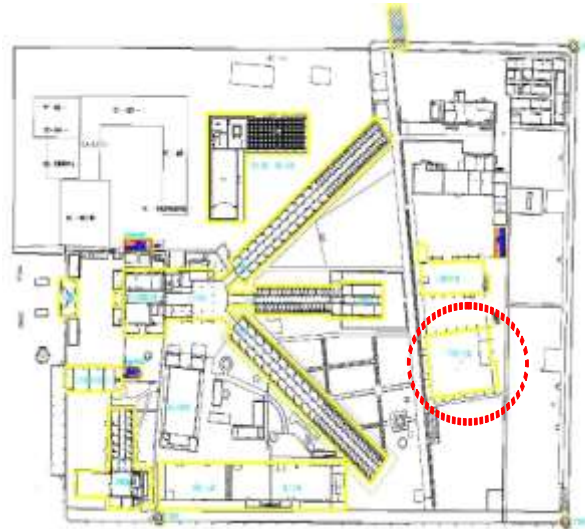

結構立柱整修施作

第三工場



雨庇整修施作

第三工場



編竹夾泥牆整修施作

第三工場




雨庇整修施作

第三工場

※第四工場施作項目：

1. 舊有管線拆除。
2. 門窗窗框整修施作。
3. 屋面瓦拆卸整理。
4. 木襯板拆卸整理。
5. 結構臨時鋼管支撐。
6. 屋架整修仿作。
7. 編竹夾泥牆施作。
8. 屋面板整修仿作。
9. 護木油塗刷施作。
10. 雨淋板整修仿作。
11. 銅皮屋面安裝施作。
12. 庫房屋面鋼浪板安裝施作。
13. 電氣管路配線施作。

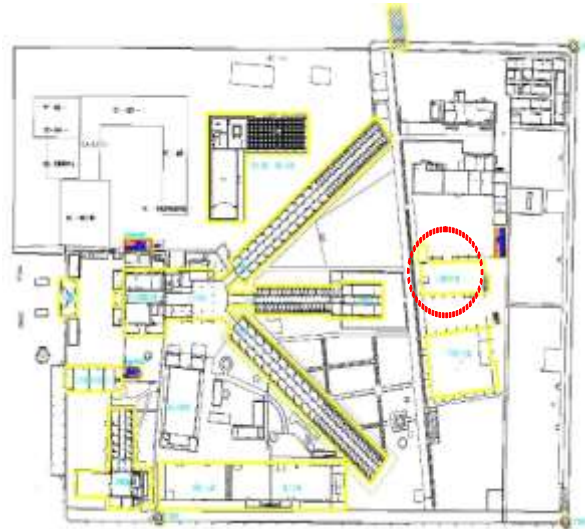

銅皮屋面安裝施作

第四工場



門窗整修仿作

第四工場



雨淋板整修仿作

第四工場




門窗整修仿作

第四工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 地坪鑿修仿作。
3. 門窗整修仿作。
4. 電氣管路配線施作。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 雨庇銅皮屋面及銅製天溝安裝施作。
8. 屋面板鋪設施作。
9. 木構架護木油施作。
10. 鋼架補強施作。
11. 屋面桁木椽條施作。
12. 結構補強施作。
13. 牆面壁體油漆施作。

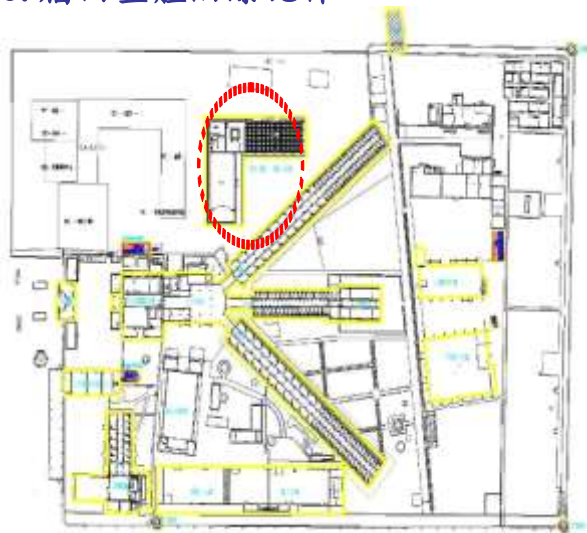

結構補強施作

看守所第一二工場



排水溝壁體整修施作

看守所第一二工場



人孔蓋整修施作

看守所第一二工場



牆面油漆施作

看守所第一二工場

※路燈管線及管溝施作項目：

1. 管溝開挖回填夯實。
2. 路燈管線開挖。
3. 路燈基座施作。
4. 共同管溝開挖。
5. 消防給水管施作。
6. 管溝混凝土回填澆置。




共同管溝開挖施作

管溝



共同管溝開挖施作

管溝

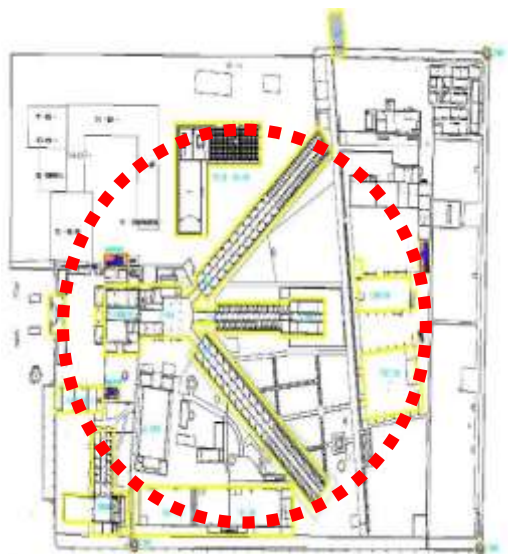

消防給水管施作

管溝



消防給水管施作

管溝
