




國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



99.4.21工程進度簡報

預計進度6.41% 實際進度9.45% (至99/4/21止)

工作進度報告

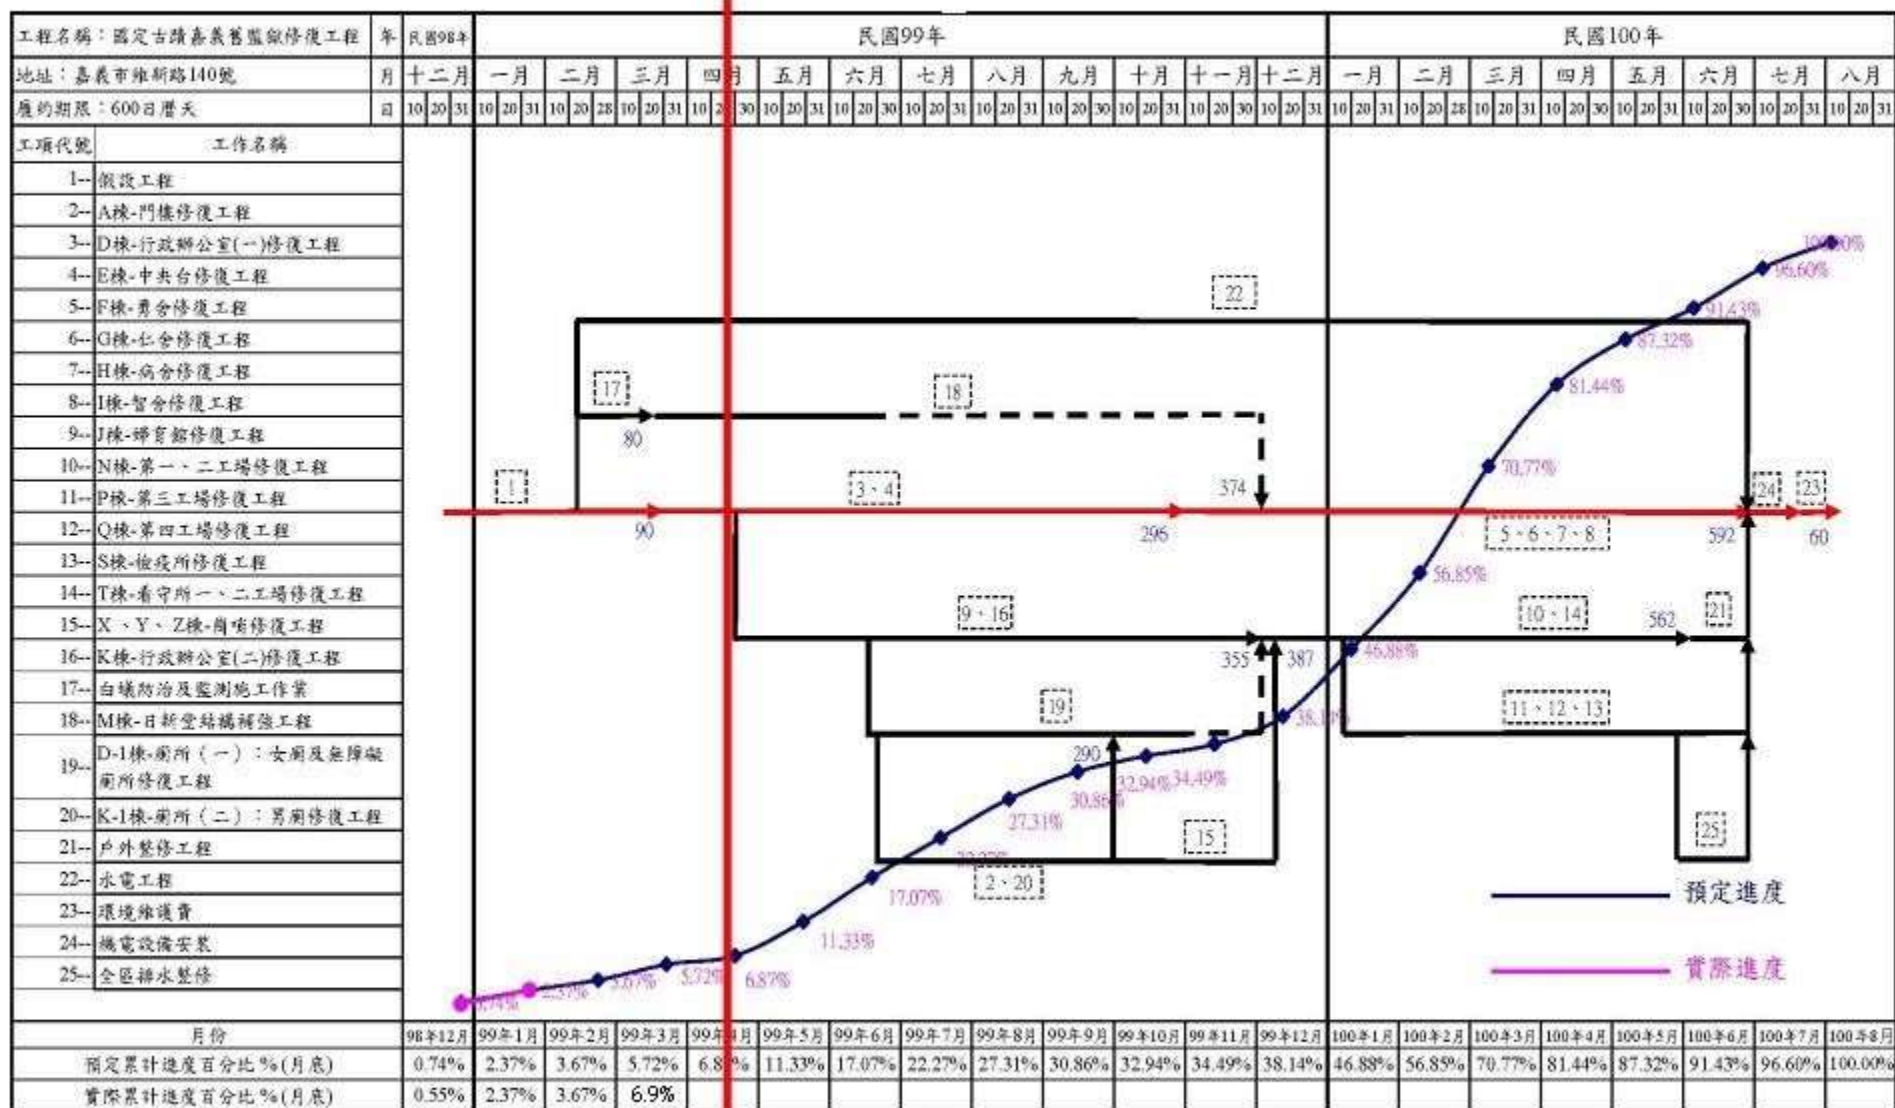

08/11/2019 10:19:19

目前進度

※門樓施作項目：

- 1.舊有防水層剝除。
- 2.門窗剝漆。



防水層剝除施作中

門樓



防水層剝除後

門樓



剝漆施作前

門樓



剝漆施作中

門樓

※行政辦公室(二)施作項目：

- 1.剝漆施作。
- 2.屋瓦拆除。




屋瓦拆除前

行政大樓(二)



屋瓦拆除

行政大樓(二)

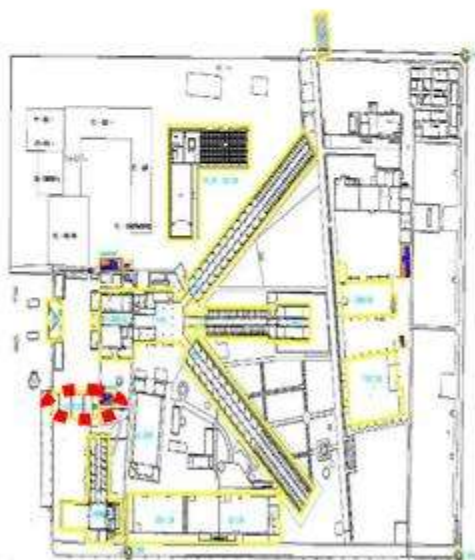

剝漆施作

行政大樓(二)



剝漆施作

行政大樓(二)

※行政辦公室(一)施作項目：

- 1.防潮灌注施作。
- 2.門窗剝漆施作。
- 3.地坪地質試挖掘。
- 4.女廁屋面拆除。



女廁屋面拆除

行政大樓(一)



牆面防潮灌注

行政大樓(一)



門窗剝漆施作

行政大樓(一)



地坪地質試挖掘

行政大樓(一)

※婦育館施作項目：
1.舍房門窗剝漆施作。




拆除之桁條整理

婦育館



舍房門窗剝漆施作

婦育館

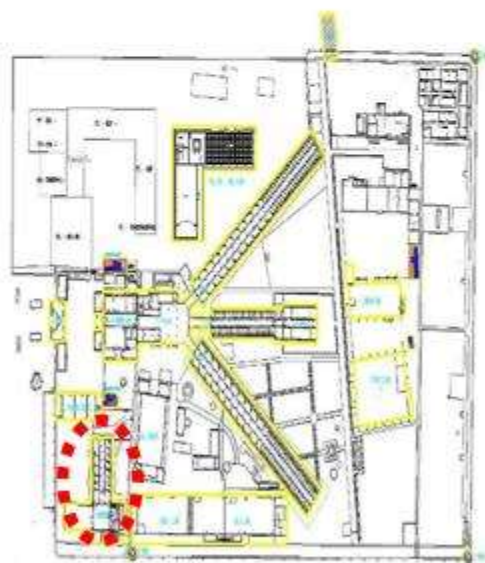

舍房門窗剝漆施作

婦育館



舍房門窗剝漆施作

婦育館

※日新堂施作項目：

1. 結構補強處粉刷層敲除。
2. 地震災損圍牆緊急加固。



結構補強處粉刷層敲除

日新堂



地震災損緊急加固

日新堂




結構補強處粉刷層敲除

日新堂



結構補強處粉刷層敲除

日新堂

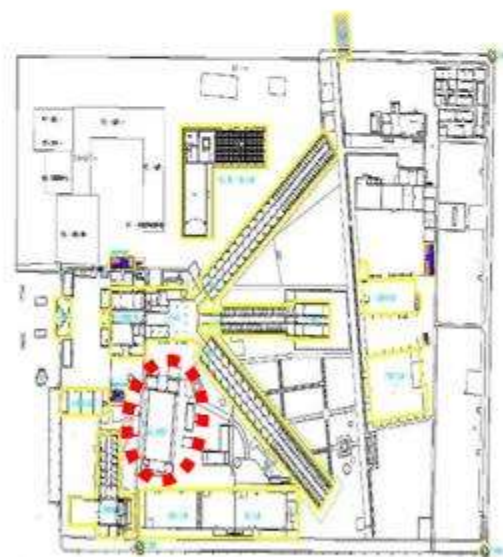

中央台

※中央台施作項目：

- 1.木構架拆卸仿作。
- 2.門窗剝漆施作。
- 3.附屬建築物拆除。
- 4.看守所通道打通。
- 5.門窗剝漆施作。



木構架拆卸

中央台



木構架樑頭仿作

中央台




木料修補

中央台



附屬建物拆除

中央台

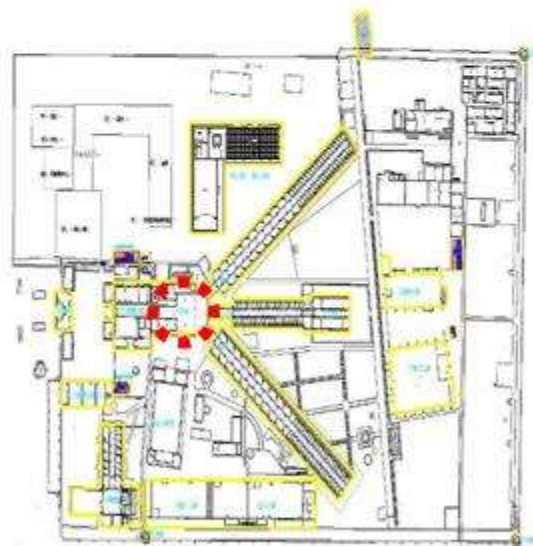


※智舍施作項目：

1. 舍房鐵門紅丹漆施作。
2. 舍房地坪木地板拆除。
3. 舍房牆面防潮施作。
4. 舍房門窗剝漆施作。
5. 外牆物理噴塗。




舍房牆面防潮施作

智舍

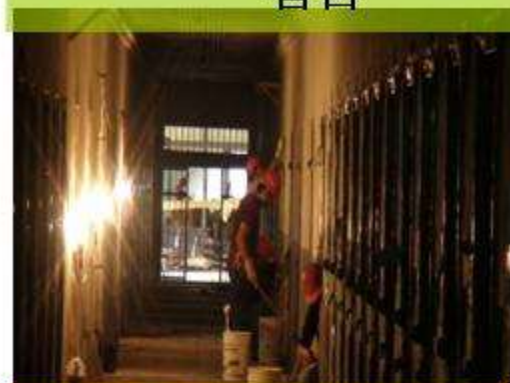

舍房門窗剝漆施作

智舍

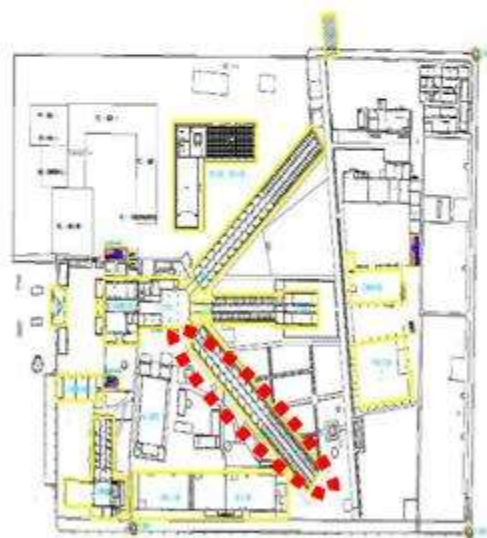

舍房地坪木地板拆除

智舍



舍房鐵門紅丹漆施作

智舍

※仁舍施作項目：

- 1.原有舍房房門拆除。
- 2.鷹架施作。
- 3.舍房鐵門紅丹漆施作。
- 4.舍房地坪木地板拆除。
- 5.舍房牆面防潮施作。
- 6.舍房門窗剝漆施作。




舍房外牆物理噴塗

仁舍



舍房門窗拆卸

仁舍

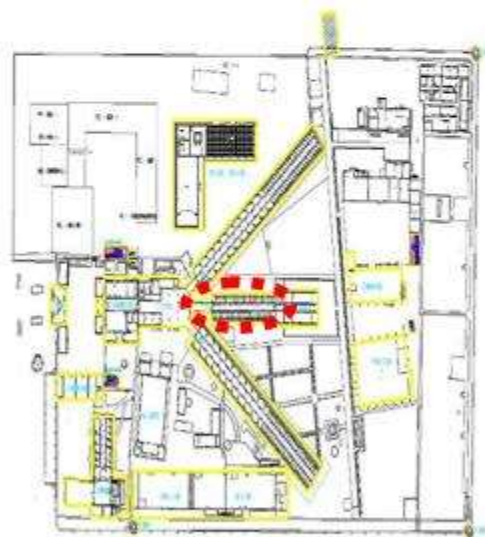

舍房門窗剝漆施作

仁舍




舍房鐵門剝漆施作

仁舍

※勇舍施作項目：

- 1.原有舍房房門拆卸。
- 2.舍房鐵門紅丹漆施作。
- 3.舍房地坪木地板拆除。
- 4.舍房牆面防潮施作。
- 5.舍房門窗剝漆施作。

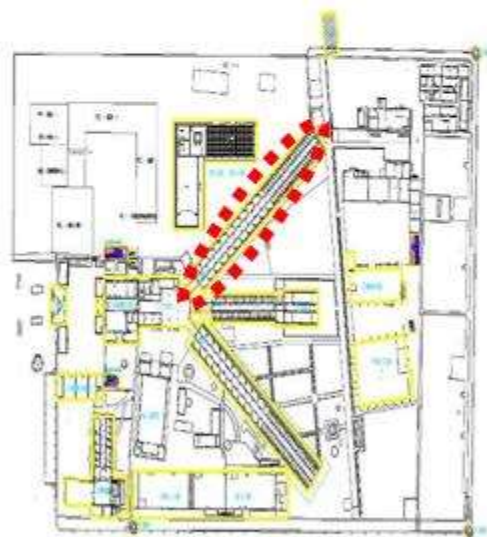

舍房外牆物理噴塗

勇舍



舍房門窗剝漆施作

勇舍



舍房牆面防潮灌注施作

勇舍



舍房鐵門剝漆施作

勇舍

※第一二工場施作項目：

- 1.防潮灌注施作。
- 2.拆卸之木料整理。
- 3.門窗剝漆施作。



屋面板拆除後之現況


第一二工場

第一二工場



木料進場廠商初驗

第一二工場

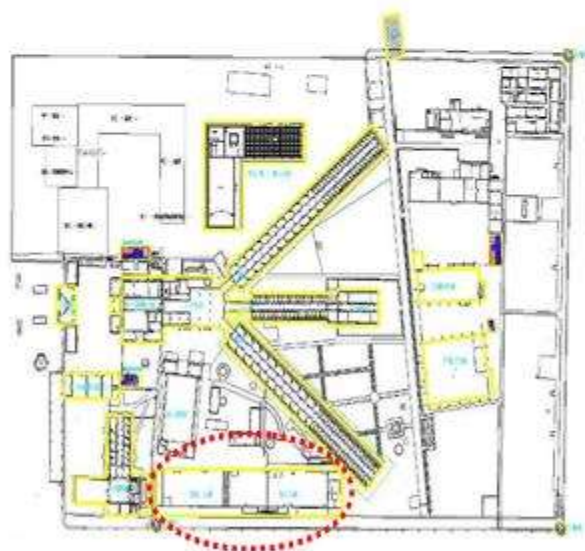

拆卸之木料整理

第一二工場



防潮灌注施作

第一二工場

※看守所第一二工場施作

項目：

1. 防潮灌注施作。
2. 拆卸之木料整理。




屋瓦拆卸施作中

看守所第一二工場



屋瓦拆卸施作中

看守所第一二工場

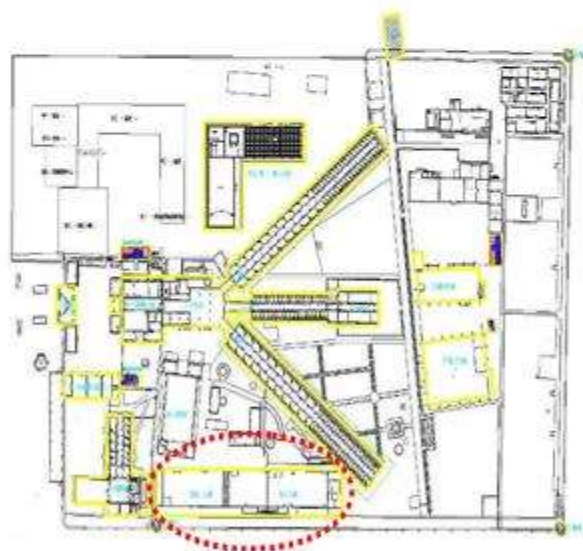

拆卸之木料整理

看守所第一二工場



防潮灌注施作

看守所第一二工場

※工料進場:

- 1.進場前廠驗。
- 2.工地現場營造廠初驗。
- 3.初驗完成後會同委辦單位、監造單位及業主進行材料複驗。
- 4.不合格品退料。
- 5.材種鑑定。



木料進場前廠驗


工料進場

工料進場



營造廠初驗

工料進場

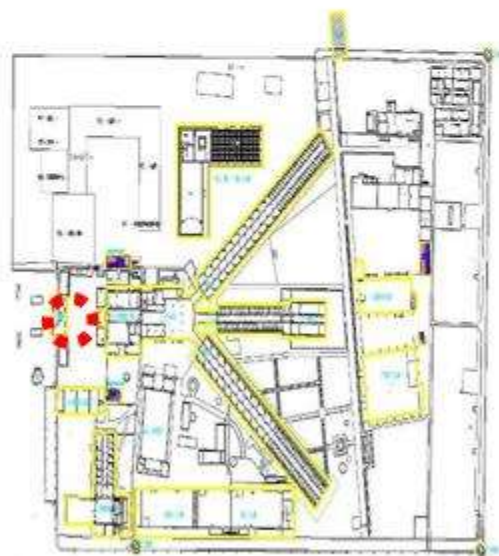

木料複驗

工料進場



不合格品退料

工料進場

※工料進場:

- 1.進場前廠驗。
- 2.工地現場營造廠初驗。
- 3.初驗完成後會同委辦單位、監造單位及業主進行材料複驗。
- 4.不合格品退料。
- 5.材種鑑定。



木料取樣送鑑定



工料進場

工料進場



木料取樣送鑑定

工料進場

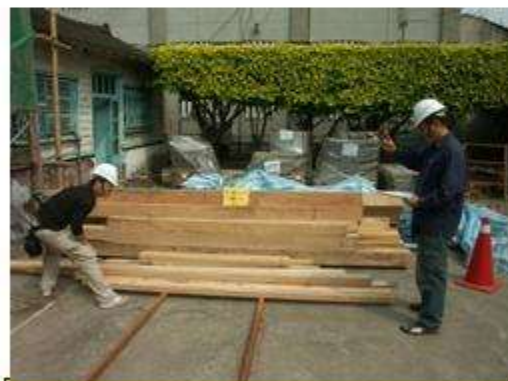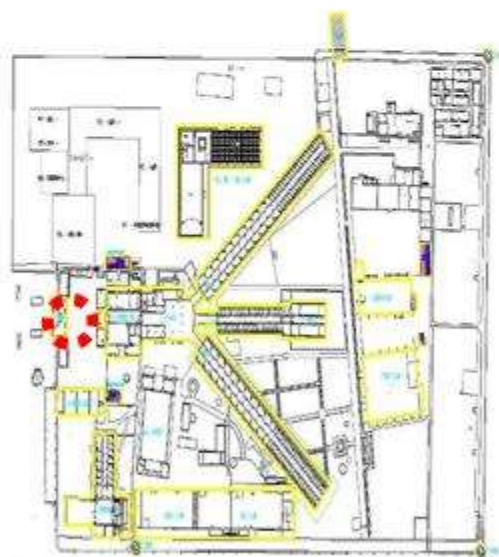

不合格品分類堆置並退回

工料進場



二氧化矽與鹼粉取樣送驗

工料進場
