




# 國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



99.05.21 工程進度簡報

預計進度9.14% 實際進度14.15% (至99/5/21止)

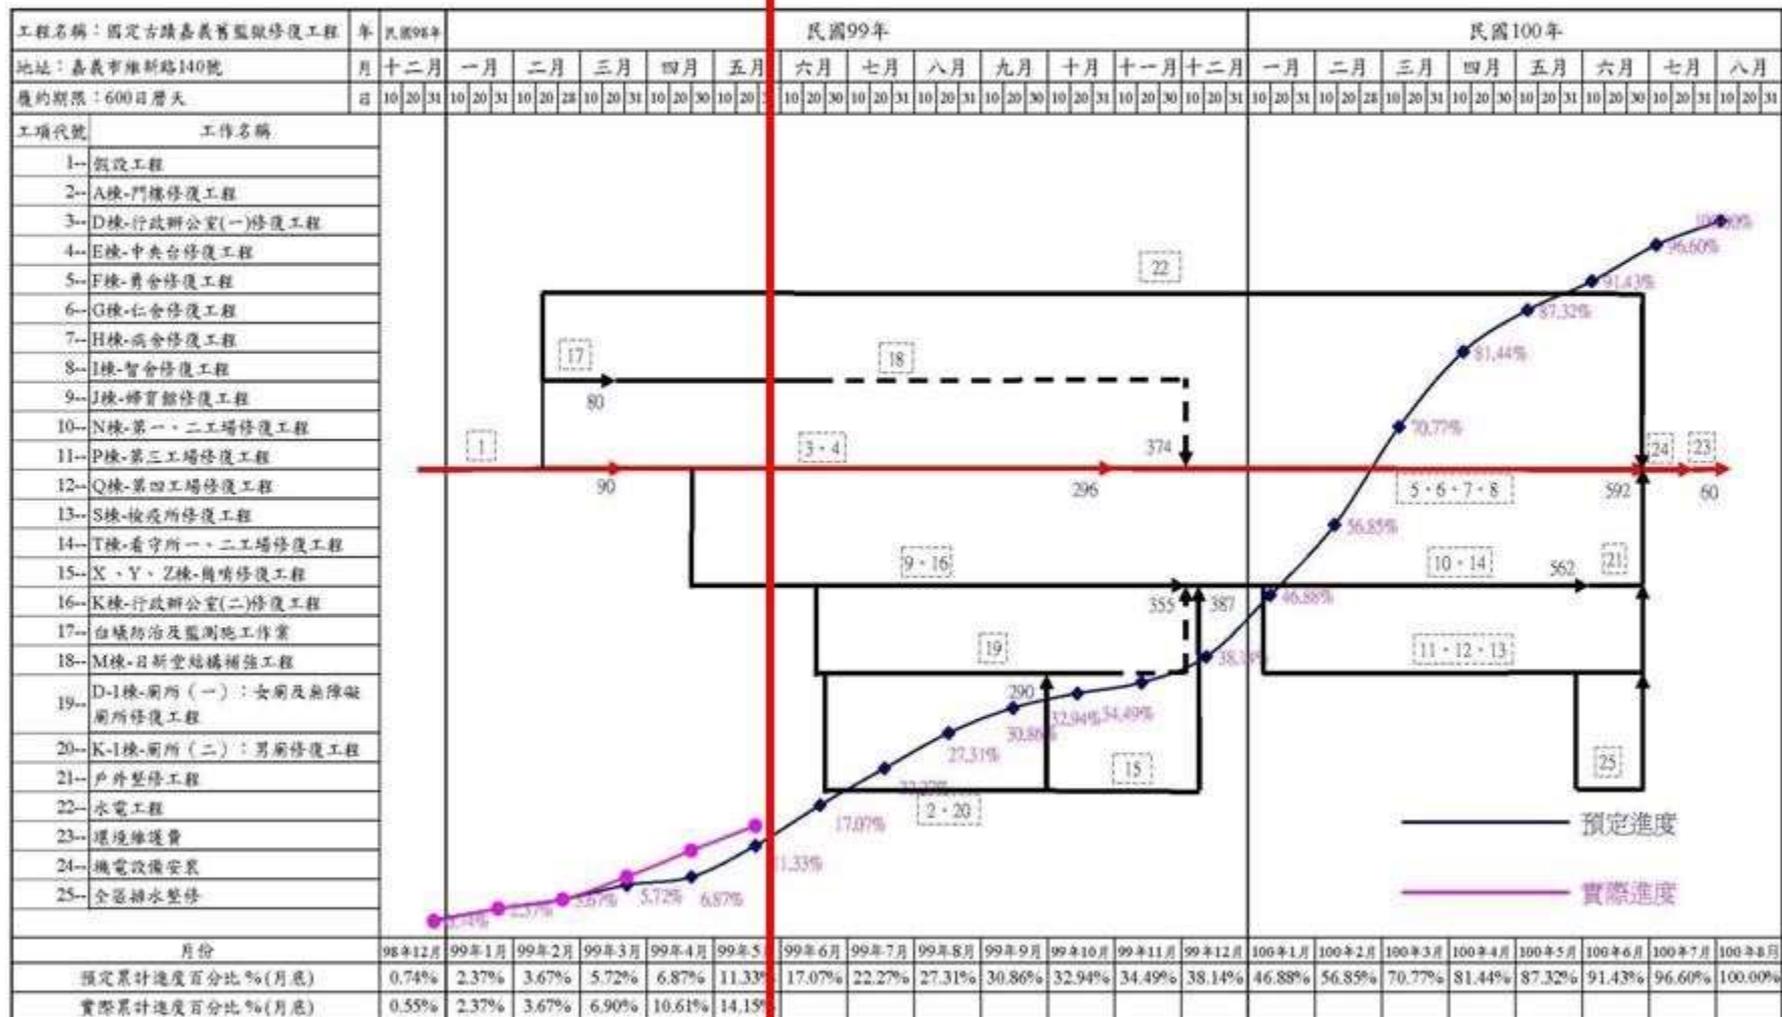

開工日期：98/12/18

備註：98/12/18-100/08/09 共600日曆天，不含相關免計工期。

目前進度

※門樓施作項目：

1. 粉刷層浮凸敲除。



剝漆施作中

門樓



粉刷層浮凸敲除

門樓



粉刷層浮凸敲除

門樓



剝漆施作完成

門樓


※行政辦公室(二)施作項目：

1. 木構架拆卸整修、仿作。
2. 編竹夾泥牆浮凸拆除。




木構架拆卸整修仿作

行政大樓(二)

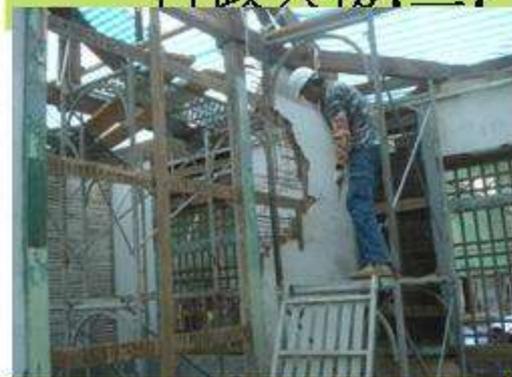

編竹夾泥牆浮凸拆除

行政大樓(二)

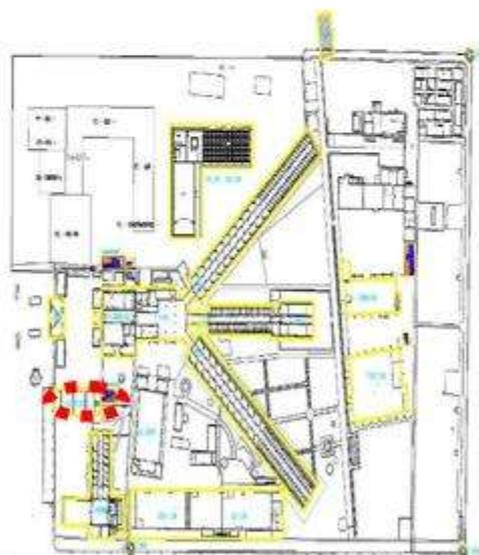

木構架拆卸整修仿作

行政大樓(二)



木構架拆卸整修仿作

行政大樓(二)

## 行政大樓(一)


※行政辦公室(一)施作項目：

1. 屋架拆卸整修仿作。
2. 壁體防護噴塗。



牆面防護試作

行政大樓(一)

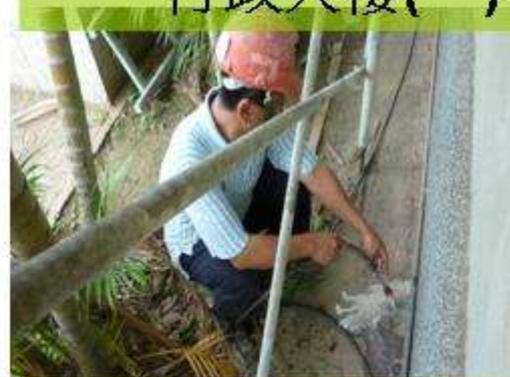

牆面防潮灌注

行政大樓(一)



屋架拆卸

行政大樓(一)



屋架拆卸

行政大樓(一)

※婦育館施作項目：

1. 木構架拆卸仿作。
2. 編竹夾泥牆浮凸拆除。
3. 力霸鋼架紅丹漆施作。



木構架假安裝

婦育館



木構架拆卸仿作

婦育館




力霸鋼架紅丹漆施作

婦育館



木構架拆卸仿作

婦育館

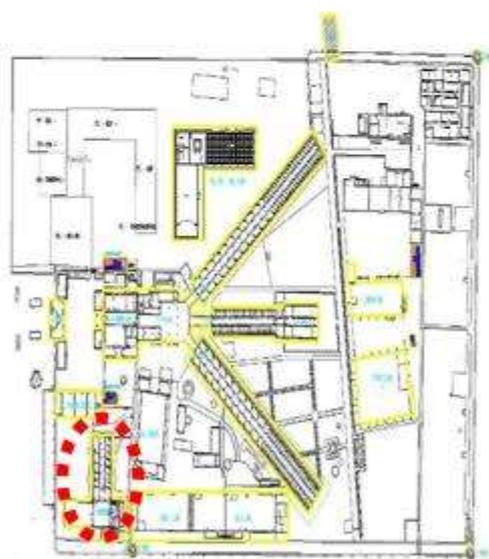

※日新堂施作項目：

1. 環氧樹脂補強。
2. 無收縮水泥施作。
3. 鋼板放樣。
4. 鋼筋檢測。



鋼筋檢測

日新堂

日新堂



放樣木模

日新堂




結構補強處無收縮水泥施作

日新堂



結構補強處裂縫灌注epoxy

日新堂

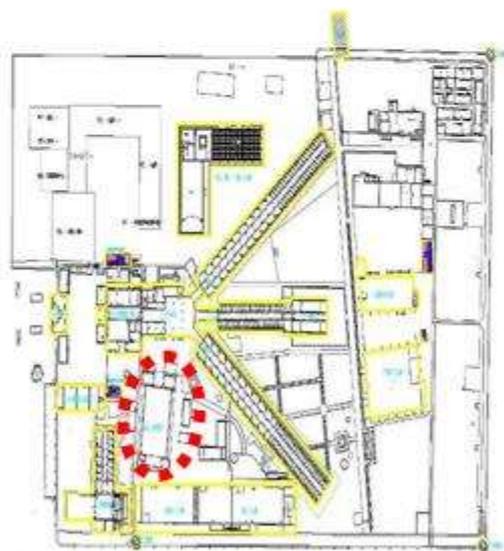

# 中央台

※中央台施作項目：

- 1. 木構架拆卸仿作。
- 2. 門窗剝漆施作。



木構架假安裝

中央台



木構架假安裝

中央台




木構架假安裝

中央台



木構架假安裝

中央台

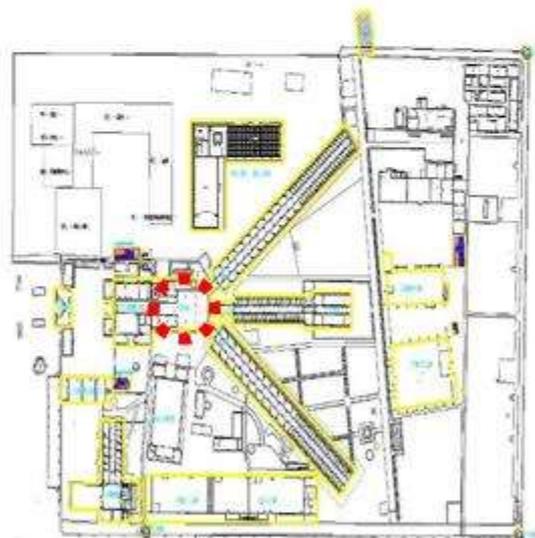


※智舍施作項目：  
1. 舍房門窗剝漆施作。




舍房牆面防潮施作

智舍

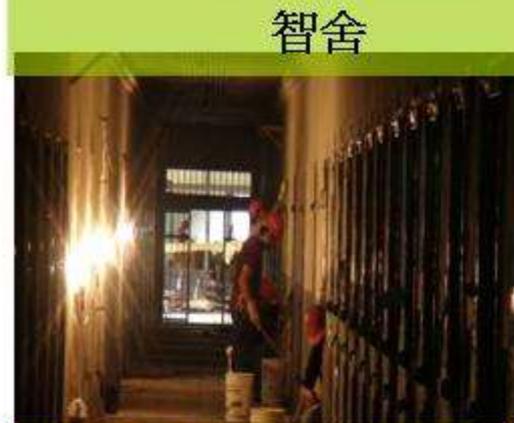

舍房門窗剝漆施作

智舍

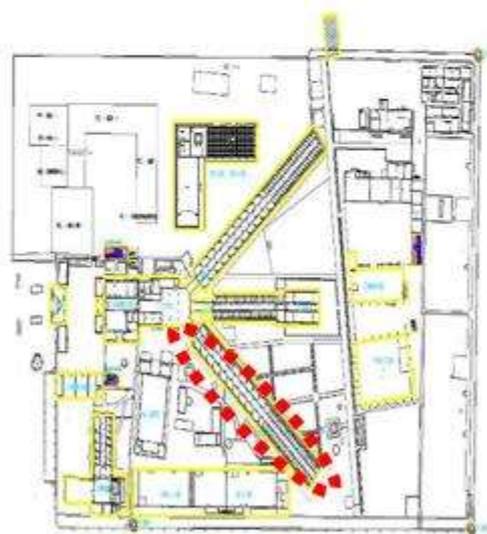

舍房門窗剝漆施作

智舍



舍房門窗剝漆施作

智舍

※仁舍施作項目：  
1. 舍房門窗剝漆施作。




舍房外牆物理噴塗

仁舍



舍房門窗拆卸

仁舍

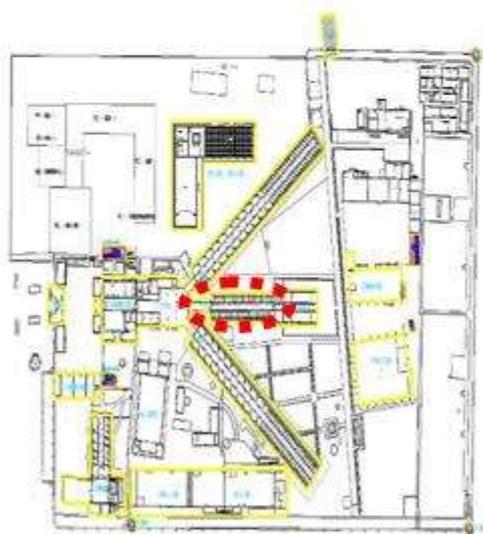

舍房門窗剝漆施作

仁舍



舍房鐵門剝漆施作

仁舍

※仁舍施作項目：  
1. 舍房門窗剝漆施作。




舍房外牆物理噴塗

仁舍



舍房門窗拆卸

仁舍

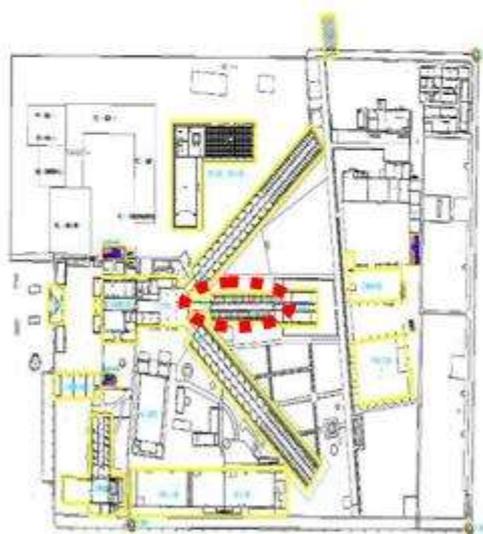

舍房門窗剝漆施作

仁舍



舍房鐵門剝漆施作

仁舍

※第一二工場施作項目：

1. 門窗剝漆施作。
2. 木構架拆卸仿作。
3. 舊有管線拆除。
4. 編竹夾泥牆浮凸拆除。




屋面板拆除後整理

第一二工場



編竹夾泥牆浮凸拆除

第一二工場

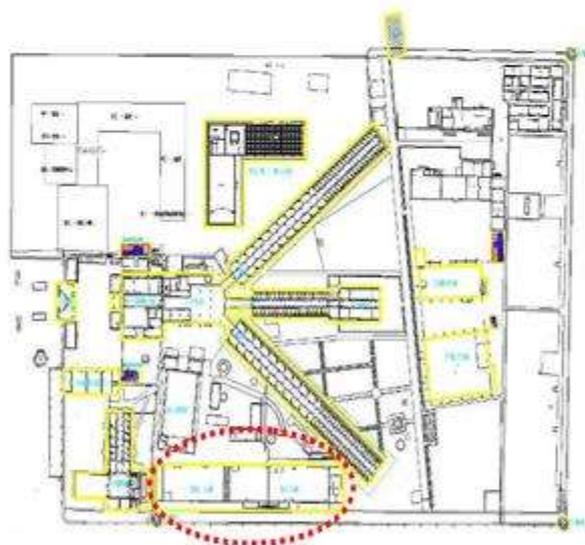

木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架假安裝

第一二工場

※第三工場施作項目：

1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 舊有管線拆除。




門窗剝漆施作

第三工場



舊有管線拆除

第三工場

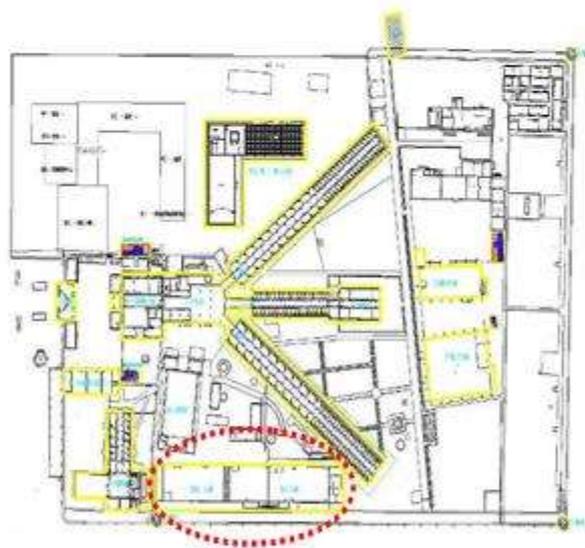

門窗剝漆施作

第三工場



外牆物理噴塗

第三工場


※第四工場施作項目：

1. 舊有管線拆除。
2. 門窗剝漆施作。
3. 屋面瓦拆卸整理。
4. 木襯板拆卸整理。
5. 結構臨時鋼管支撐。




防潮灌注施作

第四工場

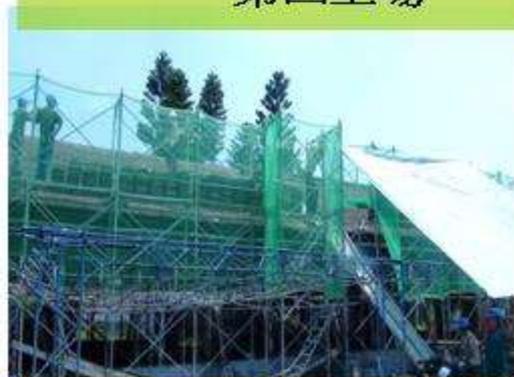

屋瓦拆卸

第四工場

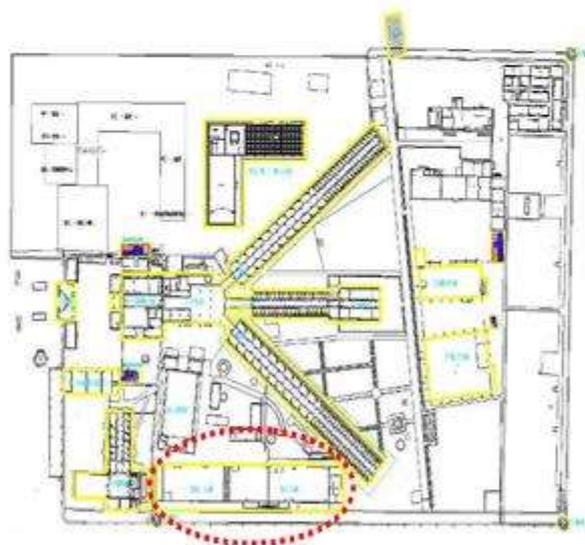

結構臨時鋼管支撐

第四工場



屋面板拆卸

第四工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 門窗剝漆施作。
2. 木構架拆卸整修、仿作。



屋架材料進場


看守所第一二工場

## 看守所第一二工場



屋架拆卸施作中

看守所第一二工場

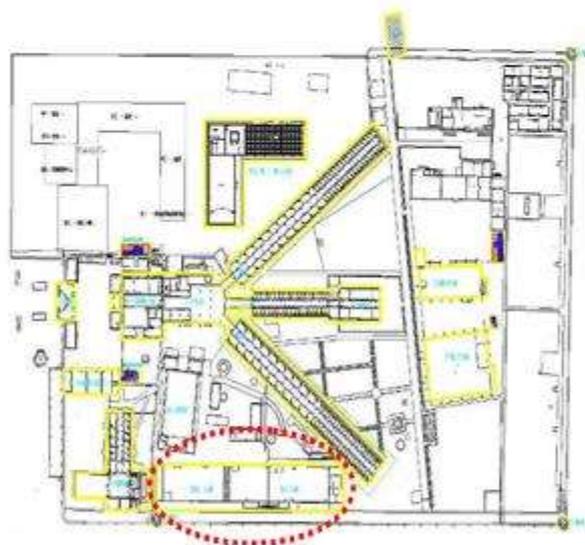

木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場



木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場

※材料試作：

1. 編竹夾泥牆樣品試作。
2. 屋瓦樣品試作。
3. 榫接樣式試作。



編竹夾泥牆

工料進場



銅皮屋瓦試作

工料進場



屋瓦試作

工料進場



榫接樣式試作

工料進場

