




國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



99.07.07工程進度簡報

預計進度16.68% 實際進度20.78% (至99/7/6止)

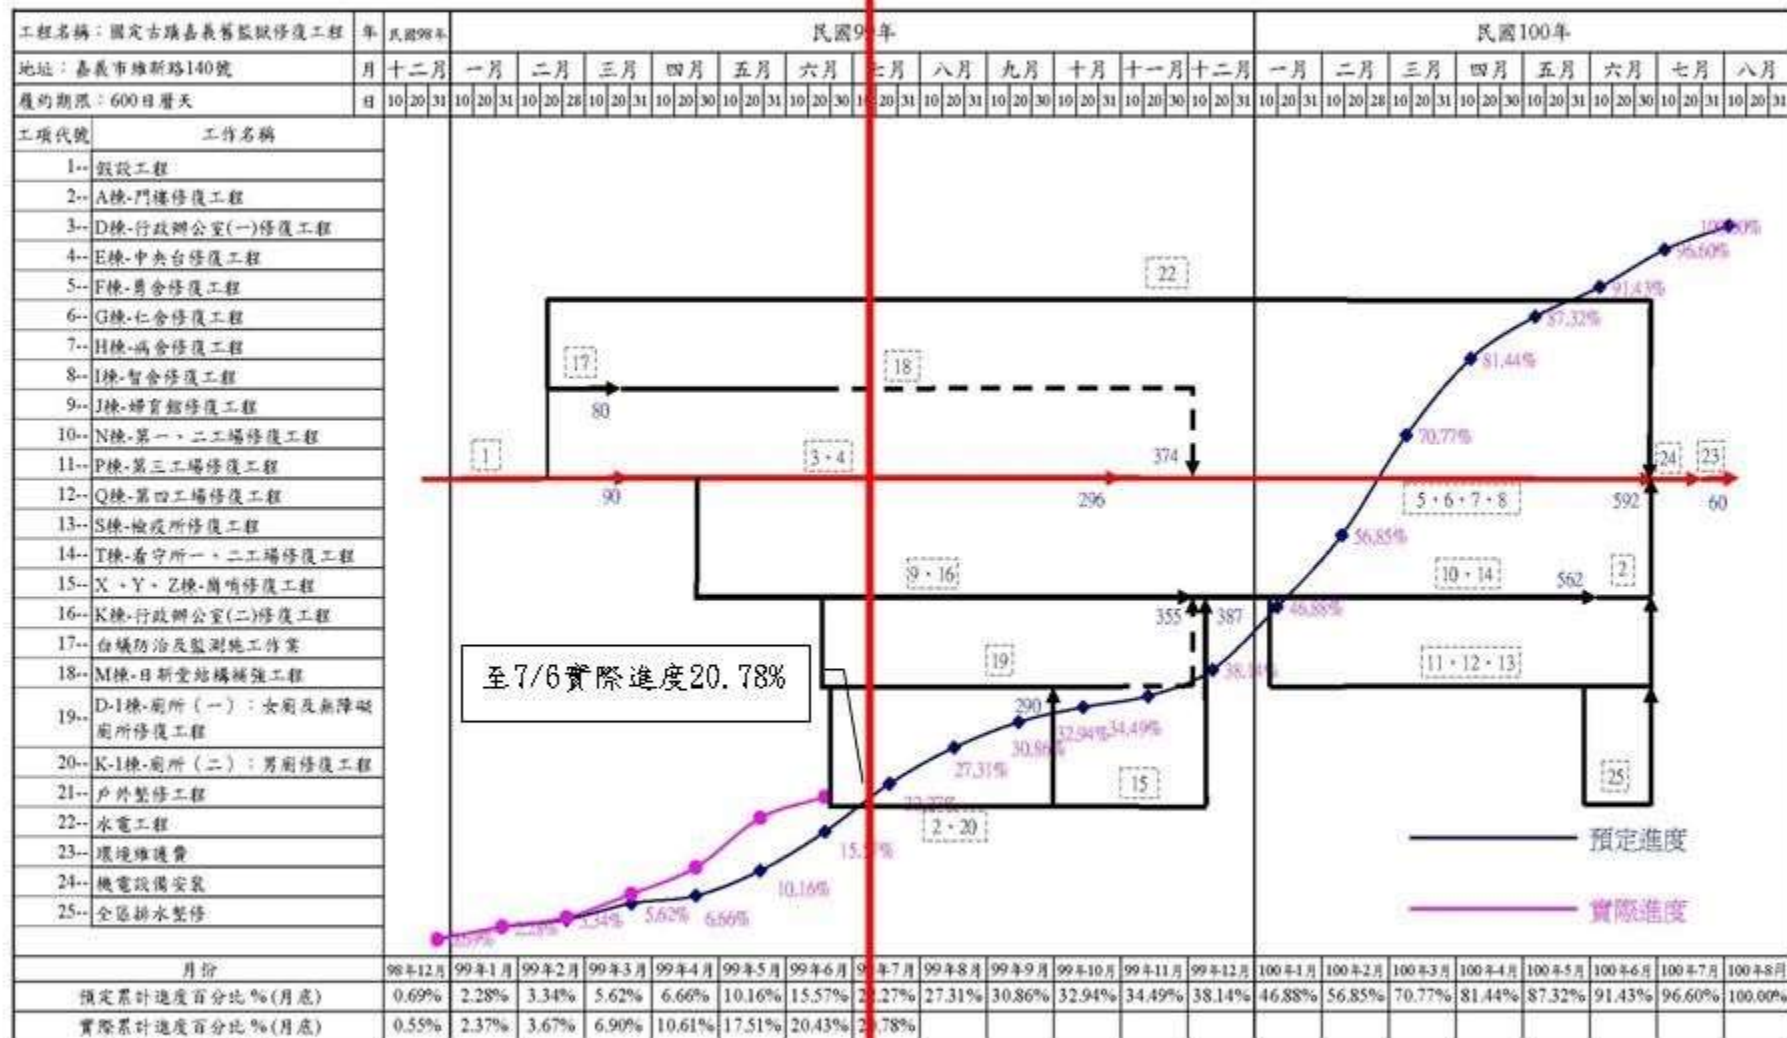

開工日期：98/12/18

備註：98/12/18-100/08/09 共600日曆天，不含相關免計工期。

目前進度

※門樓施作項目：

1. 粉刷層浮凸敲除。
2. 鋼筋防鏽處理。



粉刷層浮凸敲除

門樓



粉刷層打底

門樓



鋼筋防鏽處理

門樓



粉刷層打底

門樓

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 木構架剝漆施作。
2. 木構架拆卸整修、仿作。
3. 編竹夾泥牆施作。



剝漆施作

行政大樓(二)



編竹夾泥牆施作

行政大樓(二)



木窗仿作

行政大樓(二)



木構架拆卸整修仿作

行政大樓(二)

行政大樓(一)

※行政辦公室(一)施作項目：
1. 屋架拆卸整修仿作假安裝。



屋架修補

行政大樓(一)



屋架假安裝

行政大樓(一)



天花板剝漆

行政大樓(一)



屋架拆卸

行政大樓(一)

婦育館

※婦育館施作項目：

1. 木構架拆卸仿作。
2. 編竹夾泥牆浮凸拆除仿作。
3. 防潮灌注施作。




木編竹夾泥牆仿作

婦育館



木構架組立上架

婦育館

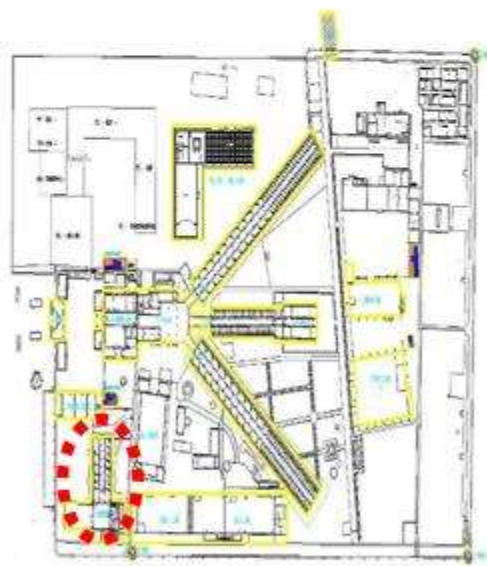

編竹夾泥牆仿作

婦育館



老虎窗仿作

婦育館

※日新堂施作項目：
1. 鋼板放樣安裝組立。




固定螺栓切割

日新堂



放樣木模

日新堂

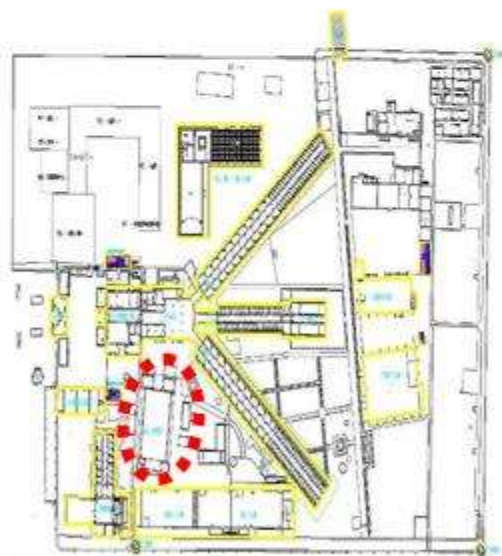

結構補強處無收縮水泥施作

日新堂



鋼板補強施作

日新堂

※中央台施作項目：

1. 木構架拆卸仿作假安裝。
2. 門窗天花板剝漆施作。
3. 屋面板安裝校調。



木構架假安裝

中央台



屋面板安裝

中央台




屋面水平校調

中央台



天花板剝漆施作

中央台

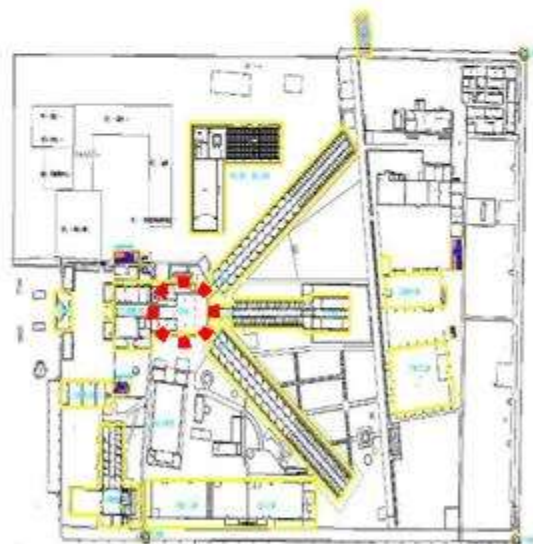

第一二工場

※第一二工場施作項目：

1. 牆面物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 木構架拆卸仿作。




牆面物理噴塗

第一二工場



門窗剝漆施作

第一二工場

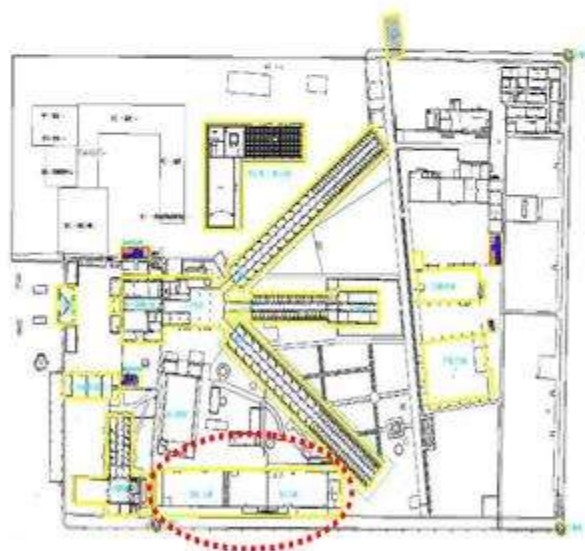

木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架假安裝

第一二工場

※第三工場施作項目：

1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。



門窗剝漆施作


第三工場

第三工場



外牆物理噴塗

第三工場

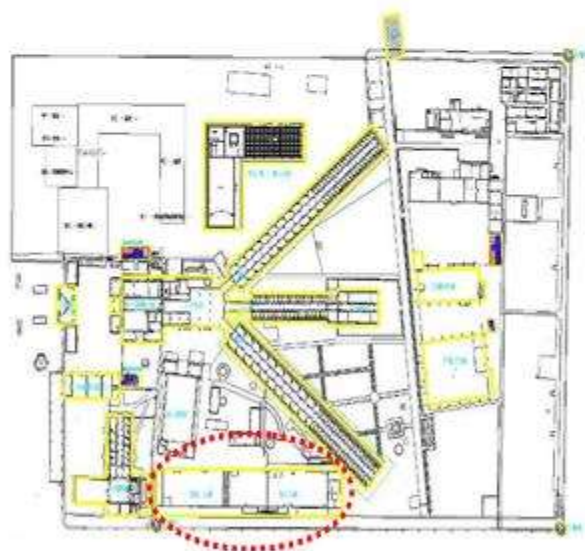

門窗剝漆施作

第三工場




外牆物理噴塗

第三工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 門窗剝漆施作。
2. 木構架拆卸整修、仿作。

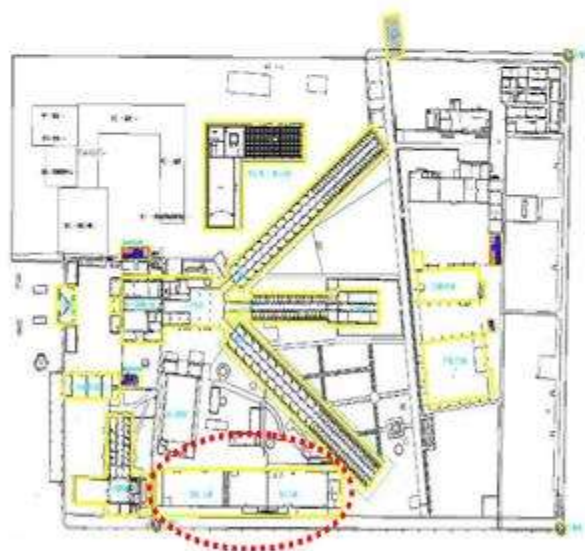

木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場




門窗剝漆施作

看守所第一二工場



木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場

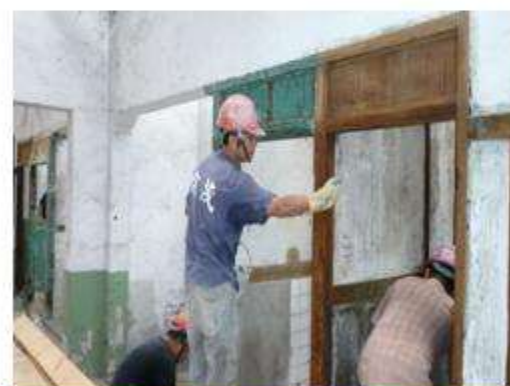

門窗剝漆施作

看守所第一二工場

※材料試作：

1. 屋瓦樣品試作。
2. 白灰養灰。



編竹夾泥牆


工料進場

材料試作



白灰養灰

工料進場

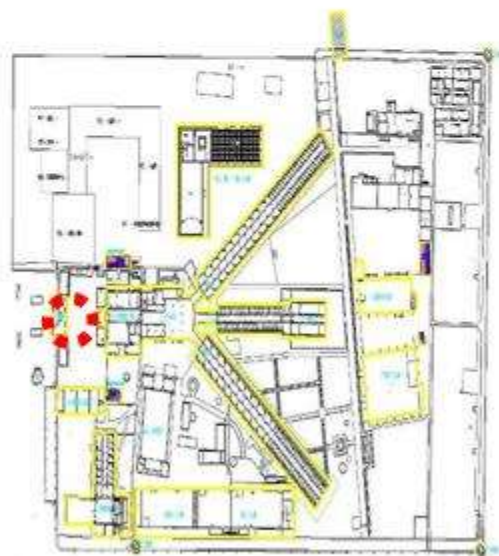

屋瓦試作

工料進場



竹片曬乾

工料進場
