


預計進度61.44% 實際進度61.76% (至3/27止)

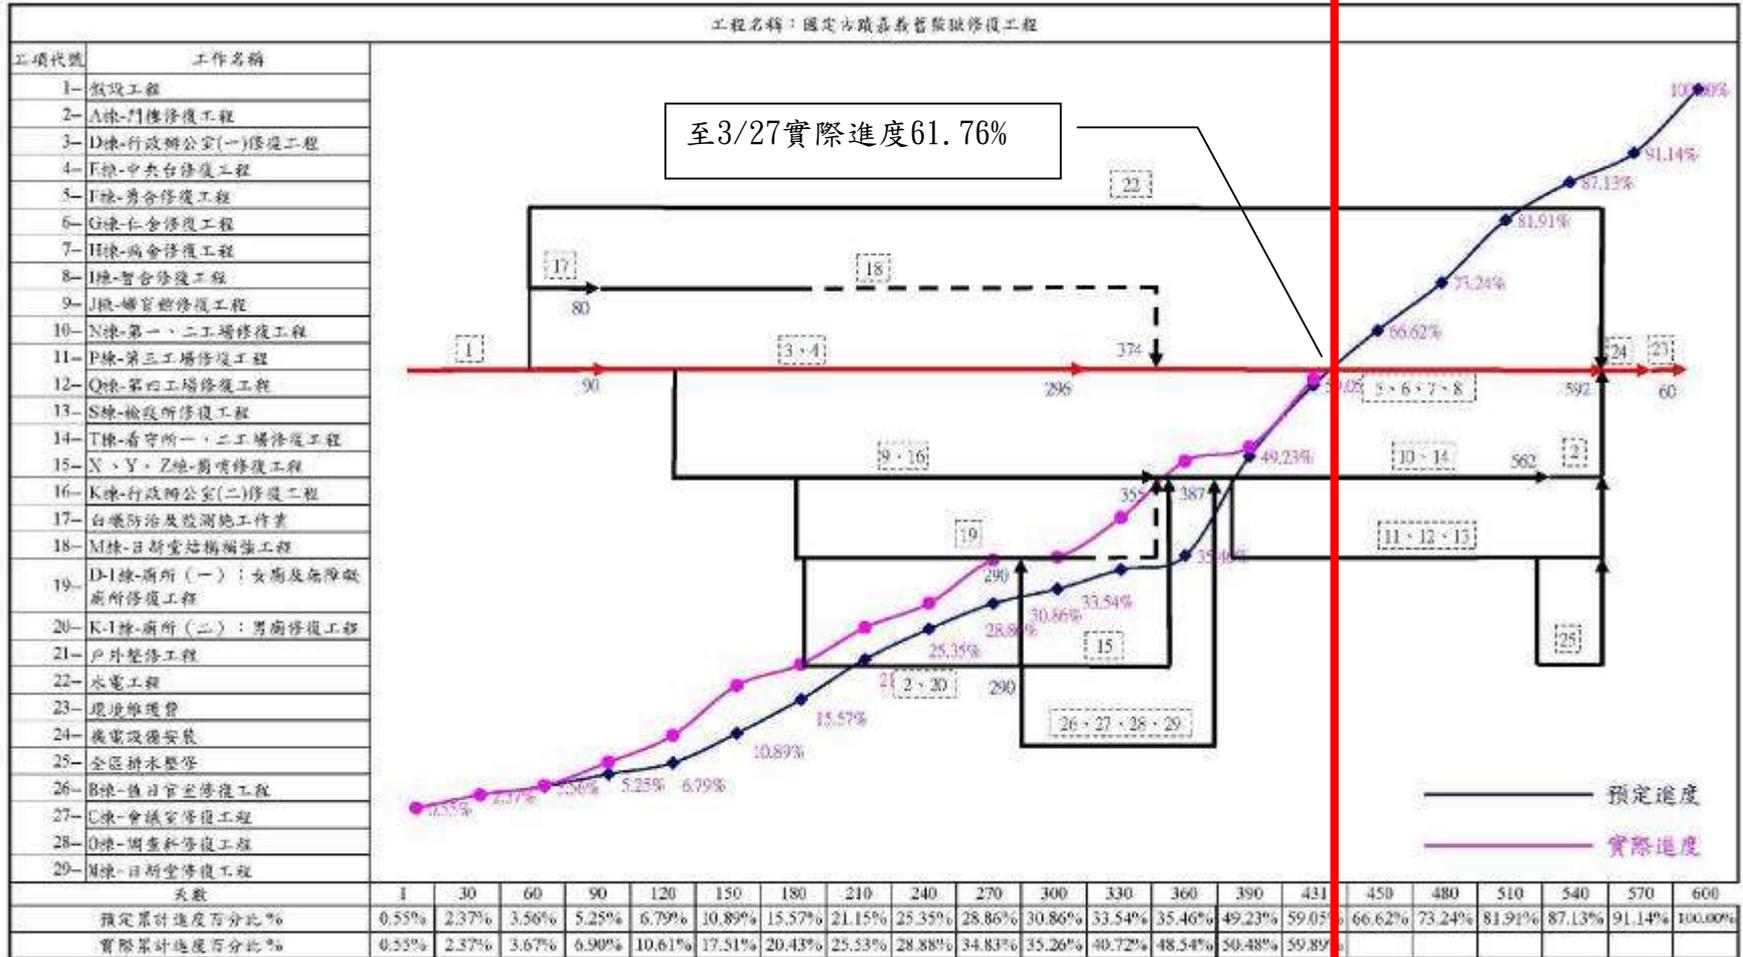


開工日期：98/12/18

備註：98/12/18-100/08/09 共600日曆天，不含相關先計工期。

目前進度

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 屋面構架及門窗檢測。
2. 窗戶玻璃安裝施作。
3. 水電管路施作。
4. 鷹架施作。
5. 雨淋板整修施作。
6. 屋面文化瓦施作。
7. 木構架拆卸整修、仿作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. RA防水層施作。
10. 銅製落水頭安裝施作。
11. 屋架護木油施作。
12. 屋面掛瓦條施作。
13. 地坪粉刷層施作。
14. 男廁隔間磚牆及衛浴設備安裝施作。

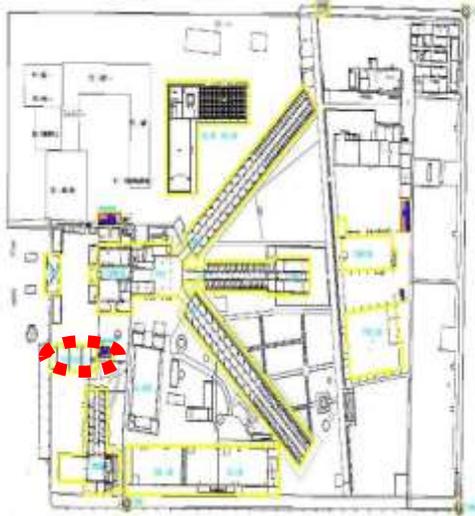

銅皮雨庇安裝施作

行政大樓(二)



銅製落水管安裝施作

行政大樓(二)



男廁洗手台安裝施作

行政大樓(二)



男廁門板安裝施作

行政大樓(二)

※行政辦公室(一)施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 屋面構架及門窗檢測。
3. 門窗及玻璃安裝施作。
4. 天溝集水器安裝施作。
5. 鋼棚架拆卸施作。
6. 女廁無障礙空間磚牆施作。
7. 防潮灌注施作。
8. 天花板油漆施作。
9. 地坪水泥粉光。
10. 電氣配管施作。
11. 屋面文化瓦施作。
12. 白灰壁面施作。
13. 雨淋板施作。
14. 洗石子踢腳研磨施作。




洗石子踢角研磨施作

行政大樓(一)



鋼棚架拆卸施作

行政大樓(一)

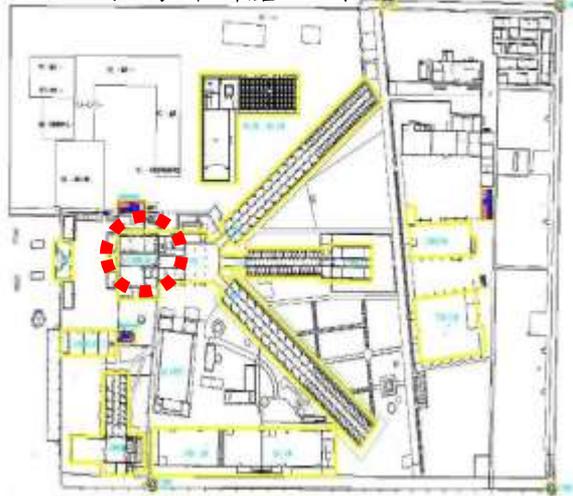

門窗玻璃安裝施作

行政大樓(一)



銅製天溝施作

行政大樓(一)

※女廁施作項目：

1. 屋面拆除。
2. 雨淋板施作。
3. 屋面板施作。
4. 編竹夾泥牆施作。
5. 水電管路施作。
6. 屋面水泥瓦施作。
7. 隔間地坪放樣施作。
8. 衛浴設備安裝。
9. 輕隔間安裝。
10. 壁面磁磚施作。




壁面油漆施作

女廁



門板安裝施作

女廁

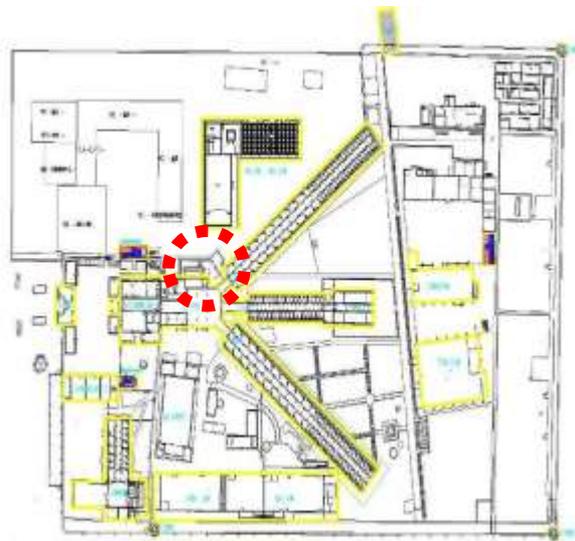

消防管溝施作

女廁



地坪步道修補施作

女廁

※婦育館施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 強化玻璃框架安裝施作。
3. 門窗校調施作。
4. 天花板安裝電扇安裝及防鏽漆塗刷施作。
5. 木地板整修仿作。
6. 雨庇銅皮屋面施作。
7. 戶外地坪水泥粉光施作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. 力霸鋼架紅丹漆施作。
10. 防潮灌注施作。
11. 白灰壁體鑿修。
12. 門窗清潔施作。
13. 電氣管路施作。
14. 銅製天溝安裝施作。




室外地坪施作

婦育館



鐵窗防鏽漆施作

婦育館

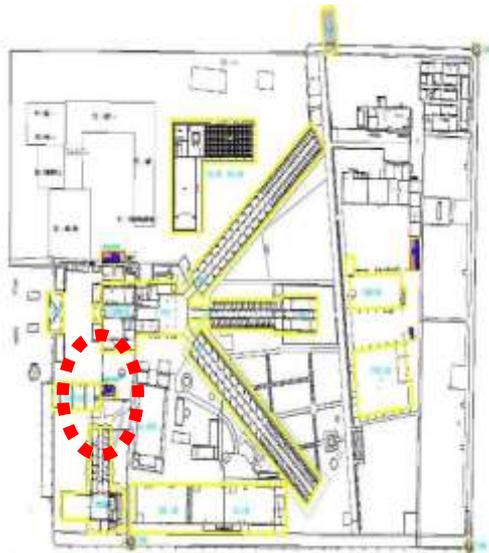

天花板電扇施作

婦育館




門窗校調施作

婦育館

※中央台施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 門窗整修及玻璃安裝施作。
3. 漆食壁面施作。
4. 天花板新作及雨淋板護木油塗刷。
5. 立柱基礎油漆修補施作。
6. 木構架拆卸仿作假安裝。
7. 職員休息室牆面整修仿作。
8. 天溝集水器施作。
9. 看守所通道打通。
10. 屋面板安裝施作。
11. 水電管路施作。
12. 屋面板水泥瓦鋪設。

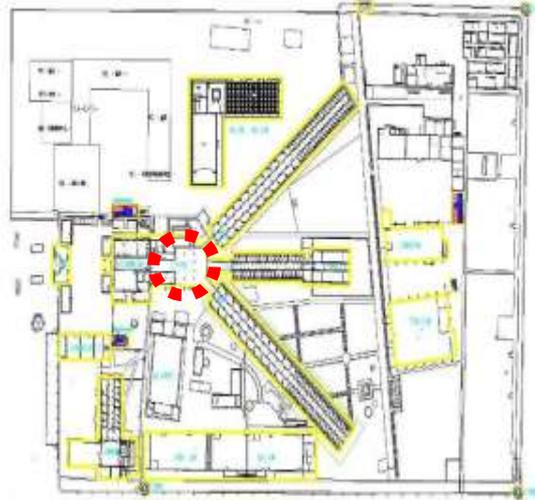

雨淋板護木油修補施作

中央台



編竹夾泥牆施作

中央台



室內燈具安裝施作

中央台




職員休息室牆面整修仿作

中央台

※智舍施作項目：

1. 屋面防水層施作。
2. 屋架修補施作。
3. 原有舍房房門拆除。
4. 鷹架施作。
5. 舍房鐵門紅丹漆施作。
6. 舍房地坪木地板拆除。
7. 舍房牆面防潮施作。
8. 外牆物理噴塗。
9. 屋面掛瓦條施作。
10. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
11. 門框扇整修新作。
12. 舍房天花板護木油塗刷施作。
13. 水泥瓦鋪設施作。

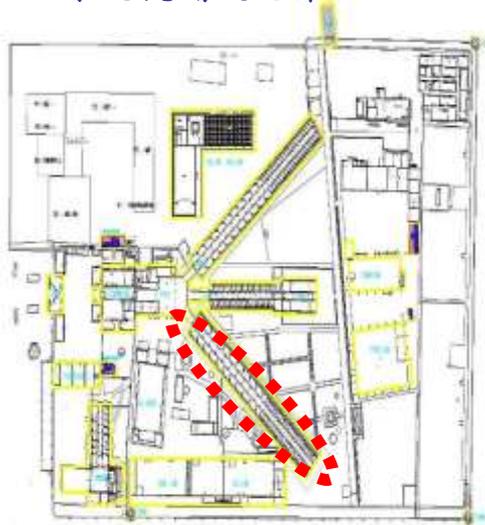

護木油塗刷施作

智舍



屋面防水層施作

智舍



門框扇整修施作

智舍



屋面掛瓦條施作

智舍

※仁舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆除。
2. 桁木、椽條及屋面板整修仿作。
3. 舍房鐵門紅丹漆施作。
4. 舍房地坪木地板拆除。
5. 舍房牆面防潮施作。
6. 竿緣天花板剝漆施作。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
8. 門框整修新作。
9. 屋面屋瓦、掛瓦條、屋面板及防水層拆卸施作。
10. 屋架修補施作。
11. 門板護木油施作。




屋面板拆卸施作

仁舍



門板護木油施作

仁舍

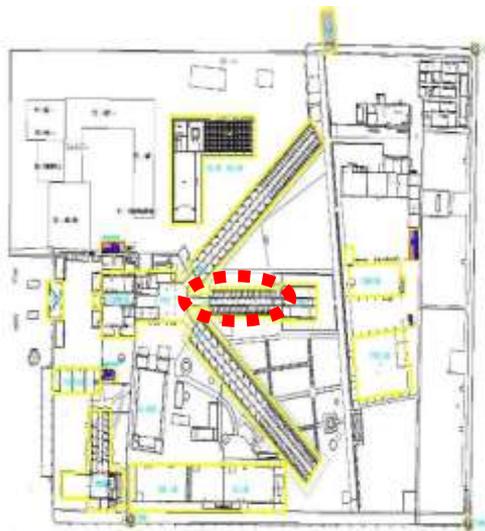

桁木椽條修補施作

仁舍



門框扇整修新作

仁舍

病舍

※病舍施作項目：

1. 屋架拆除整修仿作。
2. 桁木椽條施作。
3. 屋面板施作。
4. 屋面防水層施作。
5. 門窗剝漆施作。
6. 門窗及立柱修補施作。
7. 鷹架拆除施作。
8. 屋面水泥瓦鋪設施作。
9. 天花及立柱護木油塗刷施作。
10. 門框扇整修仿作。
11. 編竹夾泥牆施作。



編竹夾泥牆施作

病舍



護木油塗刷施作

病舍



鷹架拆除施作

病舍




水泥瓦鋪設施作

病舍

※勇舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆卸。
2. 舍房鐵門紅丹漆施作。
3. 舍房地坪木地板拆除。
4. 舍房牆面防潮施作。
5. 舍房門窗剝漆施作。
6. 外牆面物理噴塗。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
8. 屋架桁木整修仿作。
9. 門框整修新作。
10. 屋面水泥瓦、防水層、屋面板拆卸。
11. 牆面壁體復健劑施作。

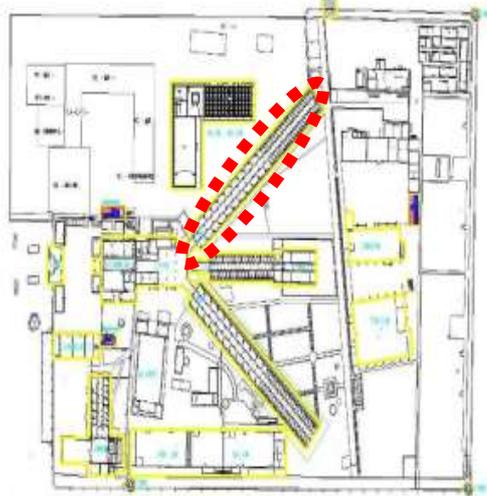

門窗整修新作

勇舍



門窗整修新作

勇舍



牆面復健劑施作

勇舍



屋面板拆卸施作

勇舍

第一二工場

※第一二工場施作項目：

1. 屋面防水層施作。
2. 屋面構架及門窗檢測原有門窗拆卸。
3. 牆面物理噴塗。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 屋面板鋪設施作。
8. 門窗剝漆施作。
9. 木構架、桁木、椽條拆卸仿作。
10. 氣窗整修仿作。
11. 編竹夾泥牆仿舊新作。
12. 護木油塗刷。
13. 鋼棚架拆卸施作。
14. 結構補強地樑施作。




鋼棚架拆卸施作

第一二工場



屋面防水層施作

第一二工場

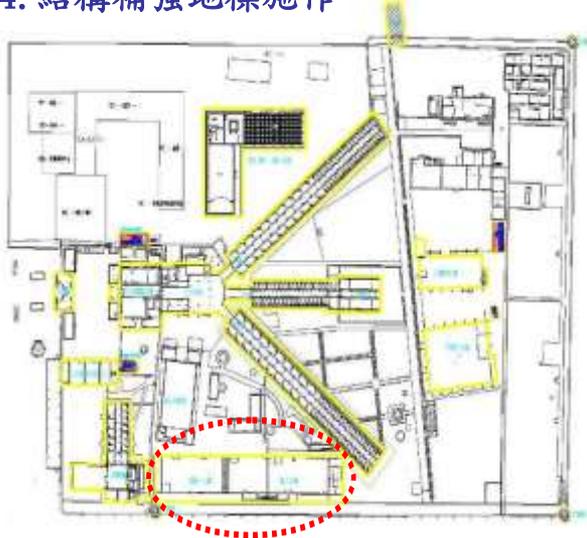

結構補強地樑施作

第一二工場



編竹夾泥牆壁體整修仿作

第一二工場

※第三工場施作項目：

1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 舊有管線拆除。
4. 屋面水泥瓦拆卸施作。




屋面水泥瓦拆除施作

第三工場



屋面水泥瓦清洗

第三工場

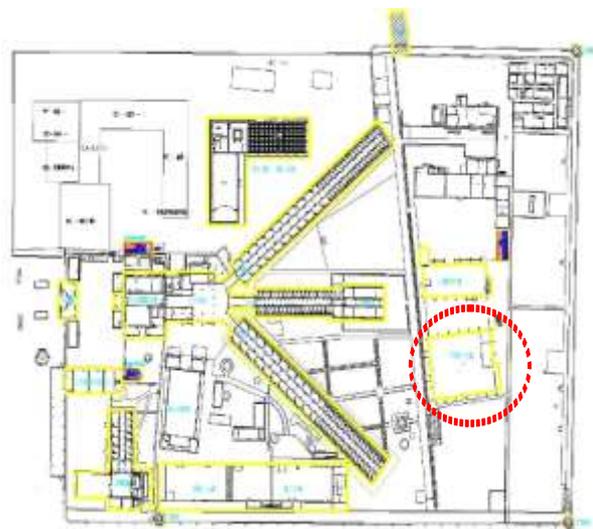

屋面水泥瓦拆卸施作

第三工場




屋面水泥瓦拆卸施作

第三工場

※第四工場施作項目：

1. 舊有管線拆除。
2. 門窗窗框整修施作。
3. 屋面瓦拆卸整理。
4. 木襯板拆卸整理。
5. 結構臨時鋼管支撐。
6. 屋架整修仿作。
7. 編竹夾泥牆施作。
8. 屋面板整修仿作。
9. 護木油塗刷施作。
10. 雨淋板整修仿作。
11. 銅皮屋面安裝施作。

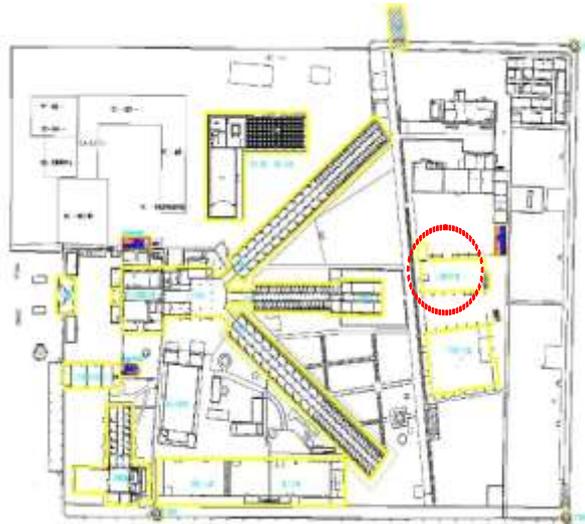

銅皮屋面安裝施作

第四工場



門窗整修仿作

第四工場



雨淋板整修仿作

第四工場




編竹夾泥牆施作

第四工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除施作。
2. 屋面及雨庇水泥瓦鋪設施作。
3. 門窗整修仿作。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 雨庇銅皮屋面及銅製天溝安裝施作。
8. 屋面板鋪設施作。
9. 木構架護木油施作。
10. 牆面粉刷層修復施作。
11. 屋面板木椽條施作。
12. 結構補強地樑施作。
13. 編竹夾泥牆壁體仿舊施作。

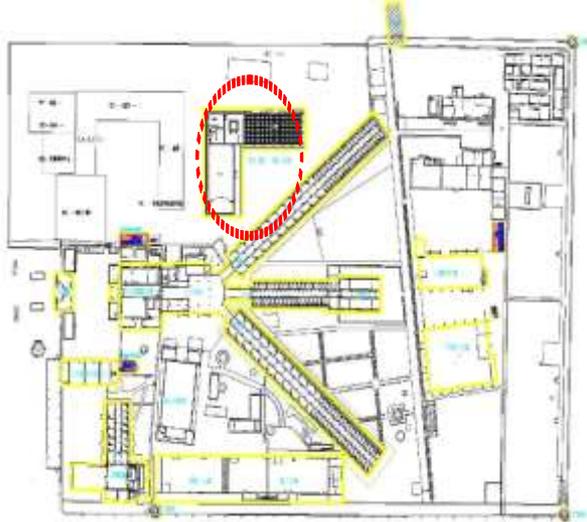

銅製天溝安裝施作

看守所第一二工場



牆面粉刷層修復施作

看守所第一二工場



門窗整修仿作

看守所第一二工場



竿緣天花油漆施作

看守所第一二工場

※檢疫所施作項目：

1. 鐵皮屋面拆卸。
2. 屋架桁木椽條整修仿作。
3. 屋面木襯板鋪設。
4. 屋面防水層施作。
5. 屋面掛瓦條施作。
6. 屋面水泥瓦鋪設施作。
7. 護木油塗刷。




銅製天溝安裝施作

檢疫所



屋面掛瓦條施作

檢疫所

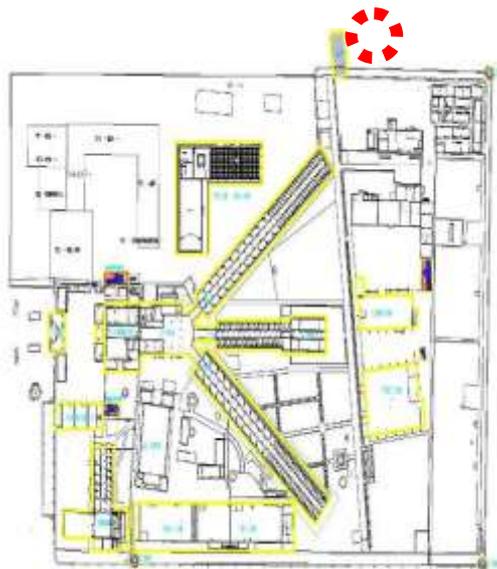

椽條施作

檢疫所



屋面水泥瓦鋪設施作

檢疫所

※路燈管線及管溝施作項目：

1. 管溝開挖回填夯實。
2. 路燈管線開挖。
3. 路燈基座施作。
4. 共同管溝開挖。
5. 消防給水管施作。
6. 管溝混凝土回填澆置。



消防給水管開挖施作


路燈管線

路燈管線及管溝



管溝回填夯實

路燈管線

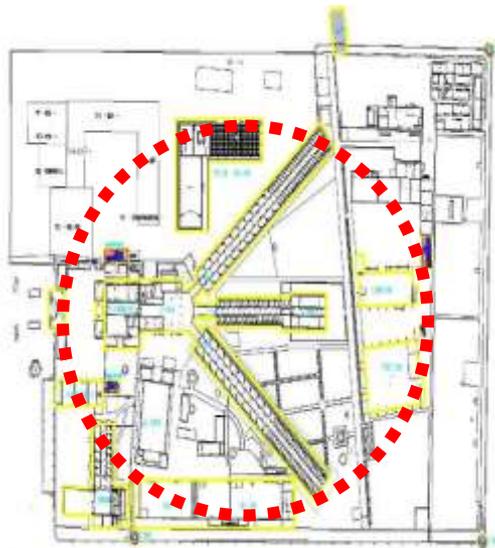

管溝鋪設回填施作

管溝



管溝混凝土回填澆置

管溝

※本監收容人協助修繕

施作項目：

1. 防空洞洗石子修補施作。
2. 花架修繕油漆。
3. 噴水池修補施作。
4. 泥塑造景修復。
5. 植栽復育種植。



水池修繕施作


舊監修繕

本監收容人協助修繕



地景修繕施作

舊監修繕

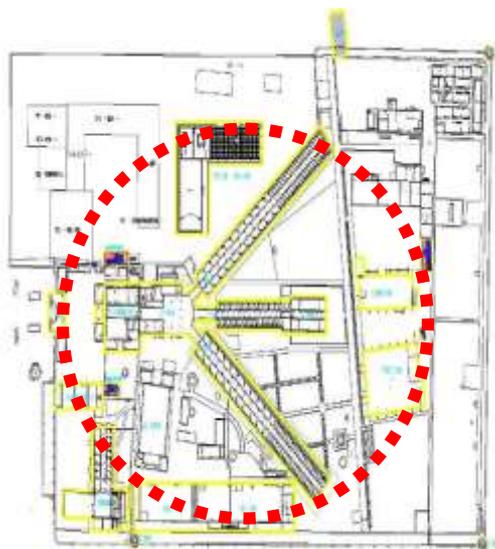

庭園造景爬藤栽種

舊監修繕



地景修繕施作

舊監修繕

※工料進場：（依合約規範進行廠驗、初驗、複驗及不合格品退料）

1. 進場前廠驗。
2. 工地現場營造廠初驗。
3. 初驗完成後會同委辦單位、監造單位及業主進行材料複驗。
4. 不合格品退料。
5. 材種鑑定。



閘門閥進場


工料進場

工料進場



不合格品退料

工料進場

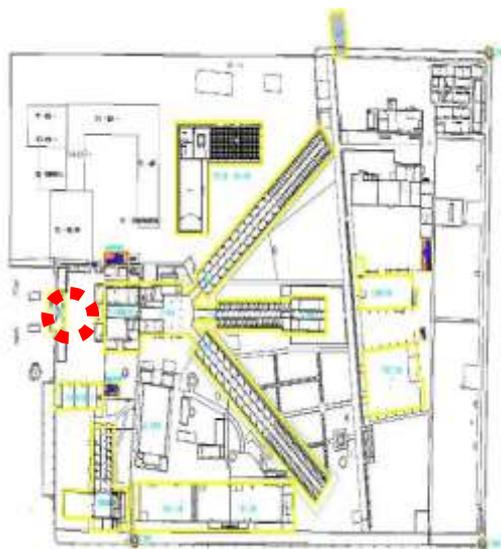

木料進場

工料進場




木料進場

工料進場

※工料進場：（依合約規範進行廠驗、初驗、複驗及不合格品退料）

1. 進場前廠驗。
2. 工地現場營造廠初驗。
3. 初驗完成後會同委辦單位、監造單位及業主進行材料複驗。
4. 不合格品退料。
5. 材料鑑定。

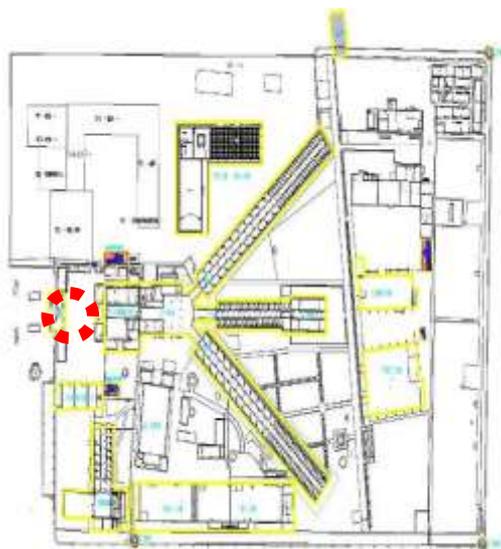

壁體防水材料進場

工料進場

工料進場



屋面防水材料進場

工料進場



護木油材料進場

工料進場




屋面水泥瓦進場

工料進場


※工料進場：（依合約規範進行廠驗、初驗、複驗及不合格品退料）

1. 進場前廠驗。
2. 工地現場營造廠初驗。
3. 初驗完成後會同委辦單位、監造單位及業主進行材料複驗。
4. 不合格品退料。
5. 材料鑑定。

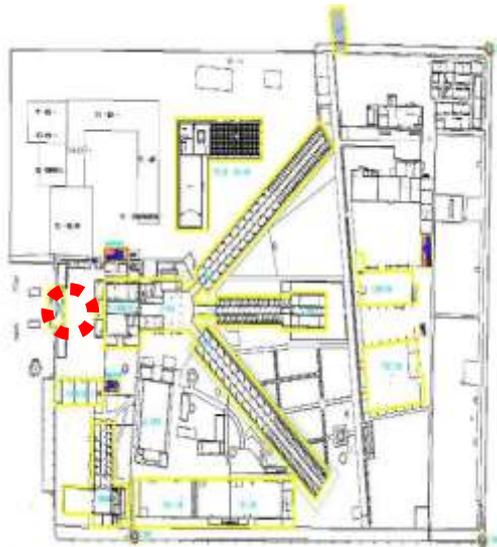

衛浴設備進場

工料進場

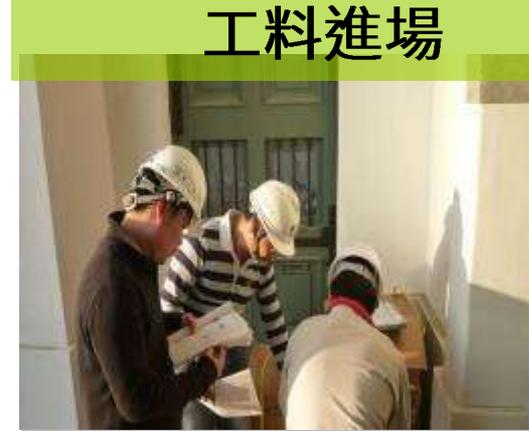

衛浴設備進場

工料進場



木料進場

工料進場



水電材料進場

工料進場

※材料試驗：

1. 編竹夾泥牆樣品試作。
2. 屋瓦樣品試作。
3. 樁接樣式試作。
4. 白灰養灰。
5. 植筋拉拔試驗。
6. 餌站檢測。
7. 焊道檢測。
8. 混凝土抗壓強度檢測。



餌站檢測

材料試驗

材料試驗



植筋拉拔試驗

材料試驗



焊道檢測

材料試驗



植筋拉拔試驗

材料試驗

安衛執行狀況

一、環境衛生：

- (一)工區全面進行消毒防止蚊蟲病媒等媒介之傳染
- (二)全區進行定期及不定期環境清理

二、工區安全：

- (一)上下鷹架設置安全爬梯及警語
- (二)施作機具張貼安全警示標語
- (三)臨時電箱進行定期及不定期檢查



設置安全爬梯及警語

智舍



臨時電箱檢查

智舍



張貼警示標語

第一二工場



不定期環境清理

工區辦公室



※其他：
與勞工安全及衛生之
一切事宜



每日進行勞工安全宣導

工務所前籃球場

安衛執行狀況(其他)



消防滅火器示範操作

工務所前籃球場



消防滅火器示範操作

工務所前籃球場



消防滅火器示範操作

工務所前籃球場

