




# 國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



100.2.22工程進度簡報

預計進度51.59% 實際進度52.58% (2/20止)

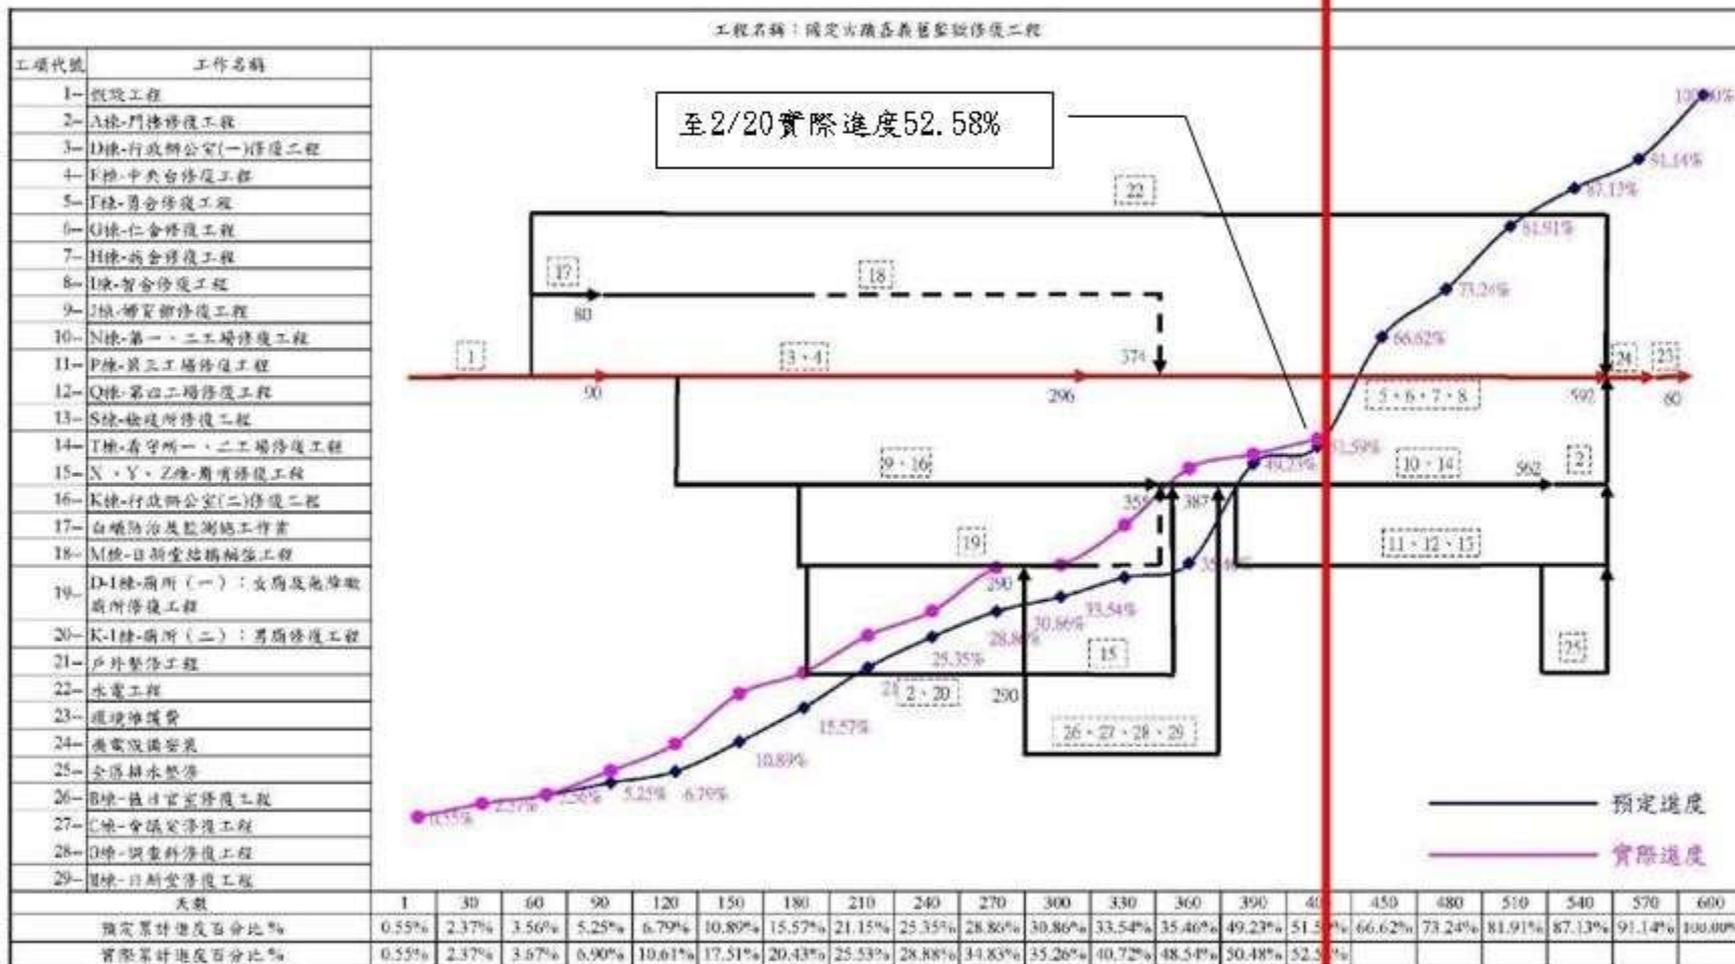

開工日期：98/12/18

請 註：98/12/18~10E/08/09 共600日曆天，不含組裝兼計工期。

目前進度


※門樓施作項目：

1. 門窗整修仿作。
2. 鷹架施作。
3. 舊有防水層剝除。
4. 門窗剝漆。
5. 白灰壁體面層施作。
6. 鋼筋防鏽處理。
7. 水電配管施作。
8. 門窗整修仿作。
9. RA防水施作。
10. 門板油漆重裝。
11. 門樓匾額表面拋光施作。



門板整修仿作

門樓

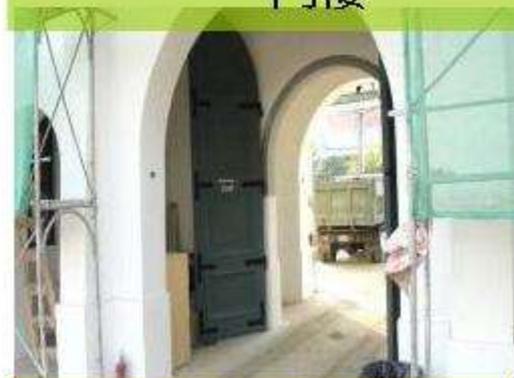

金屬零件油漆施作

門樓



門板油漆施作

門樓




匾額表面拋光施作

門樓

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 屋面構架及門窗檢測。
2. 窗戶玻璃安裝施作。
3. 水電管路施作。
4. 鷹架施作。
5. 兩淋板整修施作。
6. 屋面文化瓦施作。
7. 木構架拆卸整修、仿作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. RA防水層施作。
10. 銅製落水頭安裝施作。
11. 屋架護木油施作。
12. 屋面掛瓦條施作。
13. 地坪粉刷層施作。
14. 男廁隔間磚牆及衛浴設備安裝施作。

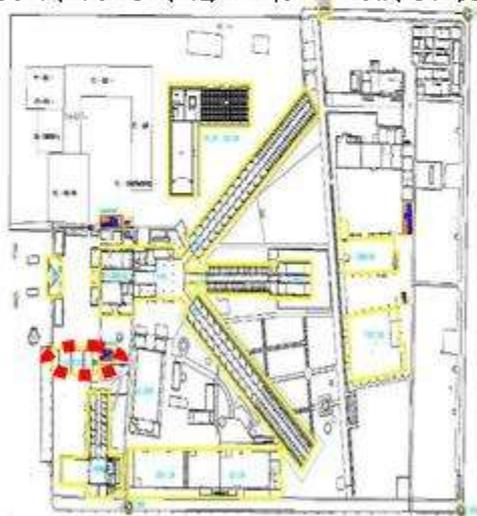

男廁小便斗安裝施作

行政大樓(二)



銅製落水管安裝施作

行政大樓(二)



牆面磨石子施作

行政大樓(二)



男廁門板安裝施作

行政大樓(二)


※行政辦公室(一)施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 屋面構架及門窗檢測。
3. 門窗及玻璃安裝施作。
4. 天溝集水器安裝施作。
5. 鋼棚架拆卸施作。
6. 女廁無障礙空間磚牆施作。
7. 防潮灌注施作。
8. 天花板油漆施作。
9. 地坪水泥粉光。
10. 電氣配管施作。
11. 屋面文化瓦施作。
12. 白灰壁面施作。
13. 雨淋板施作。
14. 洗石子踢腳研磨施作。



洗石子踢角研磨施作

行政大樓(一)

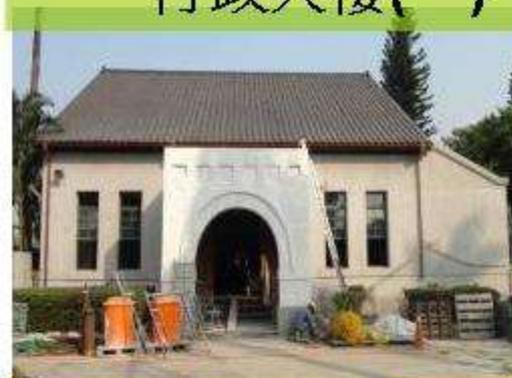

鋼棚架拆卸施作

行政大樓(一)



門窗玻璃安裝施作

行政大樓(一)



銅製天溝施作

行政大樓(一)

※女廁施作項目：


1. 屋面拆除。
2. 雨淋板施作。
3. 屋面板施作。
4. 編竹夾泥牆施作。
5. 水電管路施作。
6. 屋面水泥瓦施作。
7. 隔間地坪放樣施作。
8. 衛浴設備安裝。
9. 輕隔間安裝。
10. 壁面磁磚施作。



壁面磁磚施作


女廁

女廁

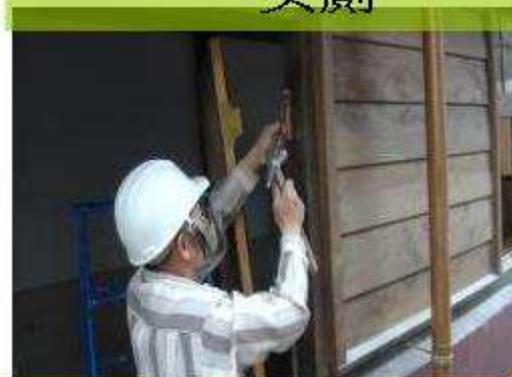

門板安裝施作

女廁

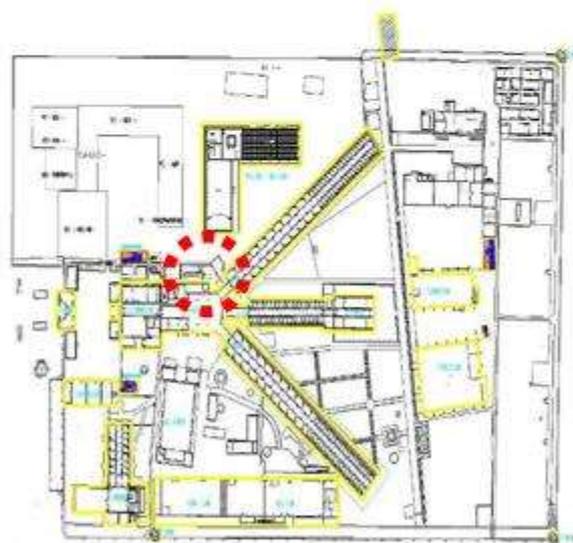

隔間磚牆砌磚施作

女廁




無障礙廁所牆面施作

女廁

※婦育館施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 強化玻璃框架安裝施作。
3. 門窗按調施作。
4. 天花板安裝電扇安裝及護鏽漆塗刷施作。
5. 木地板整修仿作。
6. 兩庇銅皮屋面施作。
7. 戶外地坪水泥粉光施作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. 力霸鋼架紅丹漆施作。
10. 防潮灌注施作。
11. 白灰壁體鑿修。
12. 門窗清潔施作。
13. 電氣管路施作。
14. 銅製天溝安裝施作。

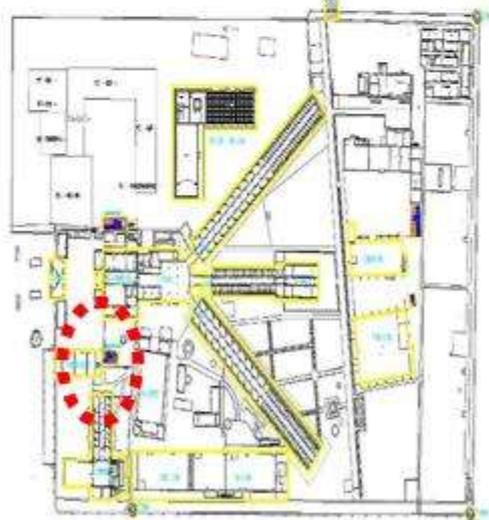

門窗清潔施作

婦育館



鐵窗防鏽漆施作

婦育館



天花板電扇施作

婦育館



門窗按調施作

婦育館


※中央台施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 門窗整修及玻璃安裝施作。
3. 漆食壁面施作。
4. 天花板新作及雨淋板護木油塗刷。
5. 立柱基礎油漆修補施作。
6. 木構架拆卸仿作假安裝。
7. 職員休息室牆面整修仿作。
8. 天溝集水器施作。
9. 看守所通道打通。
10. 屋面板安裝施作。
11. 水電管路施作。
12. 屋面水泥瓦鋪設。



油漆修補施作

中央台

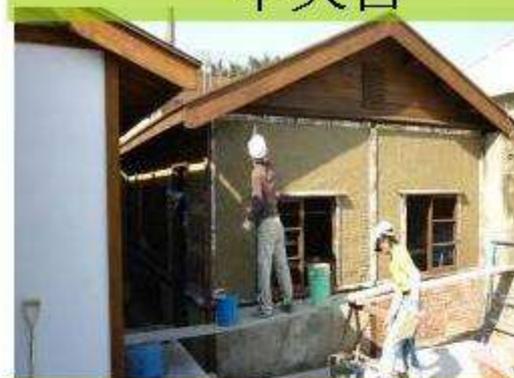

編竹夾泥牆施作

中央台




編竹夾泥牆中塗施作

中央台




職員休息室牆面整修仿作

中央台

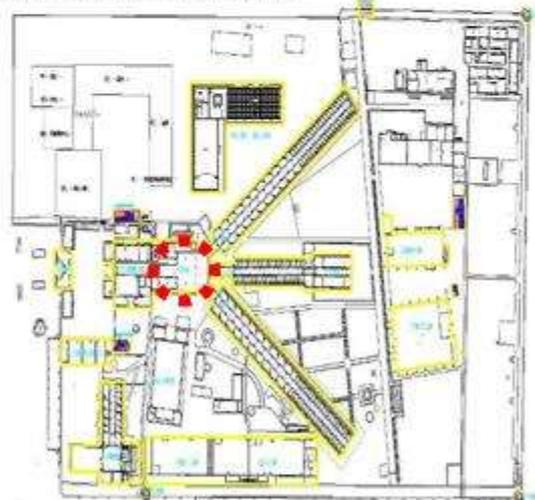

※智舍施作項目：

1. 屋面屋瓦、掛瓦條、防水層及屋面板拆除。
2. 屋架修補施作。
3. 原有舍房房門拆除。
4. 鷹架施作。
5. 舍房鐵門紅丹漆施作。
6. 舍房地坪木地板拆除。
7. 舍房牆面防潮施作。
8. 外牆物理噴塗。
9. 舍房天花板剝漆施作。
10. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
11. 門框整修新作。

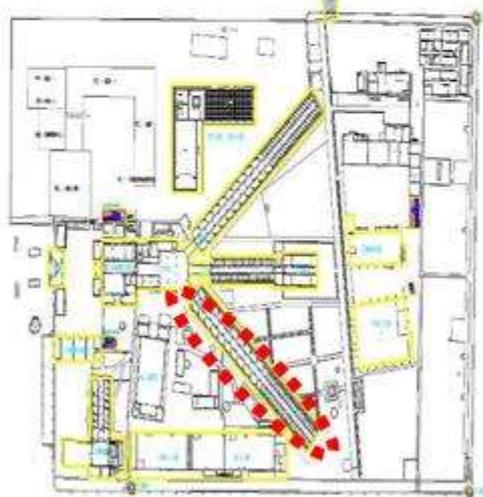

門框整修新作

智舍



屋面防水層拆除施作

智舍



屋面板拆除施作

智舍




屋架修補施作

智舍

※仁舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆除。
2. 鷹架施作。
3. 舍房鐵門紅丹漆施作。
4. 舍房地坪木地板拆除。
5. 舍房牆面防潮施作。
6. 竿緣天花板剝漆施作。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
8. 門框整修新作。
9. 屋面屋瓦、掛瓦條、屋面板及防水層拆卸施作。
10. 屋架修補施作。

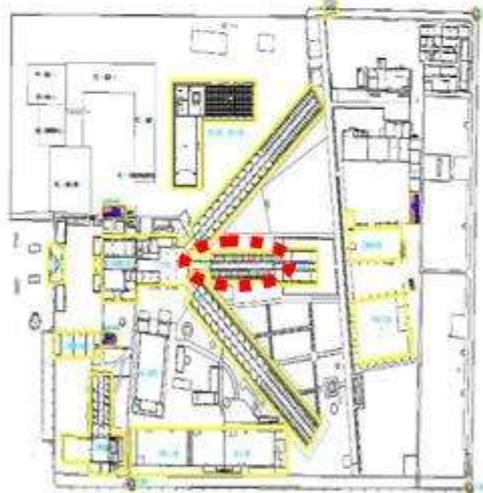

屋面板拆卸施作

仁舍



竿緣天花板剝漆施作

仁舍



屋架修補施作

仁舍



屋面板損壞範圍確認

仁舍

※病舍施作項目：

1. 屋架拆除整修仿作。
2. 桁木椽條施作。
3. 屋面板施作。
4. 屋面防水層施作。
5. 門窗剝漆施作。
6. 門窗及立柱修補施作。
7. 鋼棚架拆除施作。




門窗剝漆施作

病舍



立柱修補施作

病舍

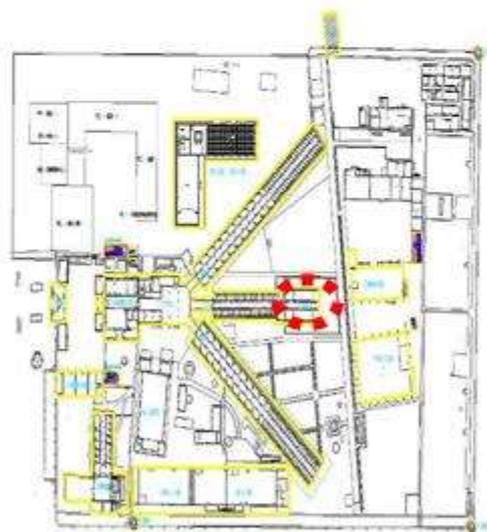

屋面防水層施作

病舍




鋼棚架拆除施作

病舍


※勇舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆卸。
2. 舍房鐵門紅丹漆施作。
3. 舍房地坪木地板拆除。
4. 舍房牆面防潮施作。
5. 舍房門窗剝漆施作。
6. 外牆面物理噴塗。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
8. 外週鷹架組立。
9. 門框整修新作。
10. 屋面水泥瓦拆卸。

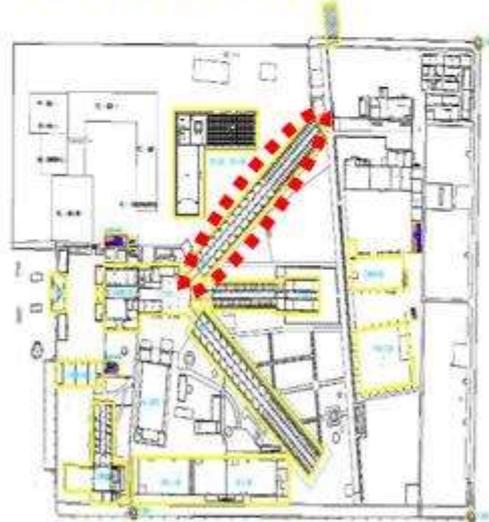

門框整修新作

勇舍

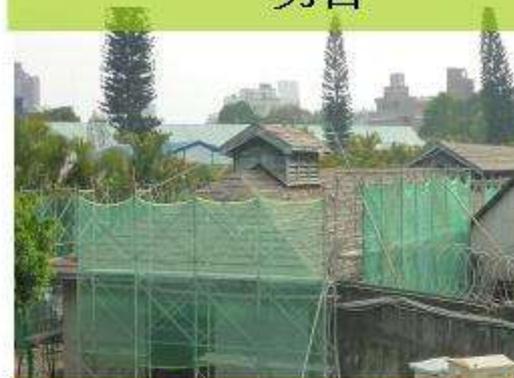

屋面屋瓦拆卸

勇舍



門框整修仿作

勇舍



屋面屋瓦拆卸

勇舍

※第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除。
2. 屋面構架及門窗檢測原有門窗拆卸。
3. 牆面物理噴塗。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 屋面板鋪設施作。
8. 門窗剝漆施作。
9. 木構架、桁木、椽條拆卸仿作。
10. 氣窗整修仿作。
11. 編竹夾泥牆仿舊新作。
12. 護木油塗刷。




屋面板鋪設施作

第一二工場



屋面板鋪設施作

第一二工場

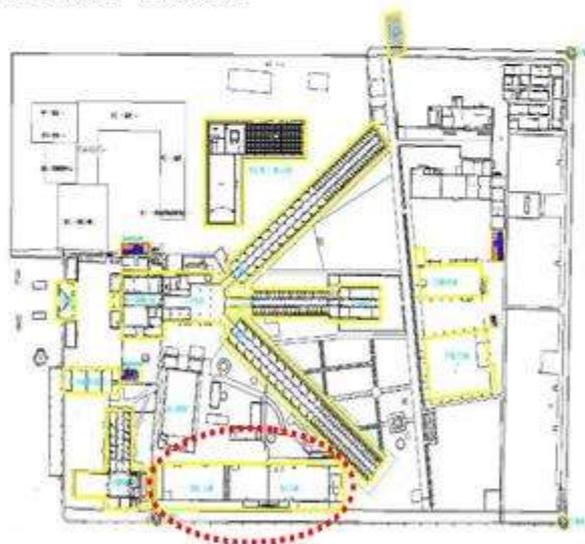

氣窗整修仿作

第一二工場



編竹夾泥牆壁體整修仿作

第一二工場


※第三工場施作項目：

1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 舊有管線拆除。
4. 屋面水泥瓦拆卸施作。




屋面水泥瓦拆除施作

第三工場

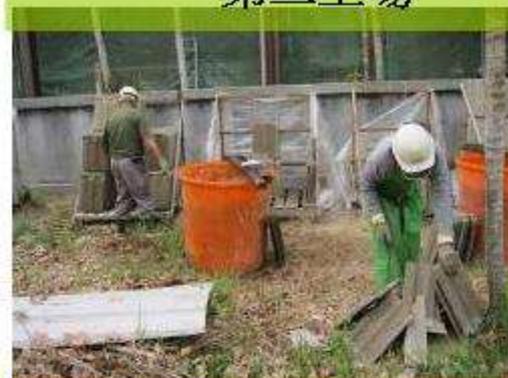

屋面水泥瓦清洗

第三工場

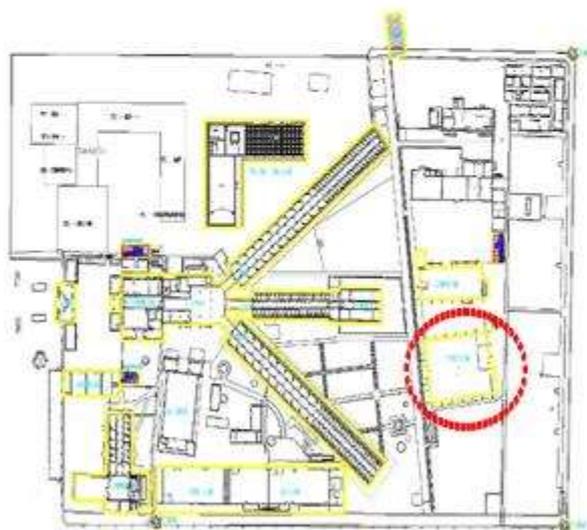

屋面水泥瓦拆卸施作

第三工場




屋面水泥瓦拆卸施作

第三工場


※第四工場施作項目：

1. 舊有管線拆除。
2. 門窗窗框剝漆施作。
3. 屋面瓦拆卸整理。
4. 木襯板拆卸整理。
5. 結構臨時鋼管支撐。
6. 屋架整修仿作。
7. 編竹夾泥牆施作。
8. 屋面板整修仿作。
9. 護木油塗刷施作。
10. 雨淋板整修仿作。
11. 雨庇修復施作。

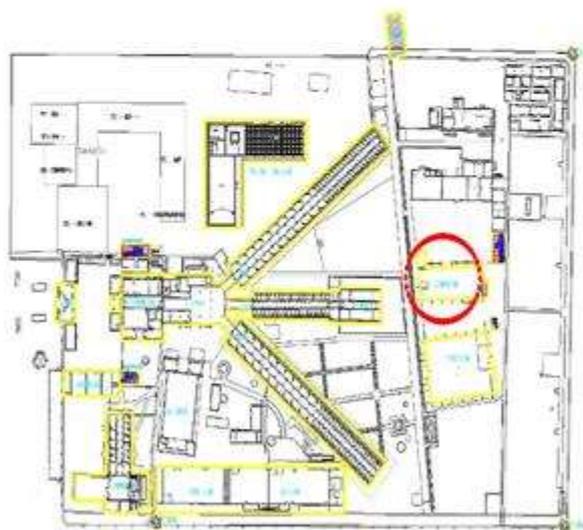

雨庇修復施作

第四工場

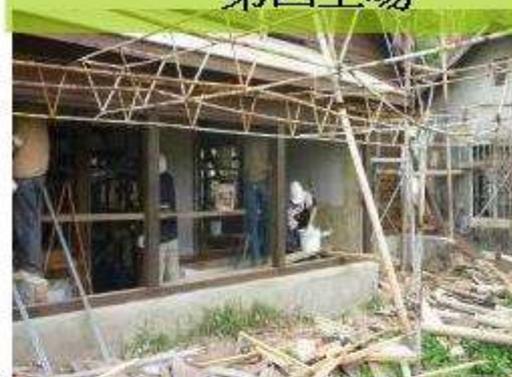

編竹夾泥牆施作

第四工場



雨淋板整修仿作

第四工場




編竹夾泥牆施作

第四工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除施作。
2. 屋面及雨庇水泥瓦鋪設施作。
3. 門窗整修仿作。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 雨庇銅皮屋面施作。
8. 屋面板鋪設施作。
9. 木構架拆卸整修、仿作。
10. 牆面粉刷層修補施作。
11. 屋面桁木椽條施作。
12. 屋面鋼棚架拆卸施作。
13. 編竹夾泥牆壁體仿舊施作。

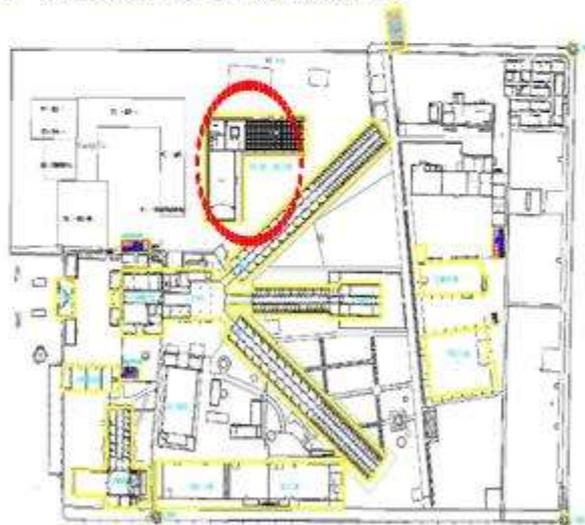

雨庇銅皮屋面施作

看守所第一二工場

看守所第一二工場



門窗修補施作

看守所第一二工場



牆面氣窗整修仿作

看守所第一二工場



牆面整修仿作

看守所第一二工場

※檢疫所施作項目：

1. 鐵皮屋面拆卸。
2. 屋架桁木椽條整修仿作。
3. 屋面木襯板鋪設。
4. 屋面防水層施作。
5. 屋面掛瓦條施作。
6. 屋面水泥瓦鋪設施作。
7. 護木油塗刷。



護木油塗刷

檢疫所



屋面掛瓦條施作

檢疫所



椽條施作

檢疫所



屋面水泥瓦鋪設施作

檢疫所

