




# 國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



99.10.24工程進度簡報

預計進度31.25% 實際進度35.49% (至99/10/24止)

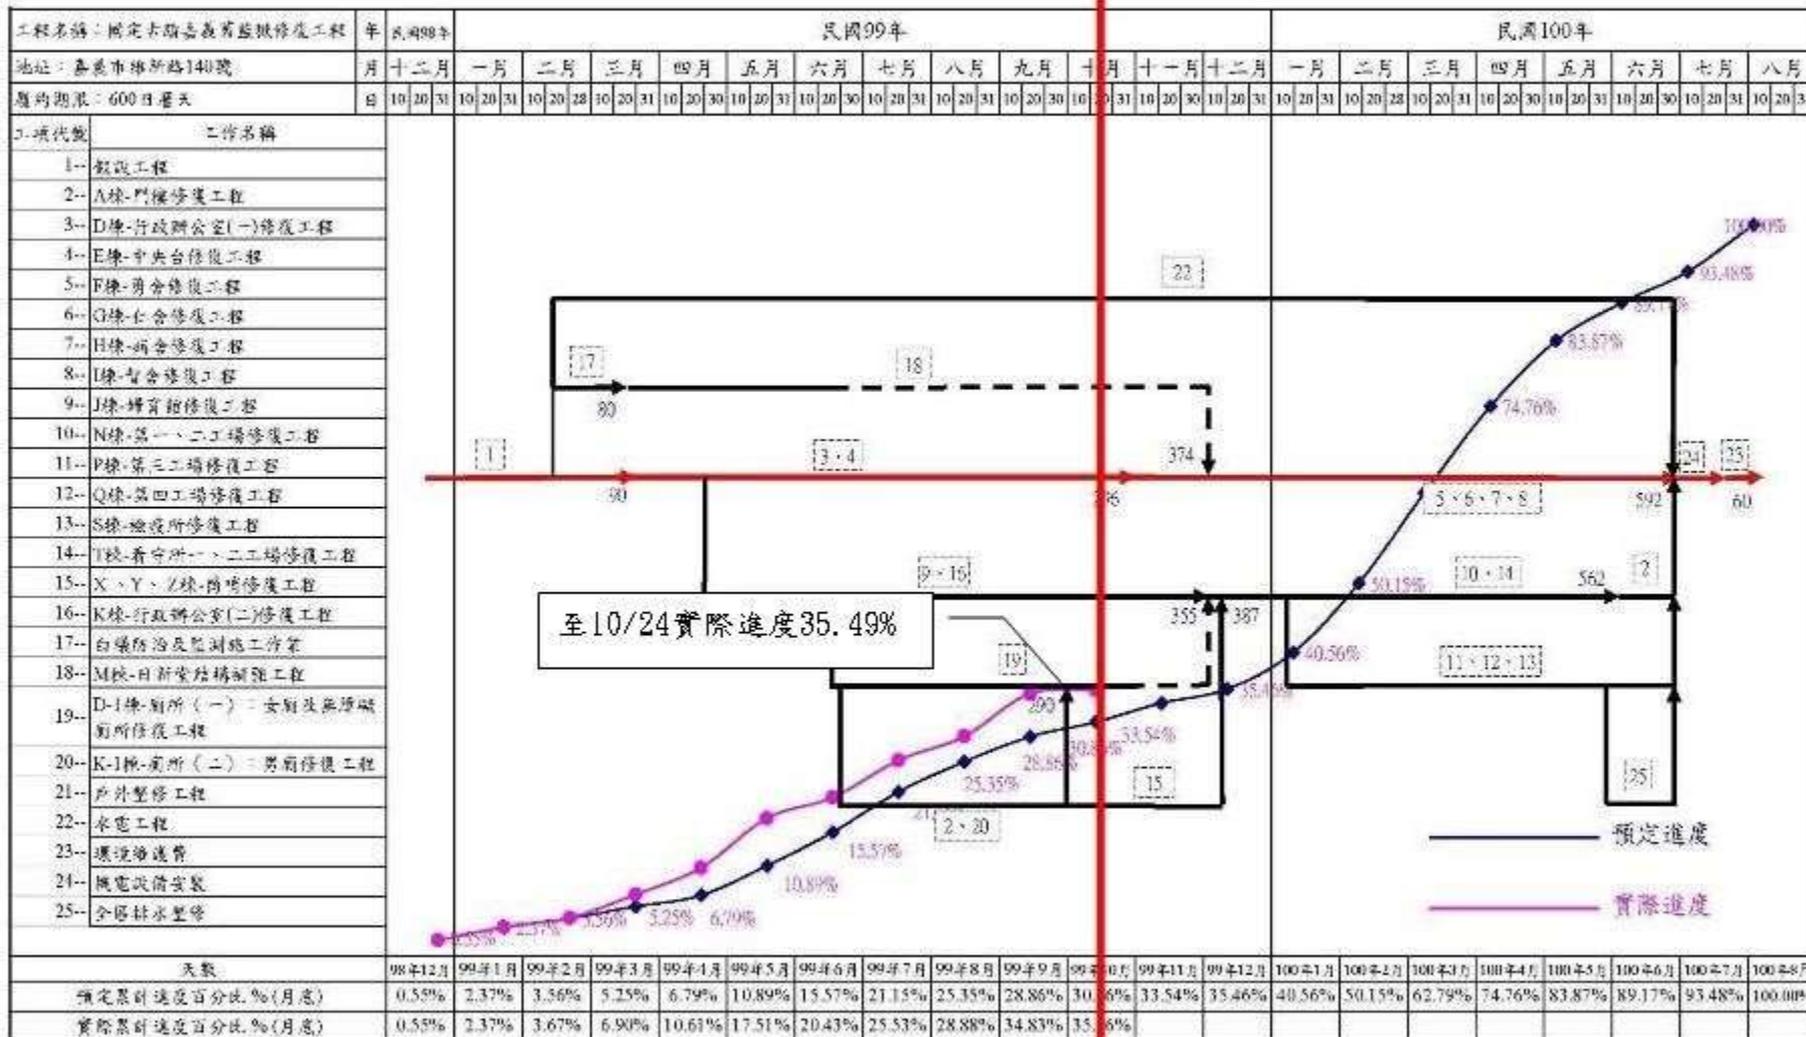


至10/24實際進度35.49%

目前進度

### ※值日官室及會議室

施作項目：

1. 屋架整修仿作。
2. 門窗整修仿作。
3. 屋架桁木ACQ防蟲蟻藥劑灌注。
4. 屋架及牆面拆卸。

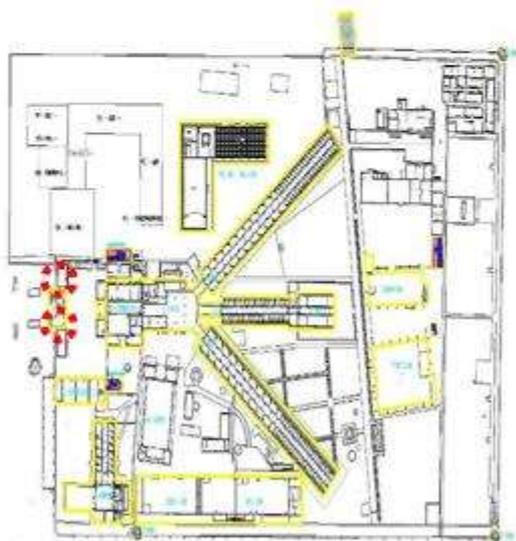

屋架整修仿作

門樓

### 值日官室及會議室



門窗整修仿作

門樓



ACQ藥劑灌注

門樓



牆面拆卸

門樓

## 行政大樓(二)

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 雨淋板整修施作。
2. 屋面文化瓦施作。
3. 編竹夾泥牆施作。
4. 雨庇施作。
5. 屋架護木油施作。
6. 水電管路施作。




屋面文化瓦施作

行政大樓(二)



雨淋板施作

行政大樓(二)

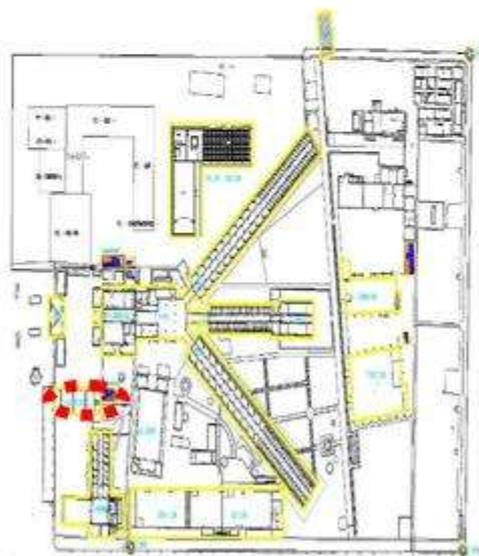

雨庇施作

行政大樓(二)



水電管路施作

行政大樓(二)

※行政辦公室(一)施作項目：

1. 天花板油漆施作。
2. 電氣配管施作。
3. 屋面文化瓦施作。
4. 白灰壁體整修。
5. 雨淋板施作。



屋面文化瓦施作


行政大樓(一)

## 行政大樓(一)



屋面文化瓦施作

行政大樓(一)

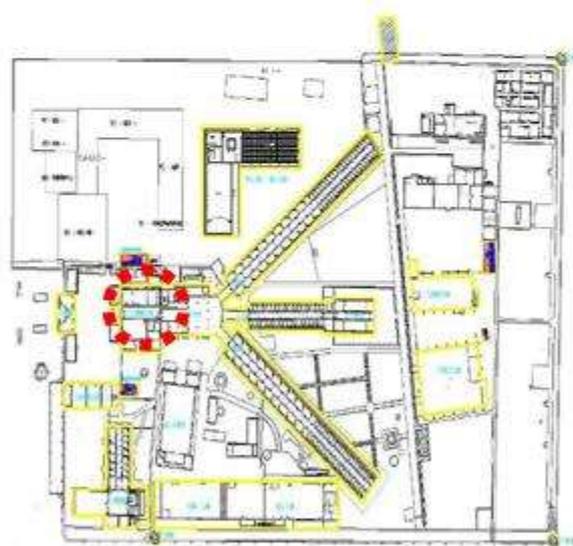

電氣配管

行政大樓(一)



雨淋板施作

行政大樓(一)

※女廁施作項目：

1. 雨淋板施作。
2. 編竹夾泥牆施作。
3. 水電管路施作。
4. 屋面水泥瓦施作。




屋面水泥瓦施作

女廁



水電管路施作

女廁

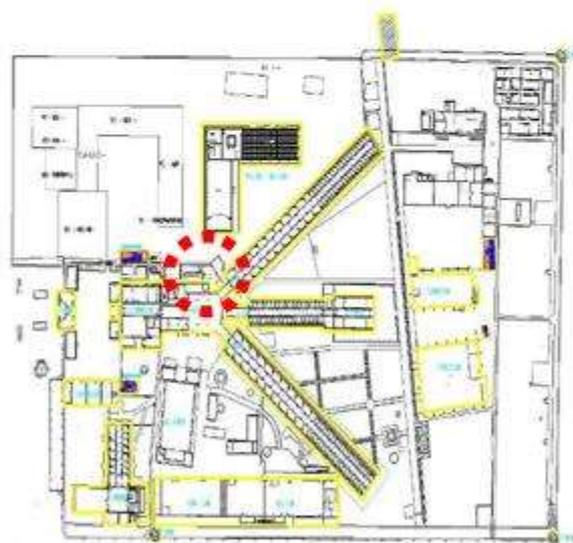

編竹夾泥牆施作

女廁



雨淋板施作

女廁

※婦育館施作項目：

1. 強化玻璃框架安裝施作。
2. 門窗整修施作。
3. 天花板、雨淋板護木油施作。
4. 工場銅皮屋面及強化玻璃框架施作。
5. 電氣配管。
6. 銅製天溝安裝施作。



雨淋板施作

婦育館



天花板護木油施作

婦育館




工場銅皮屋面施作

婦育館



強化玻璃框架安裝施作

婦育館

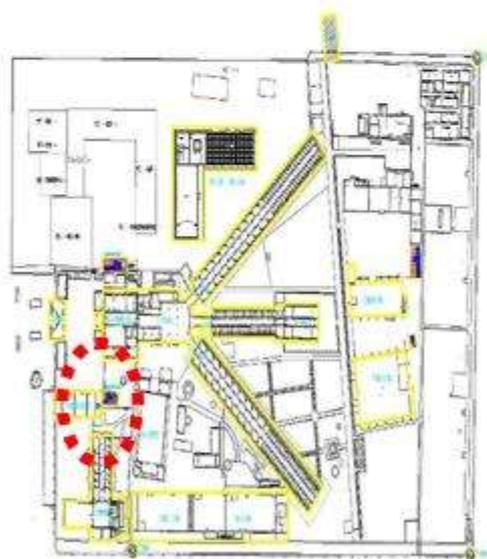

※日新堂施作項目：

1. 結構補強處油漆施作。
2. 剪力牆鑿修施作。
3. 剪力牆及基礎板施作。
4. 屋面防水層及粉刷層施作。



剪力牆鑿修施作

日新堂

日新堂



屋面粉刷層施作

日新堂




結構補強處油漆施作

日新堂



屋面防水層施作

日新堂

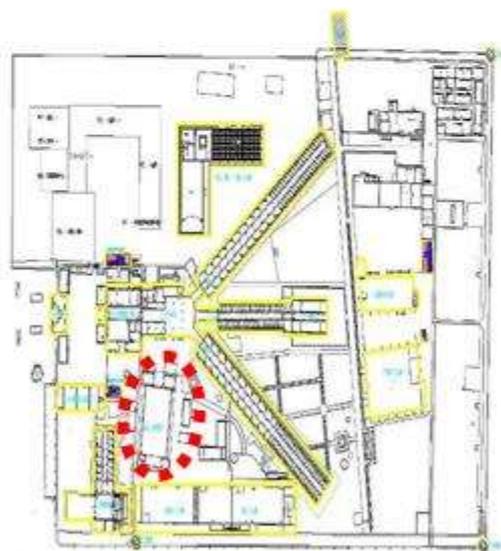

## 中央台


※中央台施作項目：

1. 漆食壁面施作。
2. 天花板新作及護木油塗刷。
3. 屋面板安裝施作。
4. 水電管路施作。
5. 屋面水泥瓦鋪設。



水電管路施作

中央台

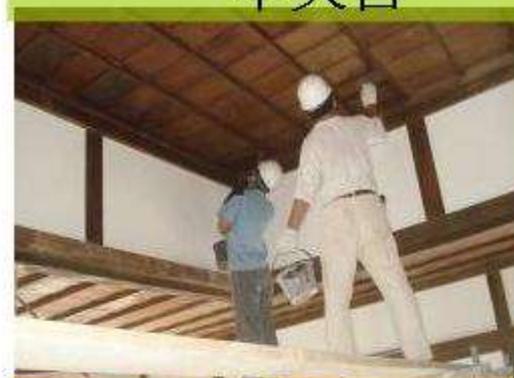

天花板護木油施作

中央台




天花板施作

中央台



漆食壁壁體施作

中央台

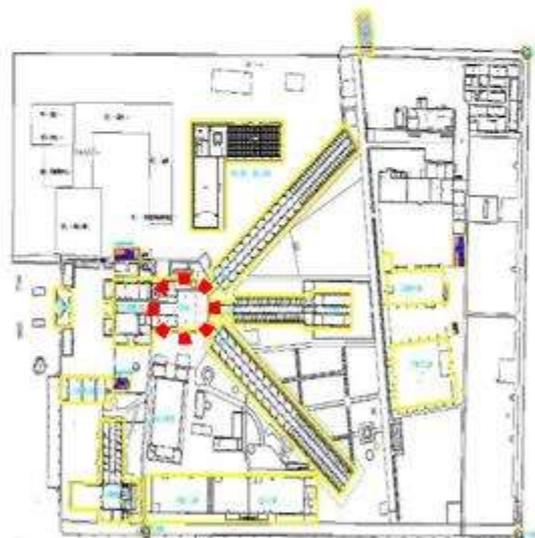

智舍


※智舍施作項目：

1. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。




舍房壁體鑿修施作

智舍

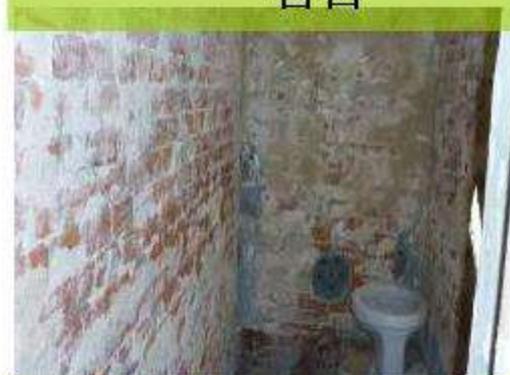

舍房壁體鑿修施作

智舍

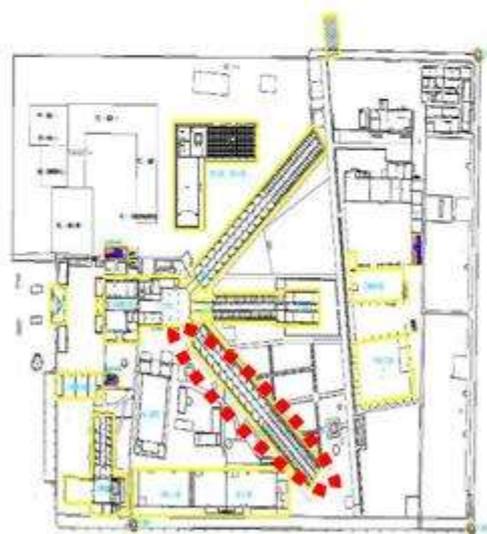

舍房白灰壁體粉刷層施作

智舍



舍房白灰壁體粉刷層施作

智舍

仁舍

※仁舍施作項目：

1. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。




舍房壁體鑿修施作

仁舍



漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍

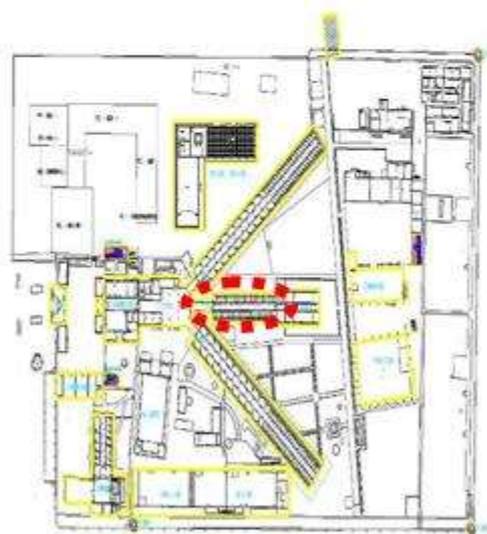

舍房壁體鑿修施作

仁舍



漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍

勇舍

※勇舍施作項目：

1. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
2. 外週鷹架組立。




舍房外週鷹架組立

勇舍



舍房外週鷹架組立

勇舍

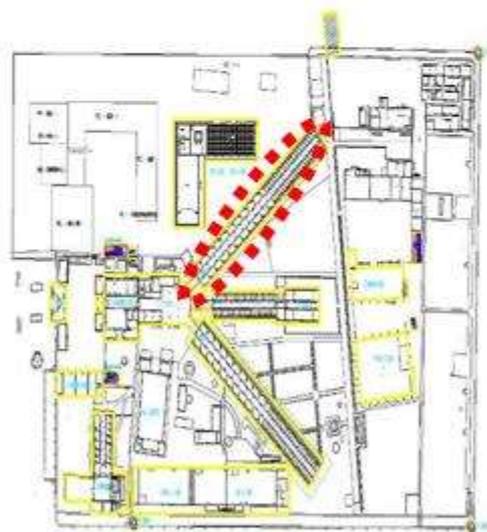

舍房白灰壁體粉刷層施作

勇舍



舍房壁體鑿修

勇舍

第一二工場

※第一二工場施作項目：  
1. 木構架拆卸仿作。




木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場

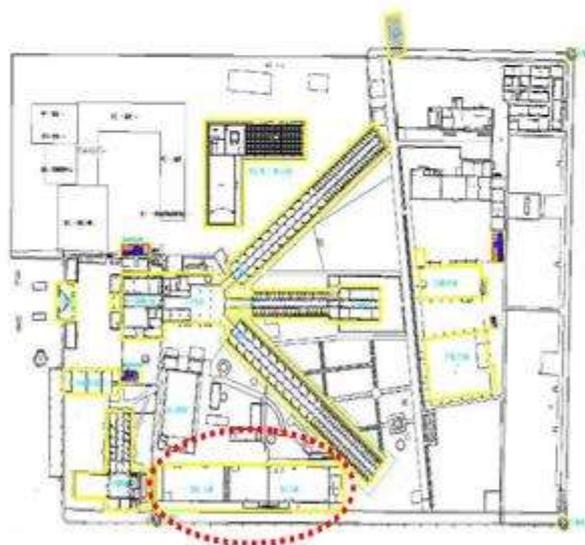

木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場

## 調查科辦公室

※調查科辦公室施作項目：

1. 屋瓦拆卸。
2. 屋面板拆除。




屋瓦拆卸施作

調查科辦公室



屋瓦拆卸施作

調查科辦公室

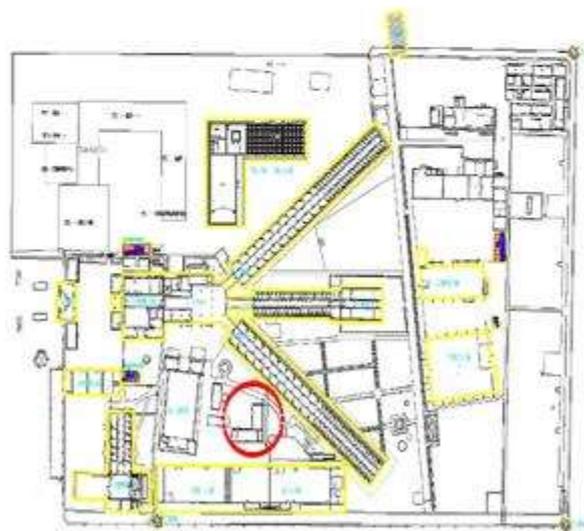

屋面板拆除

調查科辦公室



屋面板拆除

調查科辦公室

第四工場


※第四工場施作項目：

1. 屋架整修仿作。
2. 編竹夾泥牆施作。




屋架接合板整修仿作

第四工場

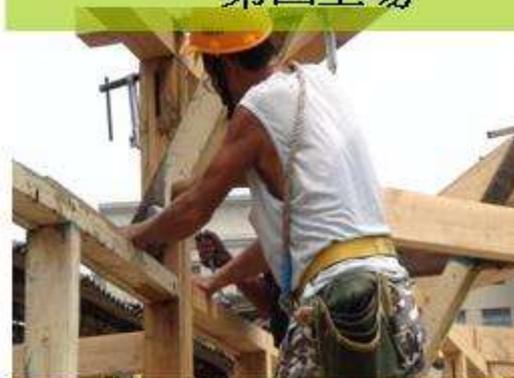

屋架整修仿作

第四工場

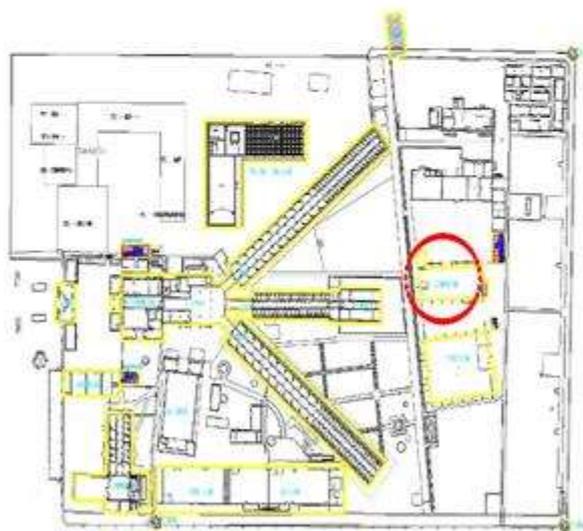

屋架整修仿作

第四工場



編竹夾泥牆施作

第四工場

## 看守所第一二工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 屋面板鋪設施作。
2. 屋面桁木椽條施作。




屋面板鋪設施作

看守所第一二工場



木構架拆卸整修仿作

看守所第一二工場

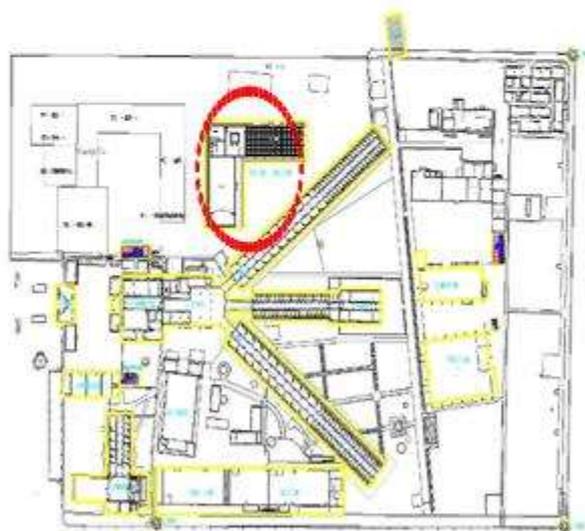

屋面桁木椽條施作

看守所第一二工場



屋面板整修仿作

看守所第一二工場

※檢疫所施作項目：

1. 鐵皮屋面拆卸。
2. 屋架桁木椽條整修仿作。



屋面拆除

檢疫所



桁木組立

檢疫所



椽條施作

檢疫所



椽條施作

檢疫所

