




國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



99.11.26工程進度簡報

預計進度33.51% 實際進度39.92% (至99/11/21止)

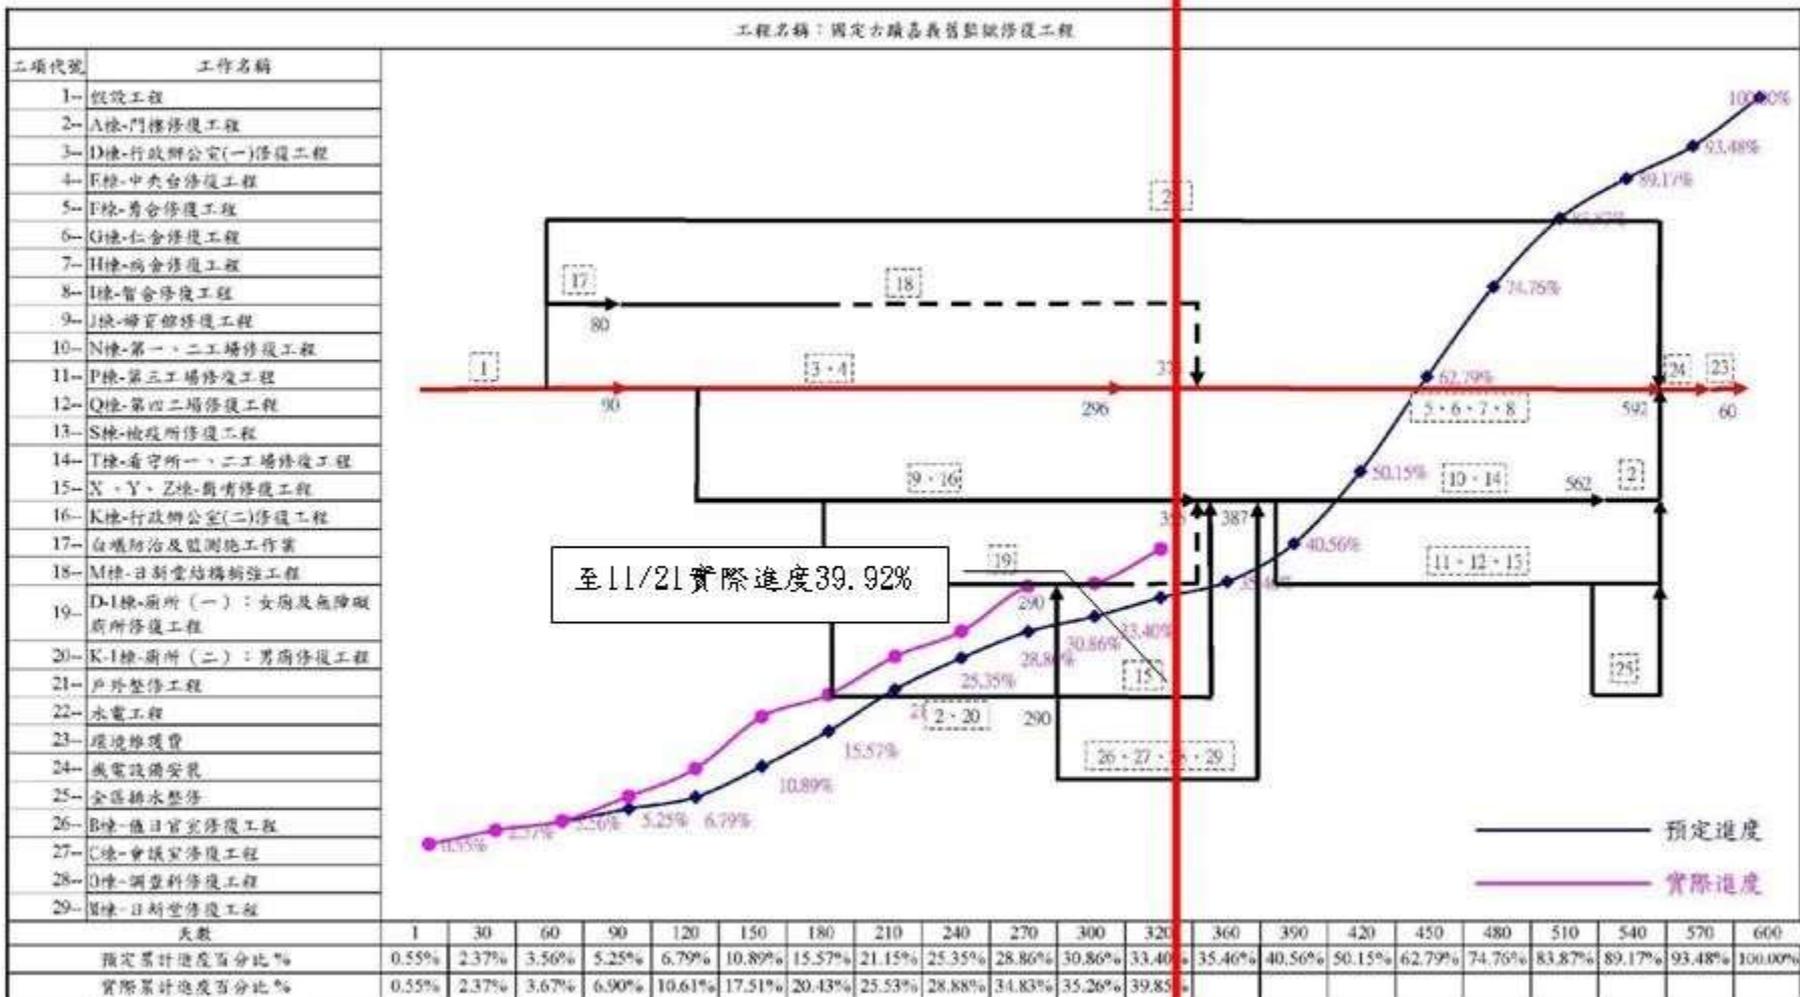

開工日期：98/12/18

備註：98/12/18-100/08/09 共600日曆天，不含相關免計工期。

目前進度


※門樓施作項目：

1. 門窗檢測。
2. 鷹架施作。
3. 舊有防水層剝除。
4. 門窗剝漆。
5. 粉刷層浮凸敲除。
6. 鋼筋防鏽處理。
7. 水電配管施作。
- 8. 門窗整修仿作。**
9. RA防水施作。



門板補土施作

門樓

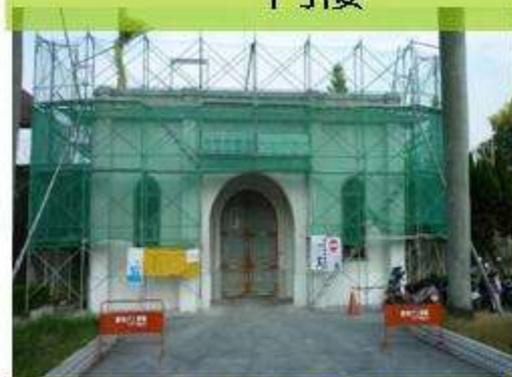

白灰壁體底土施作

門樓



門板漆面施作

門樓




門板補土施作

門樓

※值日官室及會議室

施作項目：

1. 屋架整修仿作。
2. 門窗剝漆、整修仿作。
3. 屋架桁木ACQ防蟲蟻藥劑灌注。
4. 牆面拆卸。
5. 編竹夾泥牆施作。
6. 雨淋板施作。
7. 屋面木襯板施作。

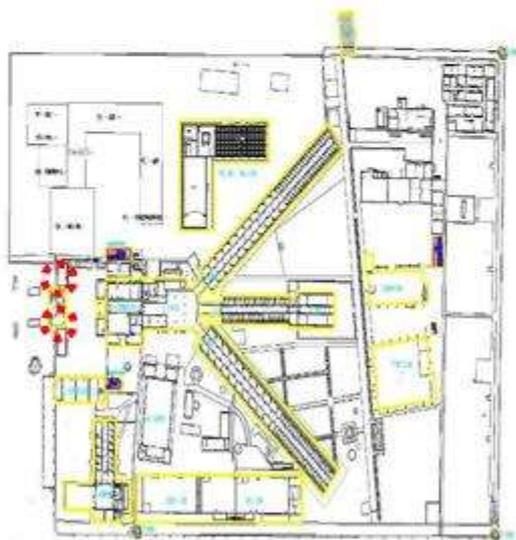

雨淋板施作

值日官室

值日官室及會議室



門窗整修仿作

值日官室



屋面木襯板施作

會議室




編竹夾泥牆施作

會議室

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 屋面構架及門窗檢測。
2. 原有門窗天花板拆除。
3. 水電管路施作。
4. 鷹架施作。
5. 兩淋板整修施作。
6. 屋面文化瓦施作。
7. 木構架拆卸整修、仿作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. RA防水層施作。
10. 兩庇施作。
11. 屋架護木油施作。
12. 屋面掛瓦條施作。
13. 附屬空間屋面施作。
14. 男廁牆面粉刷層施作。

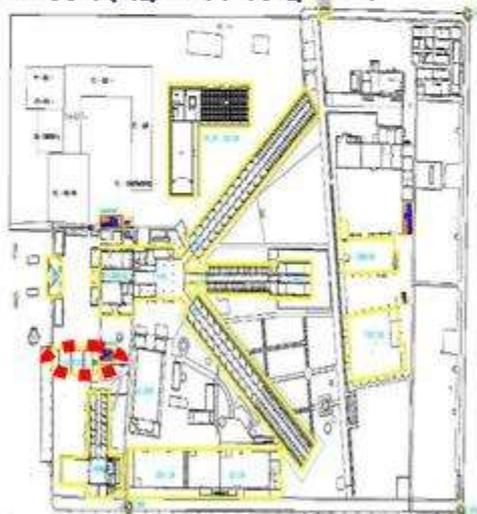

雨庇銅皮屋面施作

行政大樓(二)

行政大樓(二)



男廁牆面粉刷層施作

行政大樓(二)



雨庇油漆施作

行政大樓(二)



附屬空間屋面施作

行政大樓(二)

※行政辦公室(一)施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 屋面構架及門窗檢測。
3. 原有門窗拆除。
4. 天溝集水器安裝施作。
5. 塑膠地磚及地毯拆除。
6. 門窗整修及剝漆施作。
7. 防潮灌注施作。
8. 天花板油漆施作。
9. 地坪鑿修。
10. 電氣配管施作。
11. 屋面文化瓦施作。
12. 白灰壁面施作。
13. 雨淋板施作。



天溝集水器施作

行政大樓(一)



地坪鑿修施作

行政大樓(一)



門窗施作

行政大樓(一)



白灰壁面施作

行政大樓(一)

※女廁施作項目：

1. 屋面拆除。
2. 雨淋板施作。
3. 屋面板施作。
4. 編竹夾泥牆施作。
5. 水電管路施作。
6. 屋面水泥瓦施作。
7. 隔間地坪放樣施作。




編竹夾泥牆施作

女廁



水電管路施作

女廁

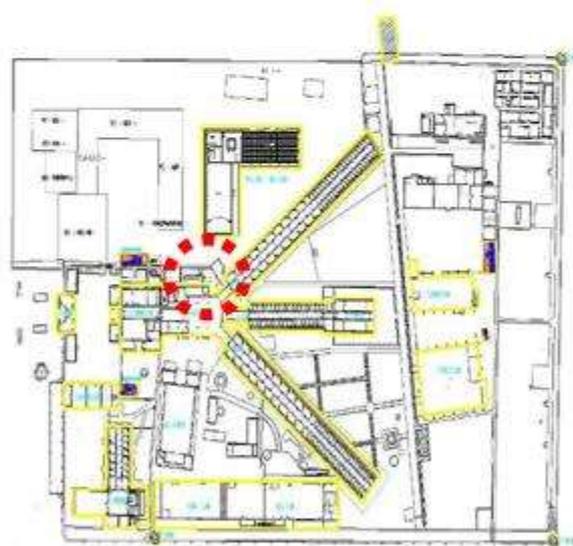

編竹夾泥牆施作

女廁



隔間地坪放樣施作

女廁

※婦育館施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 強化玻璃框架安裝施作。
3. 門窗整修施作。
4. 天花板及護木油施作。
5. 地坪鑿修施作。
6. 兩庇銅皮屋面施作。
7. 木構架拆卸仿作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. 力霸鋼架紅丹漆施作。
10. 防潮灌注施作。
11. 白灰壁體鑿修。
12. R.A防水層施作。
13. 電氣配管。
14. 銅製天溝安裝施作。



天溝集水器施作

婦育館



工場牆面護木油施作

婦育館




門窗整修施作

婦育館



工場天花板骨架施作

婦育館

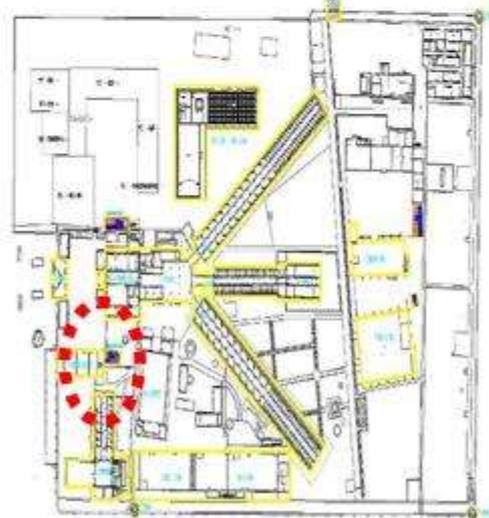


※日新堂施作項目：

1. 結構補強處油漆施作。
2. 地震災損圍牆緊急加固。
3. 環氧樹脂補強。
4. 無收縮水泥施作。
5. 鋼板放樣安裝組立。
6. 剪力牆鑿修施作。
7. 點焊鋼絲網施作。
8. 剪力牆及基礎板施作。
9. 屋面防水層及粉刷層施作。
10. 鐵窗拆卸施作。
11. 窗框剝漆施作。



剪力牆鋼筋施作

日新堂

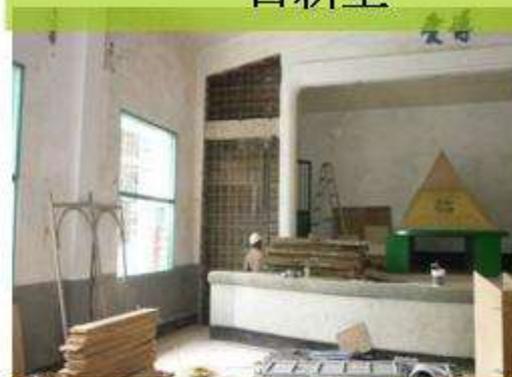

剪力牆模板施作

日新堂




窗框剝漆施作

日新堂



剪力牆模板施作

日新堂

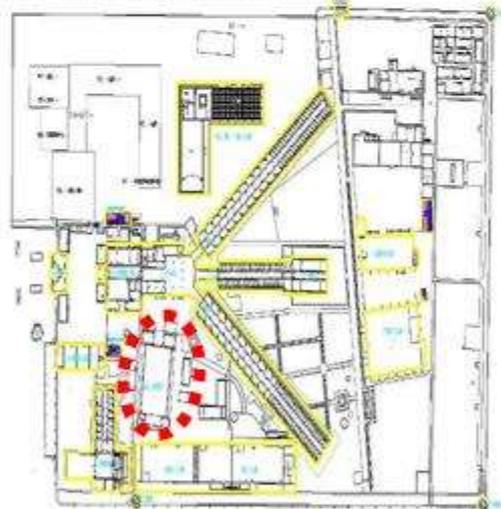


※中央台施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 門窗玻璃安裝。
3. 漆食壁面施作。
4. 天花板新作及護木油塗刷。
5. 鷹架施作。
6. 木構架拆卸仿作假安裝。
7. 門窗整修施作。
8. 天溝集水器施作。
9. 看守所通道打通。
10. 屋面板安裝施作。
11. 水電管路施作。
12. 屋面水泥瓦鋪設。



門窗整修施作

中央台

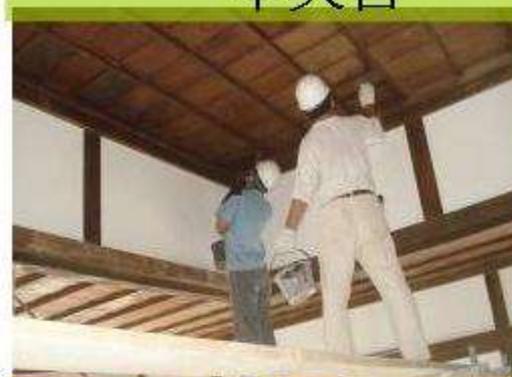

天花板護木油施作

中央台




門窗玻璃安裝施作

中央台




天溝集水器施作

中央台

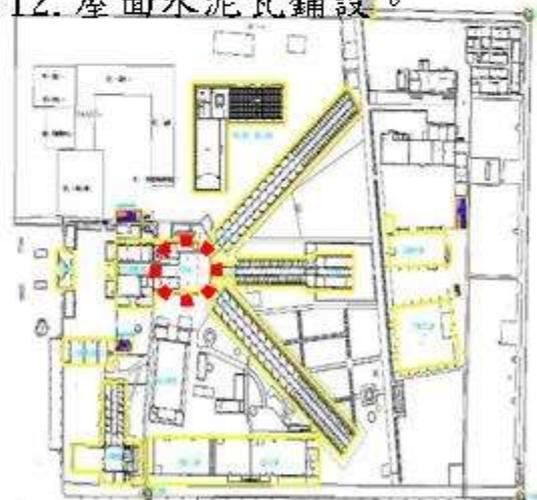

※智舍施作項目：

1. 部份屋面屋瓦拆除及防水層試水。
2. 屋面構架及門窗檢測。
3. 原有舍房房門拆除。
4. 鷹架施作。
5. 舍房鐵門紅丹漆施作。
6. 舍房地坪木地板拆除。
7. 舍房牆面防潮施作。
8. 外牆物理噴塗。
9. 舍房天花板剝漆施作。
10. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。

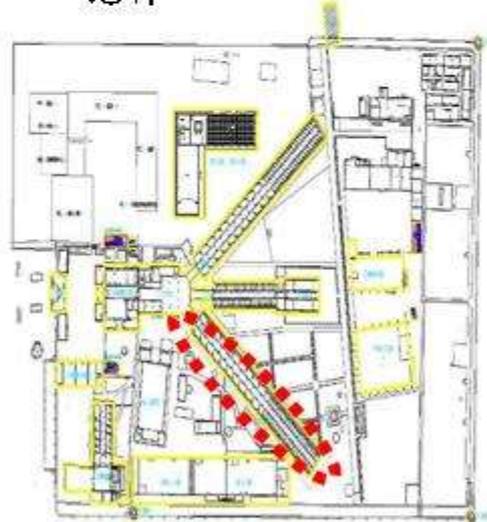

舍房天花板剝漆施作

智舍



舍房天花板剝漆施作

智舍



舍房白灰壁體粉刷層施作

智舍




舍房白灰壁體粉刷層施作

智舍

※仁舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆除。
2. 鷹架施作。
3. 舍房鐵門紅丹漆施作。
4. 舍房地坪木地板拆除。
5. 舍房牆面防潮施作。
6. 舍房門窗剝漆施作。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。

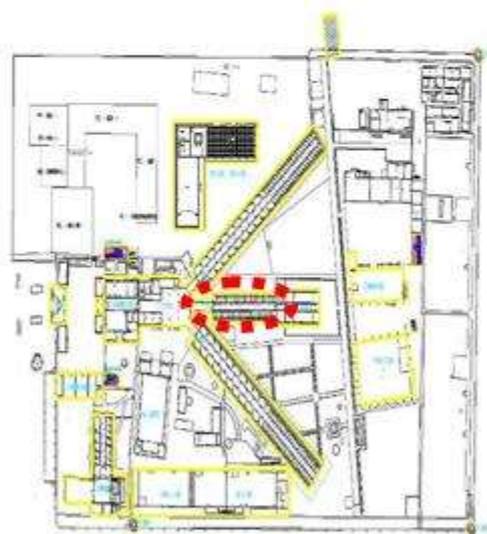

舍房壁體鑿修施作

仁舍



漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍



舍房壁體鑿修施作

仁舍




漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍

※勇舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆卸。
2. 舍房鐵門紅丹漆施作。
3. 舍房地坪木地板拆除。
4. 舍房牆面防潮施作。
5. 舍房門窗剝漆施作。
6. 外牆面物理噴塗。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
8. 外週鷹架組立。

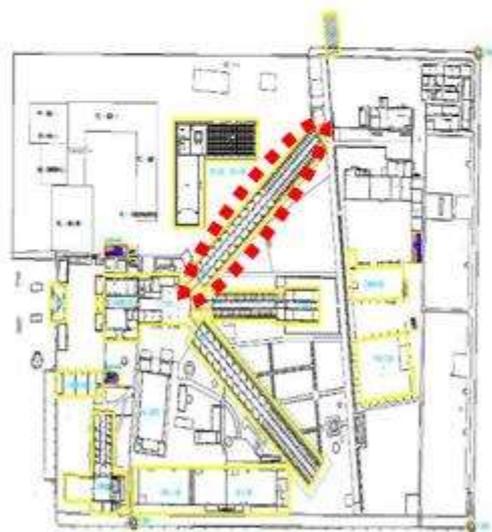

舍房外週鷹架組立

勇舍



舍房外週鷹架組立

勇舍



舍房白灰壁體粉刷層施作

勇舍




舍房壁體鑿修

勇舍

勇舍

※第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除。
2. 屋面構架及門窗檢測原有門窗拆卸。
3. 牆面物理噴塗。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 拆卸之木料整理。
8. 門窗剝漆施作。
9. 木構架拆卸仿作。
10. 舊有管線拆除。
11. 編竹夾泥牆浮凸拆除。

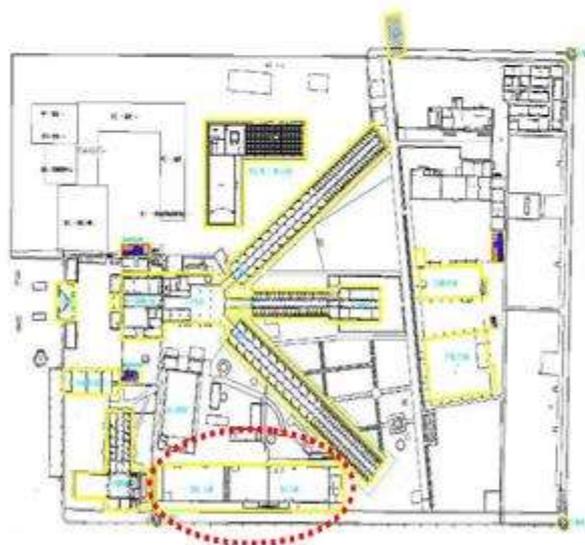

木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場

調查科辦公室

※調查科辦公室施作項目：

1. 屋瓦拆卸。
2. 屋面板拆除。
3. 窗框剝漆施作。




屋面防水層施作

調查科辦公室



屋面掛瓦椽施作

調查科辦公室

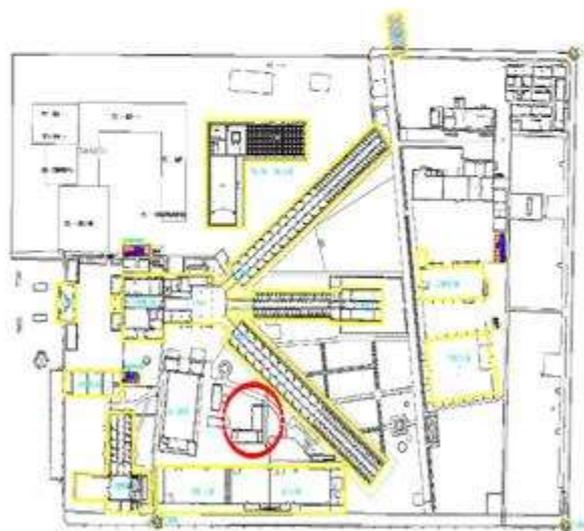

窗框剝漆施作

調查科辦公室



屋面板施作

調查科辦公室

※第三工場施作項目：


1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 舊有管線拆除。



門窗剝漆施作


第三工場

第三工場

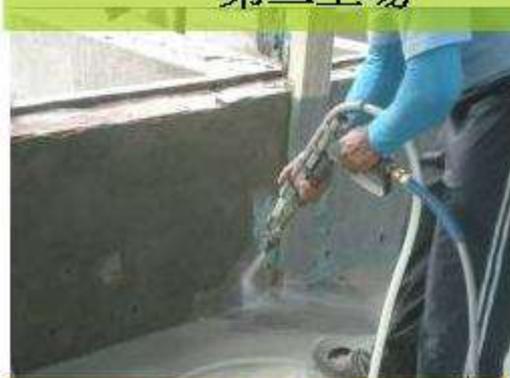

外牆物理噴塗

第三工場

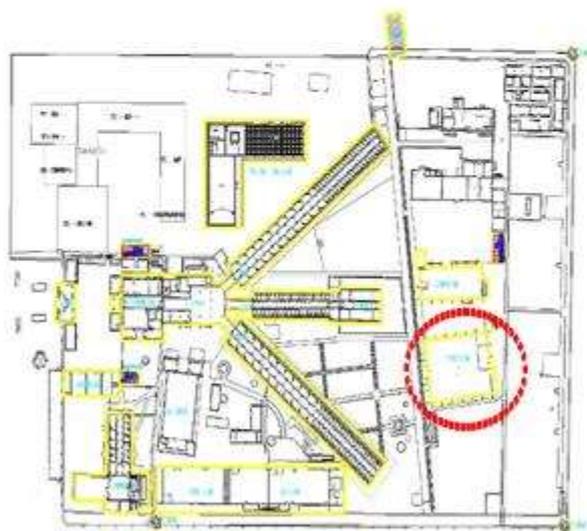

門窗剝漆施作

第三工場




外牆物理噴塗

第三工場


※第四工場施作項目：

1. 舊有管線拆除。
2. 門窗剝漆施作。
3. 屋面瓦拆卸整理。
4. 木襯板拆卸整理。
5. 結構臨時鋼管支撐。
6. 屋架整修仿作。
7. 編竹夾泥牆施作。
8. 屋面板整修仿作。
9. 窗框剝漆施作。

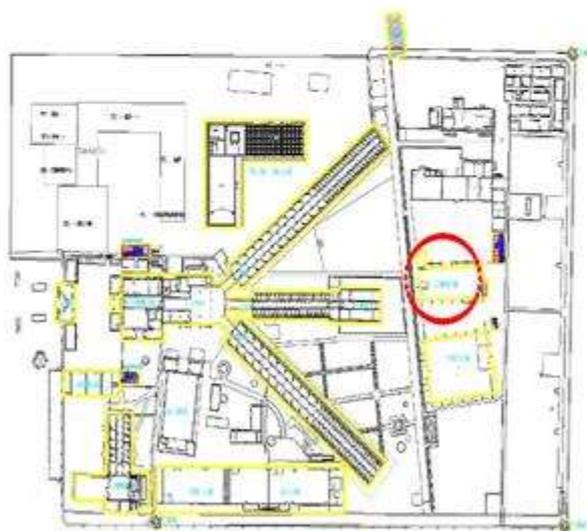

屋面板整修仿作

第四工場

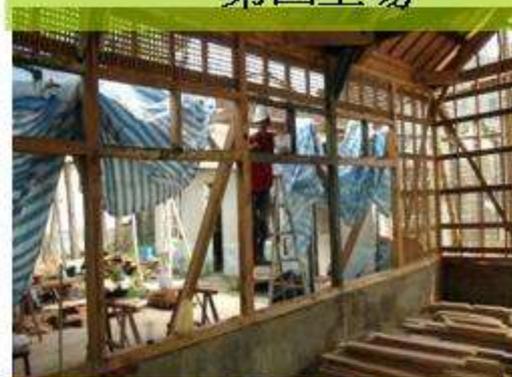

窗框剝漆施作

第四工場



屋面板整修仿作

第四工場




編竹夾泥牆施作

第四工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除。
2. 屋面構架及門窗檢測剝漆施作。
3. 原有門窗拆除。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 拆卸之木料整理。
8. 屋面板鋪設施作。
9. 木構架拆卸整修、仿作。
10. 牆面粉刷層修補施作。
11. 屋面桁木椽條施作。
12. 屋面鋼棚架拆卸。

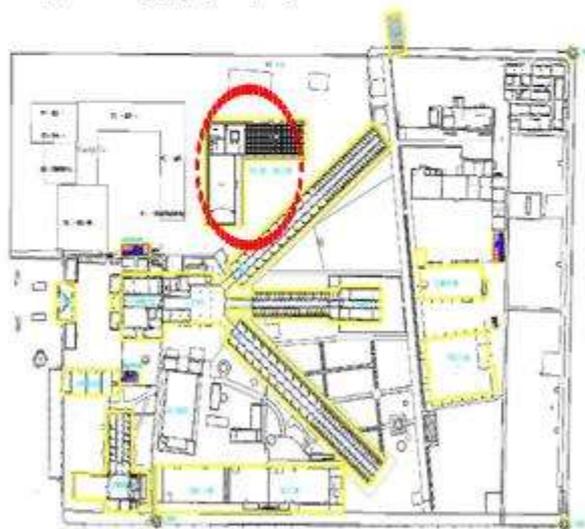

屋面水泥瓦鋪設施作

看守所第一二工場

看守所第一二工場



雨庇鋪設新作

看守所第一二工場



鋼棚架拆卸施作

看守所第一二工場



屋面板護木油施作

看守所第一二工場

※檢疫所施作項目：

1. 鐵皮屋面拆卸。
2. 屋架桁木椽條整修仿作。
3. 屋面木襯板鋪設。
4. 屋面防水層施作。
5. 屋面掛瓦條施作。



屋面防水層鋪設

檢疫所



屋面掛瓦條施作

檢疫所



椽條施作

檢疫所



屋面木襯板填縫施作

檢疫所

