


預計進度12.76%實際進度11.41% (至9/15止)

國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程預定進度甘特圖

工程金額：新台幣23,230,000元整(含稅)

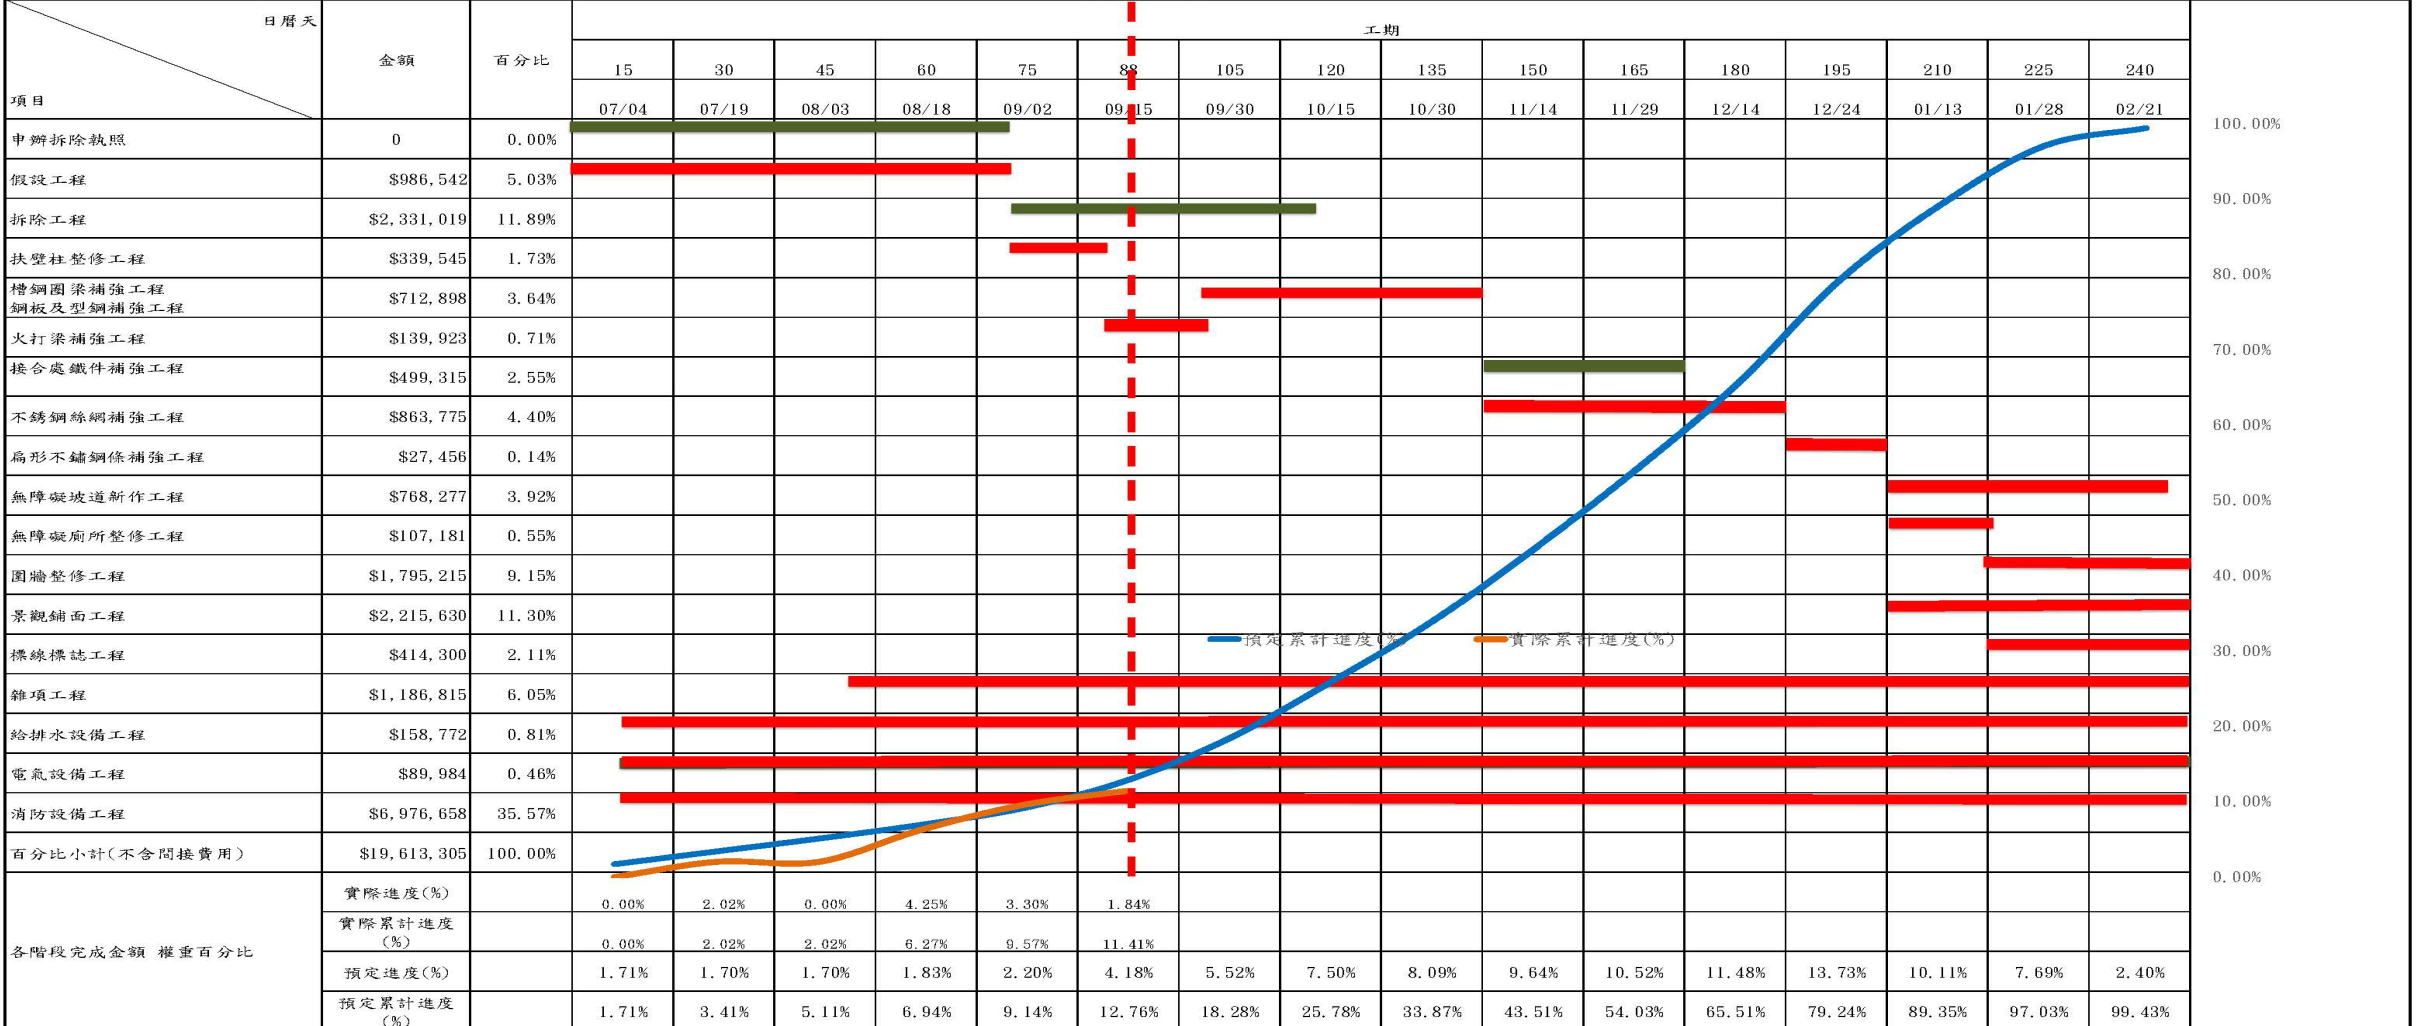

- 拆除工程



拆除前放樣

拆除工程



有價料及廢料

拆除工程

拆除工程



拆除前放樣


拆除工程



炊場木框拆除

拆除工程

- 消防設備進場自主檢查
- 型鋼及鋼板進場自主檢查
- 型鋼及鋼板鍍鋅膜厚自主檢查

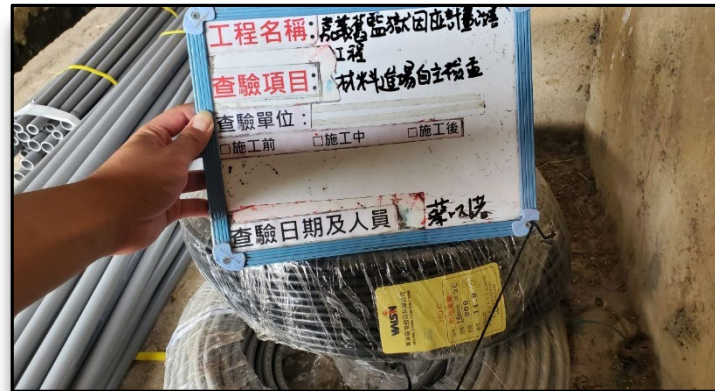


消防設備進場

材料進場



消防設備進場

材料進場

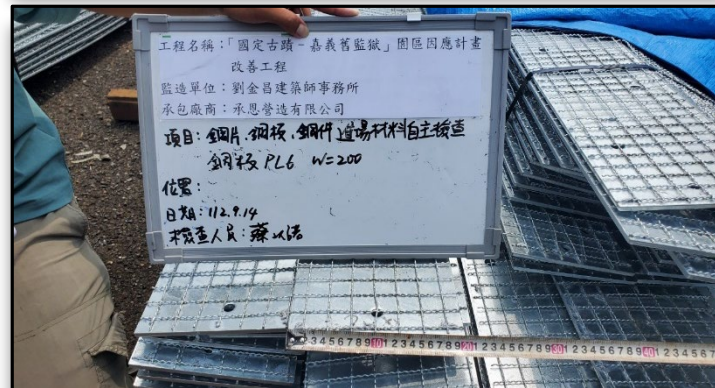

型鋼及鋼板進場

材料進場



型鋼及鋼板進場

材料進場

- 圍牆G粉刷層切割打除
- 圍牆G鋼板補強假固定



切割打除

圍牆G



鋼板補強假固定

圍牆G

圍牆G



切割打除

圍牆G



鋼板補強假固定

圍牆G

- 第三工場消防設備配管配線
- 第四工場消防設備配管配線



消防設備配管配線

第三工場



消防設備配管配線

第四工場

第三、四工場



消防設備配管配線

第三工場



消防設備配管配線


第四工場

- 消防管溝開挖



消防管溝開挖

工區

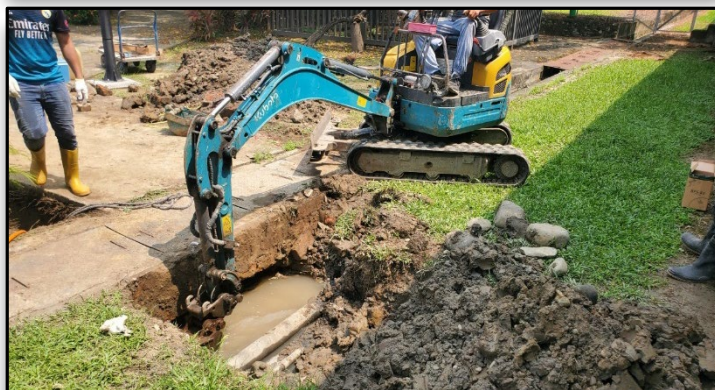

消防管溝開挖

工區

消防管溝開挖



消防管溝開挖

工區



消防管溝開挖

工區

拆除工程嘉義市政府於112年9月1日同意備查

- 改善對策
- 於112年9月4日進場施作，增加人員趕工中

由於112年9月1日至112年9月10日連續大雨，土壤飽含水分，導致消防管溝開挖無法施作

- 改善對策
- 天晴土壤含水量降低後，增加人員機具趕工
