




國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



99.12.28工程進度簡報

預計進度36.04% 實際進度43.71% (至99/12/20止)

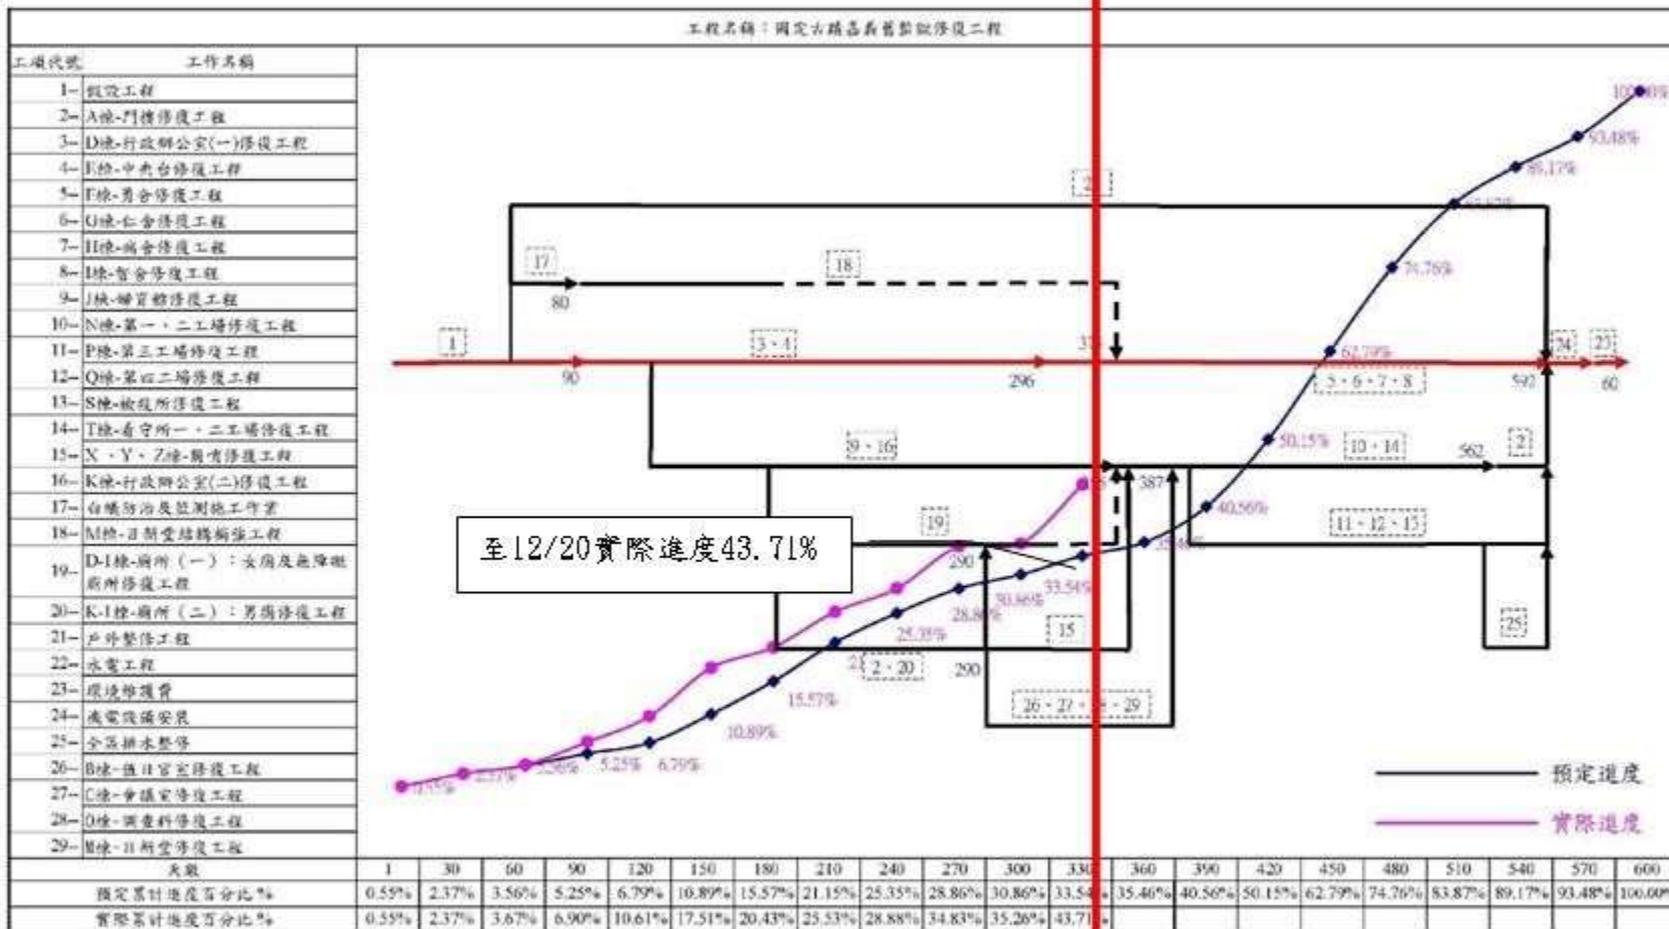

目前進度

※門樓施作項目：

1. 門窗檢測。
2. 鷹架施作。
3. 舊有防水層剝除。
4. 門窗剝漆。
5. 白灰壁體面層施作。
6. 鋼筋防鏽處理。
7. 水電配管施作。
8. 門窗整修仿作。
9. RA防水施作。



門窗整修仿作

門樓



白灰壁體面層施作

門樓



白灰壁體面層施作

門樓




白灰壁體面層施作

門樓

※值日官室及會議室施作項目：

1. 屋架整修仿作。
2. 門窗剝漆、整修仿作。
3. 屋架桁木ACQ防蟲蟻藥劑灌注。
4. 牆面拆卸。
5. 編竹夾泥牆施作。
6. 雨淋板施作。
7. 屋面木襯板施作。
8. 屋面水泥瓦鋪設。
9. 雨淋板及屋架護木油施作。
10. 水電管路施作。

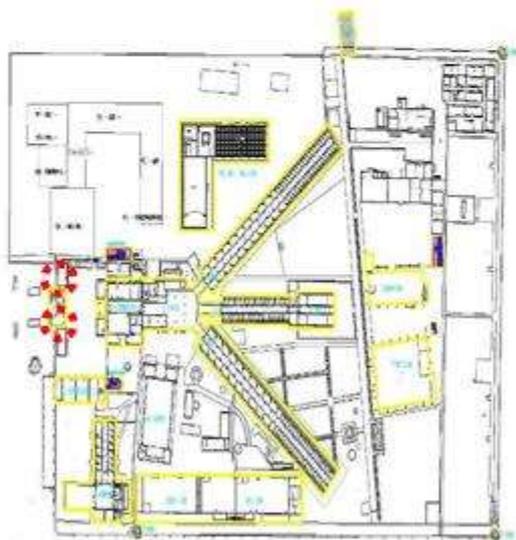

外牆油漆施作

值日官室

值日官室及會議室



屋架護木油施作

值日官室



水電管路施作

會議室




屋面水泥瓦鋪設施作

會議室

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 屋面構架及門窗檢測。
2. 原有門窗天花板拆除。
3. 水電管路施作。
4. 鷹架施作。
5. 兩淋板整修施作。
6. 屋面文化瓦施作。
7. 木構架拆卸整修、仿作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. RA防水層施作。
10. 兩庇施作。
11. 屋架護木油施作。
12. 屋面掛瓦條施作。
13. 地坪粉刷層施作。
14. 男廁隔間磚牆及衛浴設備安裝施作。

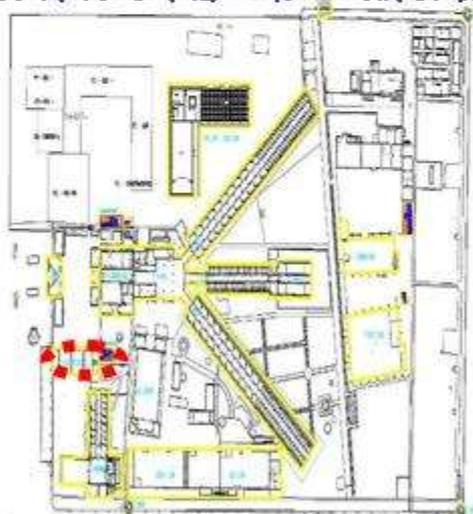

地坪粉刷層施作

行政大樓(二)

行政大樓(二)



男廁隔間磚牆施作

行政大樓(二)



地坪粉刷層施作

行政大樓(二)



男廁衛浴設備安裝施作

行政大樓(二)

※行政辦公室(一)施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 屋面構架及門窗檢測。
3. 門窗及玻璃安裝施作。
4. 天溝集水器安裝施作。
5. 鋼棚架拆卸施作。
6. 女廁無障礙空間磚牆施作。
7. 防潮灌注施作。
8. 天花板油漆施作。
9. 地坪水泥粉光。
10. 電氣配管施作。
11. 屋面文化瓦施作。
12. 白灰壁面施作。
13. 雨淋板施作。



女廁磚牆施作

行政大樓(一)

行政大樓(一)



地坪水泥粉光施作

行政大樓(一)



門窗玻璃安裝施作

行政大樓(一)



鋼棚架拆卸施作

行政大樓(一)

※女廁施作項目：

1. 屋面拆除。
2. 雨淋板施作。
3. 屋面板施作。
4. 編竹夾泥牆施作。
5. 水電管路施作。
6. 屋面水泥瓦施作。
7. 隔間地坪放樣施作。




化糞池安裝埋設施作

女廁



水電管路施作

女廁

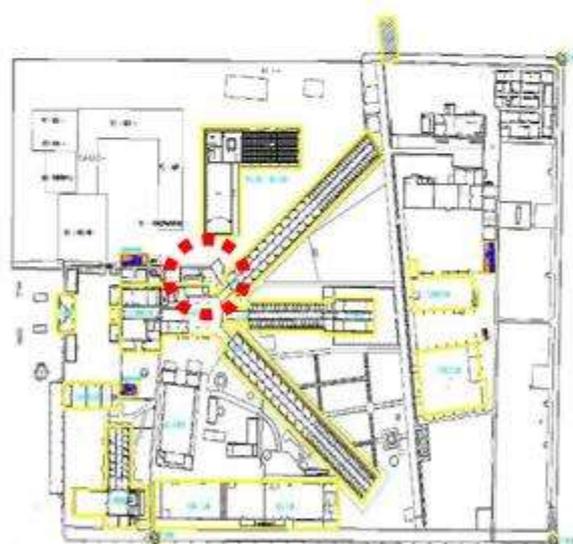

隔間磚牆砌磚施作

女廁



無障礙廁所牆面施作

女廁

※婦育館施作項目：


1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 強化玻璃框架安裝施作。
3. 門窗整修施作。
4. 天花板安裝及護木油塗刷施作。
5. 木地板整修仿作。
6. 兩庇銅皮屋面施作。
7. 木構架拆卸仿作。
8. 編竹夾泥牆施作。
9. 力霸鋼架紅丹漆施作。
10. 防潮灌注施作。
11. 白灰壁體鑿修。
12. R.A防水層施作。
13. 電氣配管。
14. 銅製天溝安裝施作。



門窗整修仿作

婦育館

婦育館

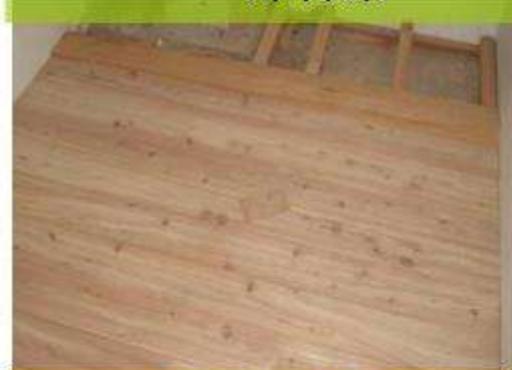

木地板鋪設施作

婦育館




天花板施作

婦育館



工場天花板骨架施作

婦育館

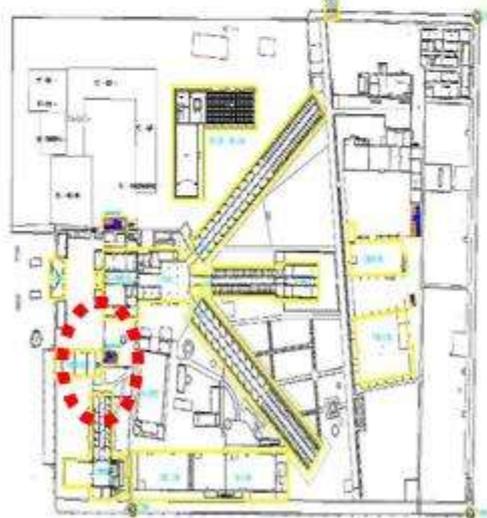

※日新堂施作項目：

1. 結構補強處油漆施作。
2. 地震災損圍牆緊急加固。
3. 環氧樹脂補強。
4. 無收縮水泥施作。
5. 鋼板放樣安裝組立。
6. 剪力牆鑿修施作。
7. 點焊鋼絲網施作。
8. 剪力牆及基礎板施作。
9. 屋面防水層及粉刷層施作。
10. 門窗護木油施作。
11. 牆面及鐵窗油漆施作。
12. 空調設備及音響設備進場施作



門窗護木油施作

日新堂



室內油漆施作

日新堂




鐵窗去漆施作

日新堂



空調設備進場施作

日新堂

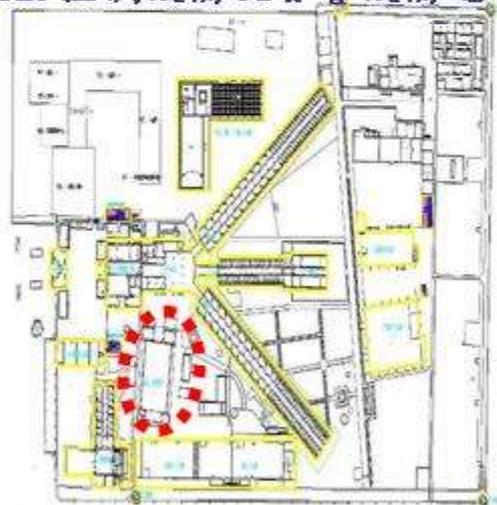


※中央台施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條施作。
2. 門窗整修及玻璃安裝施作。
3. 漆食壁面施作。
4. 天花板新作及護木油塗刷。
5. 鷹架施作。
6. 木構架拆卸仿作假安裝。
7. 職員休息室屋架整修仿作。
8. 天溝集水器施作。
9. 看守所通道打通。
10. 屋面板安裝施作。
11. 水電管路施作。
12. 屋面水泥瓦鋪設。



門窗整修施作

中央台

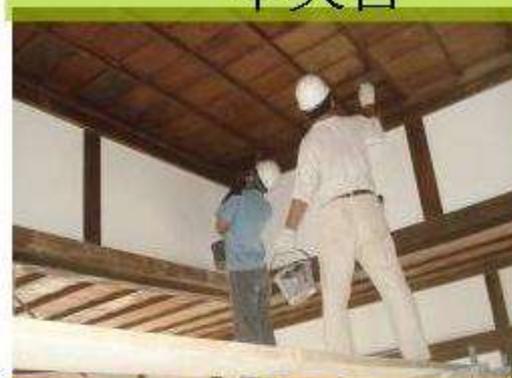

天花板護木油施作

中央台




門窗玻璃安裝施作

中央台




職員休息室屋架整修仿作

中央台

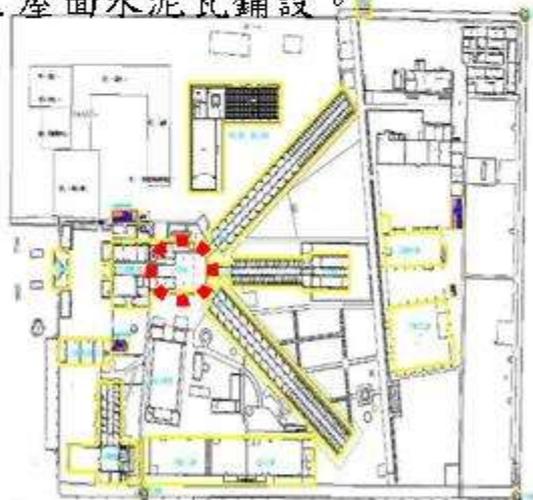

※智舍施作項目：

1. 部份屋面屋瓦拆除及防水層試水。
2. 屋面構架及門窗檢測。
3. 原有舍房房門拆除。
4. 鷹架施作。
5. 舍房鐵門紅丹漆施作。
6. 舍房地坪木地板拆除。
7. 舍房牆面防潮施作。
8. 外牆物理噴塗。
9. 舍房天花板剝漆施作。
10. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。

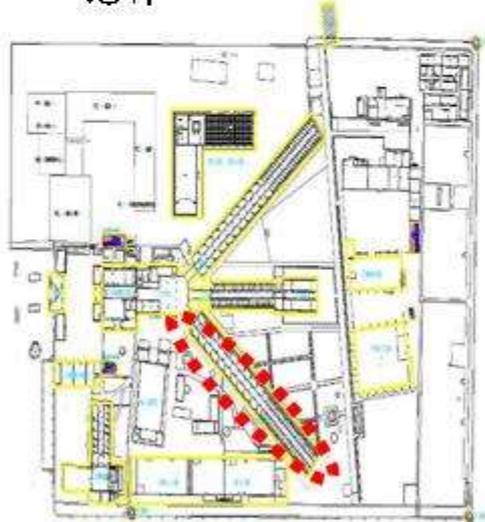

舍房天花板剝漆施作

智舍



舍房天花板剝漆施作

智舍



舍房白灰壁體粉刷層施作

智舍




舍房白灰壁體粉刷層施作

智舍

※仁舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆除。
2. 鷹架施作。
3. 舍房鐵門紅丹漆施作。
4. 舍房地坪木地板拆除。
5. 舍房牆面防潮施作。
6. 舍房門窗剝漆施作。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。

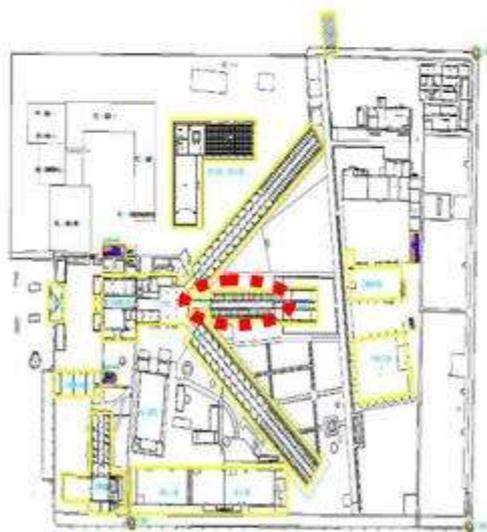

舍房壁體鑿修施作

仁舍



漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍



舍房壁體鑿修施作

仁舍



漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍

※病舍施作項目：

1. 原有屋架拆除整修仿作。




屋架整修仿作

病舍



屋架整修仿作

病舍

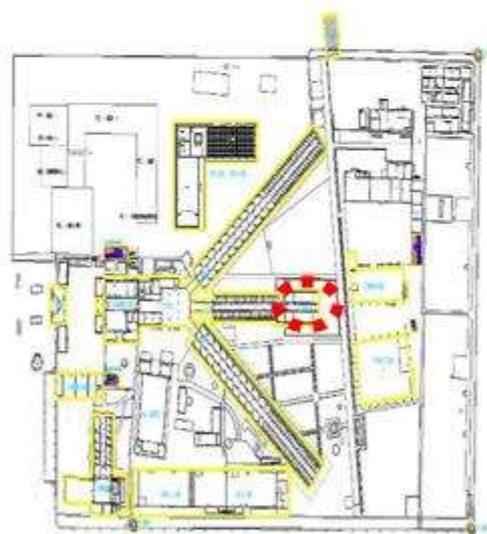

屋架整修仿作

病舍




屋架整修仿作

病舍

※勇舍施作項目：

1. 原有舍房房門拆卸。
2. 舍房鐵門紅丹漆施作。
3. 舍房地坪木地板拆除。
4. 舍房牆面防潮施作。
5. 舍房門窗剝漆施作。
6. 外牆面物理噴塗。
7. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。
8. 外週鷹架組立。

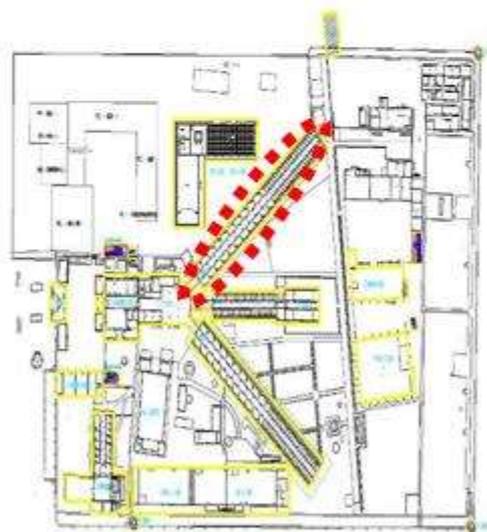

天花板剝漆施作

勇舍



舍房外週鷹架組立

勇舍



舍房白灰壁體粉刷層施作

勇舍




舍房壁體鑿修

勇舍

勇舍

※第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除。
2. 屋面構架及門窗檢測原有門窗拆卸。
3. 牆面物理噴塗。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 拆卸之木料整理。
8. 門窗剝漆施作。
9. 木構架拆卸仿作。
10. 舊有管線拆除。
11. 編竹夾泥牆浮凸拆除。

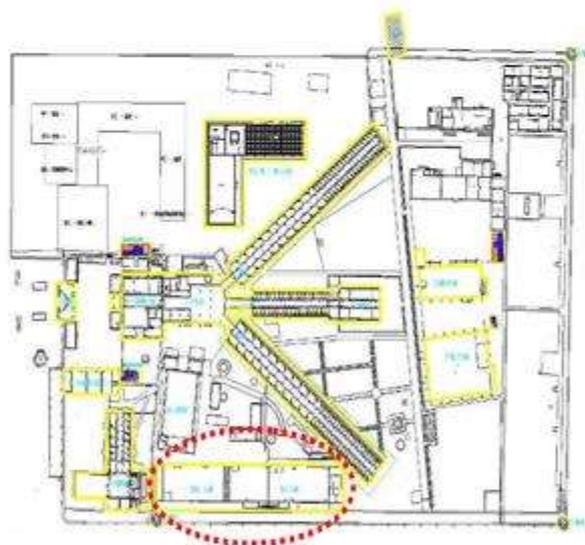

木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場

※調查科辦公室施作項目：

1. 屋瓦拆卸。
2. 屋面板拆除。
3. 窗框護木油施作。
4. 水泥屋瓦鋪設施作。
5. 室內燈具安裝施作。
6. 屋架拆卸整修仿作。
7. 牆面洗石子修補施作。



水泥屋瓦鋪設施作


調查科辦公室

調查科辦公室



室內燈具安裝施作

調查科辦公室

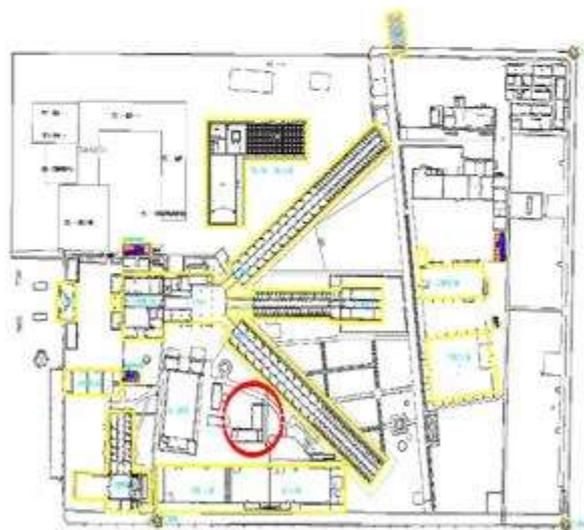

窗框剝漆施作

調查科辦公室



牆面洗石子施作

調查科辦公室

※第三工場施作項目：


1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 舊有管線拆除。



門窗剝漆施作


第三工場

第三工場

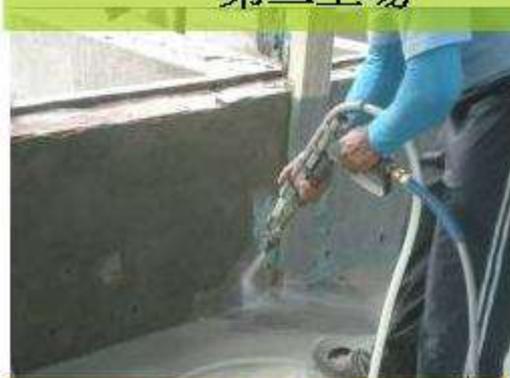

外牆物理噴塗

第三工場

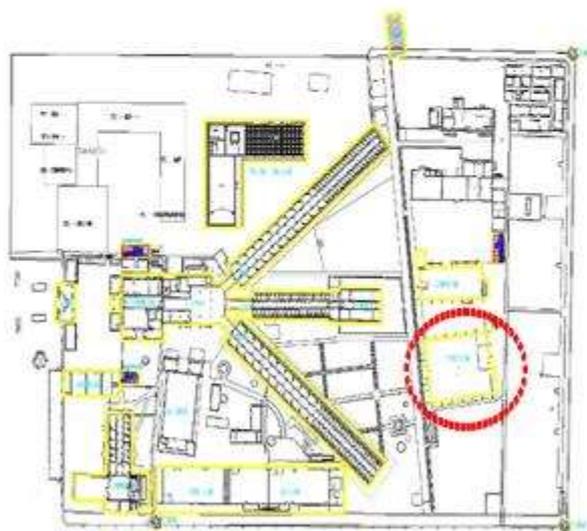

門窗剝漆施作

第三工場



外牆物理噴塗

第三工場


※第四工場施作項目：

1. 舊有管線拆除。
2. 門窗剝漆施作。
3. 屋面瓦拆卸整理。
4. 木襯板拆卸整理。
5. 結構臨時鋼管支撐。
6. 屋架整修仿作。
7. 編竹夾泥牆施作。
8. 屋面板整修仿作。
9. 窗框剝漆施作。




屋面板整修仿作

第四工場

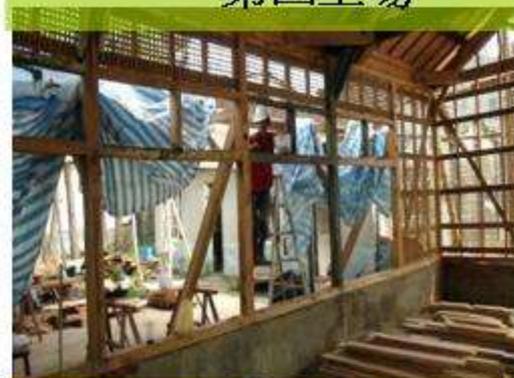

窗框剝漆施作

第四工場

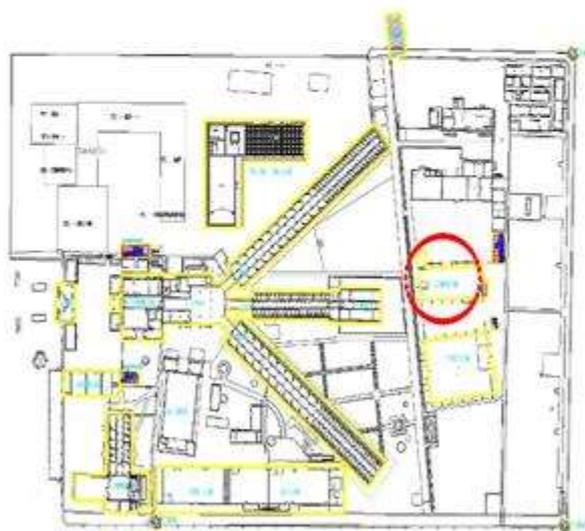

屋面板整修仿作

第四工場




編竹夾泥牆施作

第四工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除。
2. 屋面板及雨庇護木油施作。
3. 原有門窗拆除。
4. 鐵絲網拆除。
5. 鷹架施作。
6. 防潮灌注施作。
7. 拆卸之木料整理。
8. 屋面板鋪設施作。
9. 木構架拆卸整修、仿作。
10. 牆面粉刷層修補施作。
11. 屋面桁木椽條施作。
12. 屋面鋼棚架拆卸施作。

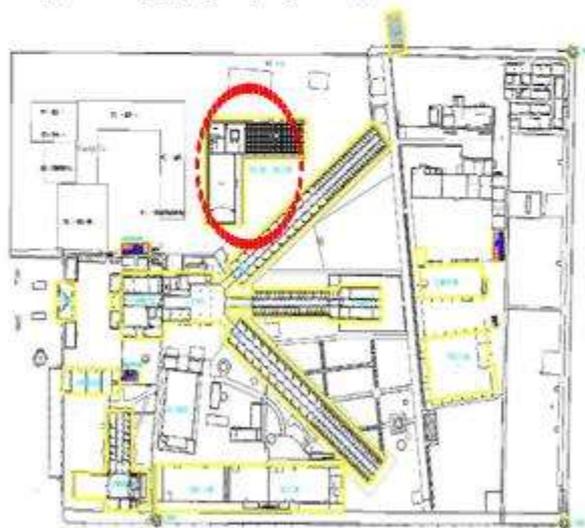

屋面水泥瓦鋪設施作

看守所第一二工場



雨庇鋪設新作

看守所第一二工場



雨庇護木油施作

看守所第一二工場



屋面板護木油施作

看守所第一二工場

※檢疫所施作項目：

1. 鐵皮屋面拆卸。
2. 屋架桁木椽條整修仿作。
3. 屋面木襯板鋪設。
4. 屋面防水層施作。
5. 屋面掛瓦條施作。
6. 屋面水泥瓦鋪設施作。



屋面防水層鋪設

檢疫所



屋面掛瓦條施作

檢疫所



椽條施作

檢疫所



屋面水泥瓦鋪設施作

檢疫所

