



國定古蹟嘉義舊監獄修復工程




99.3.18工程進度簡報

工區配置圖

物料進出口



人員出入口

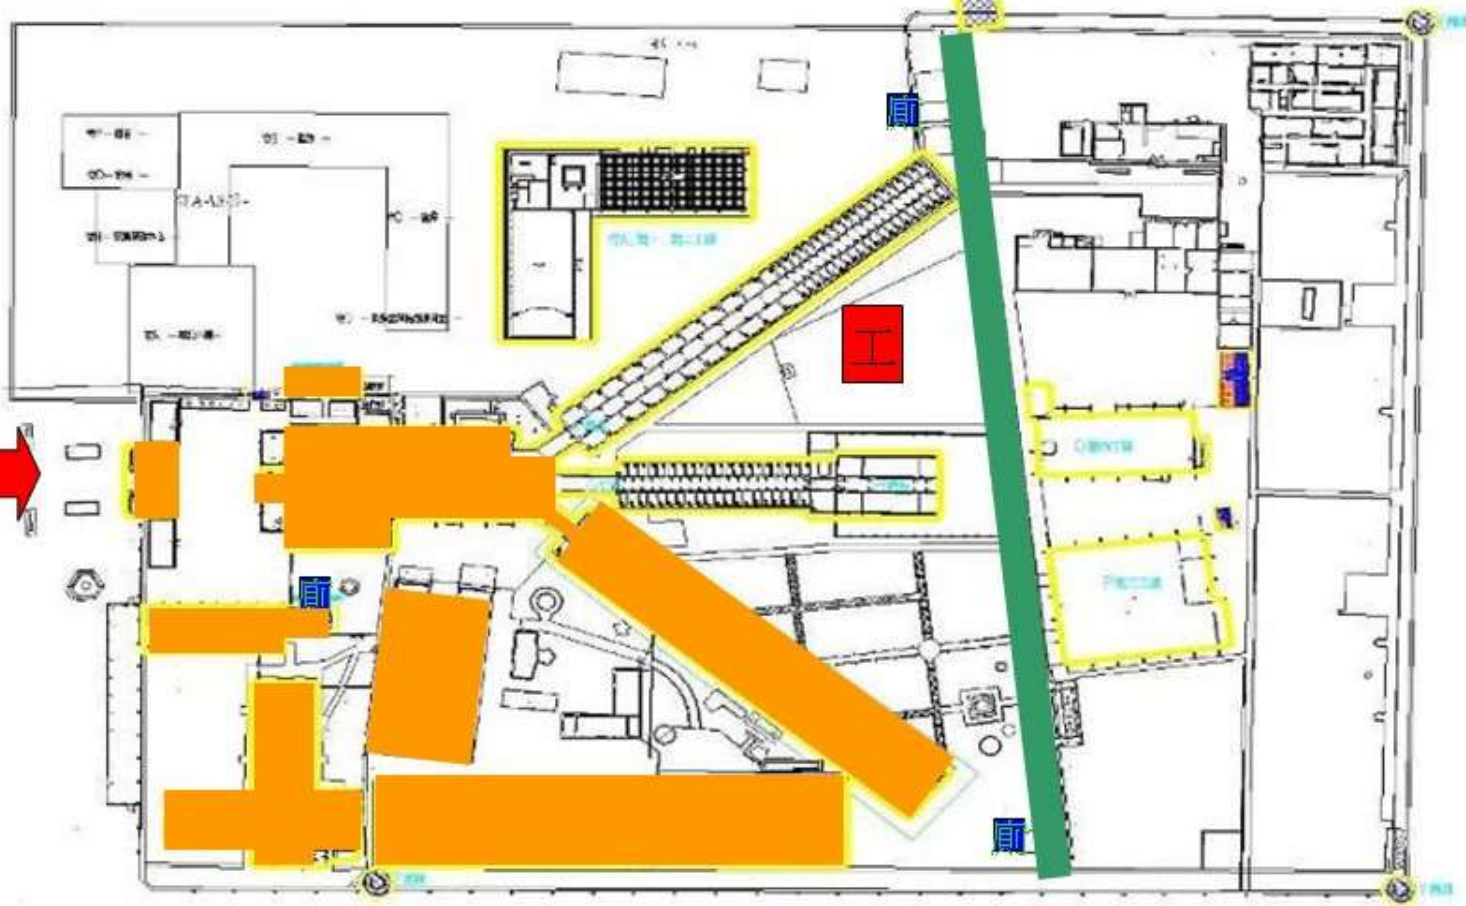

依契約規定99年年底應完工之施作範圍



工作進度報告

2019年12月19日

目前進度

※第一二工場施作項目：

- 1.屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、橡木及桁條拆除。
- 2.屋面構架及門窗檢測。
- 3.原有門窗拆除。
- 4.鐵絲網拆除。
- 5.鷹架施作。




修復中

第一二工場



修復現況

第一二工場

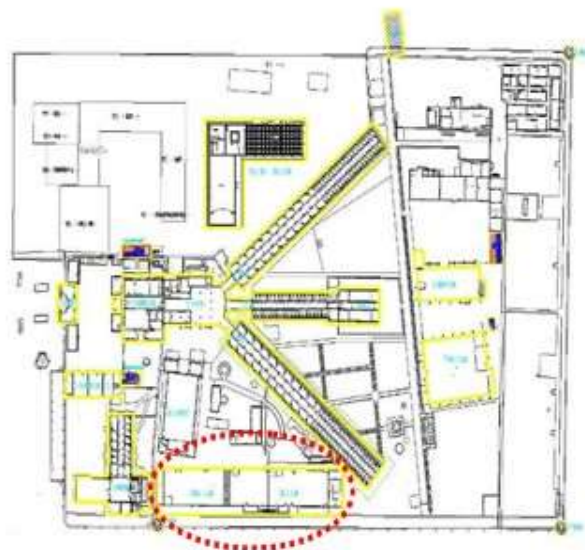

鐵窗拆除

第一二工場



文物

第一二工場

※中央台施作項目：

- 1.屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除。
- 2.屋面構架及門窗檢測。
- 3.原有門窗拆除。
- 4.天花板拆除。
- 5.鷹架施作。




屋架構件材料尺寸標註

中央台



臺灣總督府營林局之屋架標註

中央台

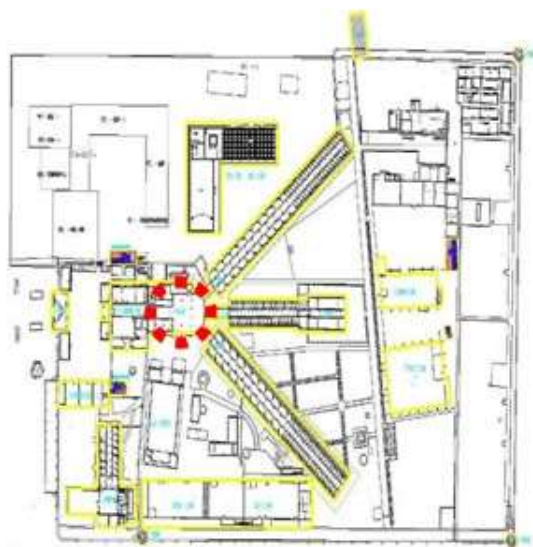

水泥瓦材料品牌標註

中央台




屋架拆除現況

中央台

※行政辦公室(一)施作項目：

- 1.屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、橡木及桁條拆除。
- 2.屋面構架及門窗檢測。
- 3.原有門窗拆除。
- 4.天花板拆除。
- 5.塑膠地磚及地毯拆除。
- 6.鷹架施作。

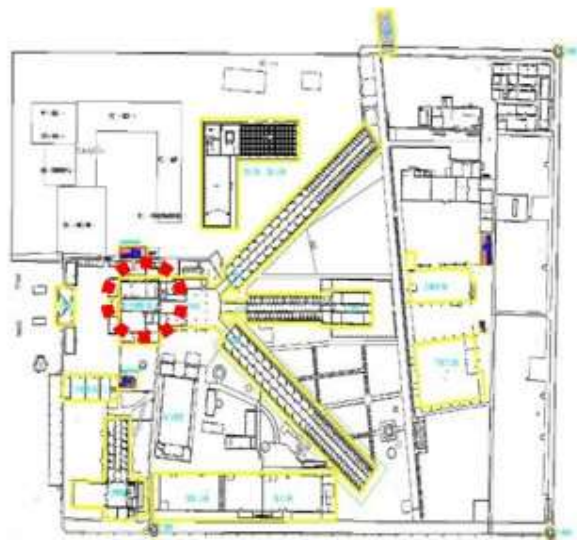

屋瓦拆除後防水層拆除中

行政大樓(一)

行政大樓(一)



屋面板拆除後之現況

行政大樓(一)



屋面板拆除後橡條拆除中

行政大樓(一)



地毯及塑膠地板拆除後之現況

行政大樓(一)

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 屋面構架及門窗檢測。
2. 原有門窗拆除。
3. 天花板拆除。
4. 鷹架施作。




屋瓦拆除前

行政大樓(二)



鷹架施作

行政大樓(二)

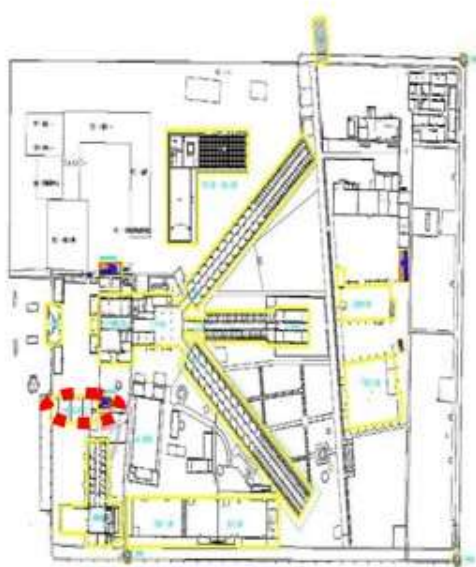

天花板拆除後之現況

行政大樓(二)



牆面檢測

行政大樓(二)

※智舍施作項目：

- 1.部份屋面屋瓦拆除及防水層試水。
- 2.屋面構架及門窗檢測。
- 3.原有舍房房門拆除。
- 4.鷹架施作。



防水層試水


智舍

智舍



舍房門窗拆除之現況

智舍

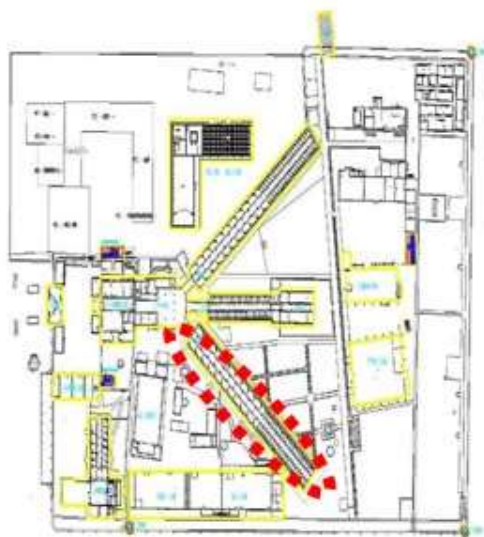

屋瓦拆除前

智舍



舍房門窗拆除之現況

智舍

※婦育館施作項目：

- 1.屋瓦、掛瓦條、防水油毛氈、椽木及桁條拆除。
- 2.屋面構架及門窗檢測。
- 3.原有門窗拆除。
- 4.天花板拆除。
- 5.鷹架施作。




施作前

婦育館



鐵皮屋瓦拆除後

婦育館

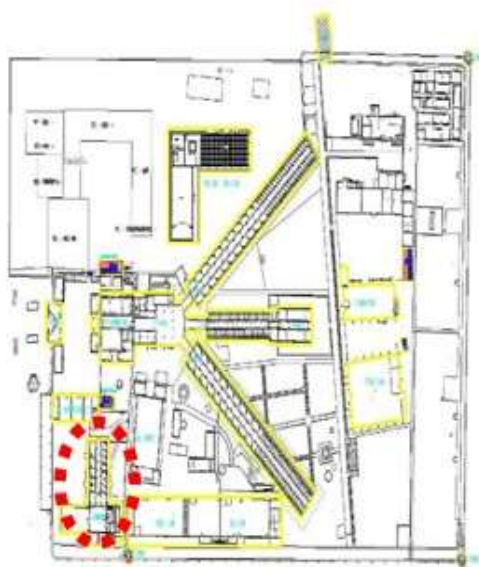

屋面板拆除後

婦育館



舍房門窗拆除之現況

婦育館

※門樓施作項目：

- 1.門窗檢測。
- 2.鷹架施作。



施作前

門樓



鷹架工程施作

門樓



施作前

門樓



鷹架工程施作

門樓

※日新堂施作項目：

1. 結構補強處粉刷層敲除。




施作前

日新堂



施作前

日新堂

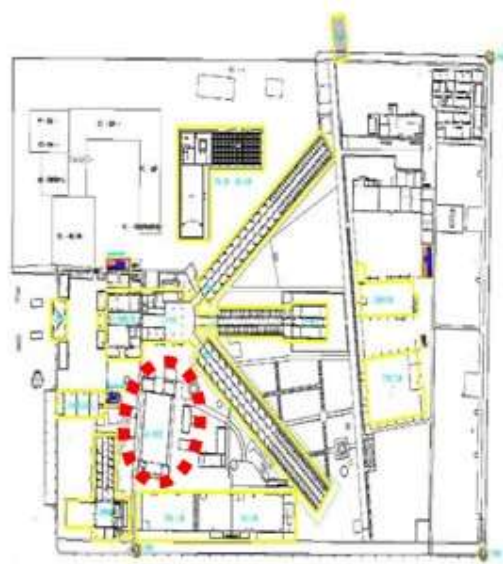

施作前

日新堂



結構補強處粉刷層敲除

日新堂

現場執行狀況(現況調查)

※現況調查：
確認現況損害情形
與契約數量



天花板現況調查

I棟 智舍



牆面現況調查

I棟 智舍




外觀現況調查

Q棟 第四工場



屋面現況調查

D棟 行政辦公室(一)

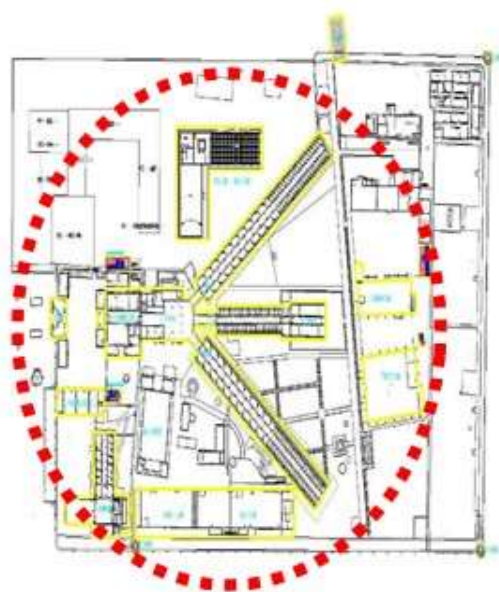

※現況調查：
確認現況損害情形
與契約數量



檢視判斷

D棟 行政辦公室(一)

現場執行狀況(屋瓦拆卸)



屋瓦分類

D棟 行政辦公室(一)



屋瓦堆置標示

D棟 行政辦公室(一)



屋瓦拆卸

D棟 行政辦公室(一)



※現況調查：
確認現況損害情形
與契約數量



使用老虎鉗去除釘帽

D棟 行政辦公室(一)



手工拆卸

D棟 行政辦公室(一)



現場分類拔釘

D棟 行政辦公室(一)



木襯板堆置標示

D棟 行政辦公室(一)

※防墜措施:

確保施作人員工作之安全性並防止人員及物品墜落



安全網鋪設

E棟 中央台



安全網鋪設

D棟 行政辦公室(一)




安全母索架設

N棟第一,二工場



安全母索架設

D棟 行政辦公室(一)

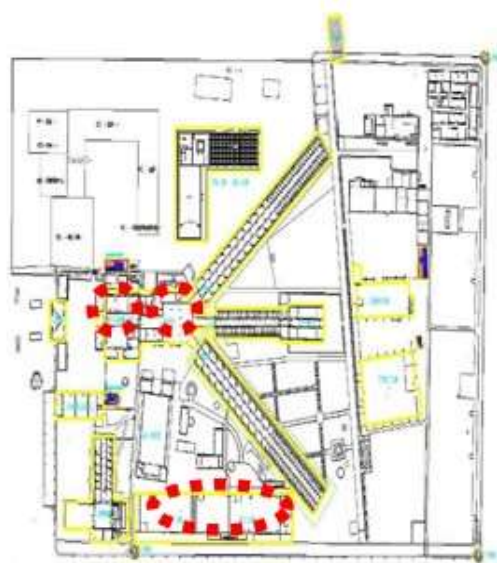

安衛執行狀況(環境消毒)

※環境消毒:

工區全面進行消毒防止
蚊蟲病媒等媒介之傳染



環境消毒

D棟 行政辦公室(一)



環境消毒

I棟 智舍



環境消毒

N棟 第一,二工場



屋面現況調查

K棟 中央台

※其他:
與勞工安全及衛生之
一切事宜



進場危害告知

工務所前籃球場



漏電斷路器設置

I棟 智舍



施工架防塵網

N棟 第一,二工場



開口端設置警示

外圍消防水池

簡報結束
謝謝指教
