




國定古蹟嘉義舊監獄修復工程



99.09.21工程進度簡報

預計進度27.84% 實際進度28.24% (至99/9/21止)

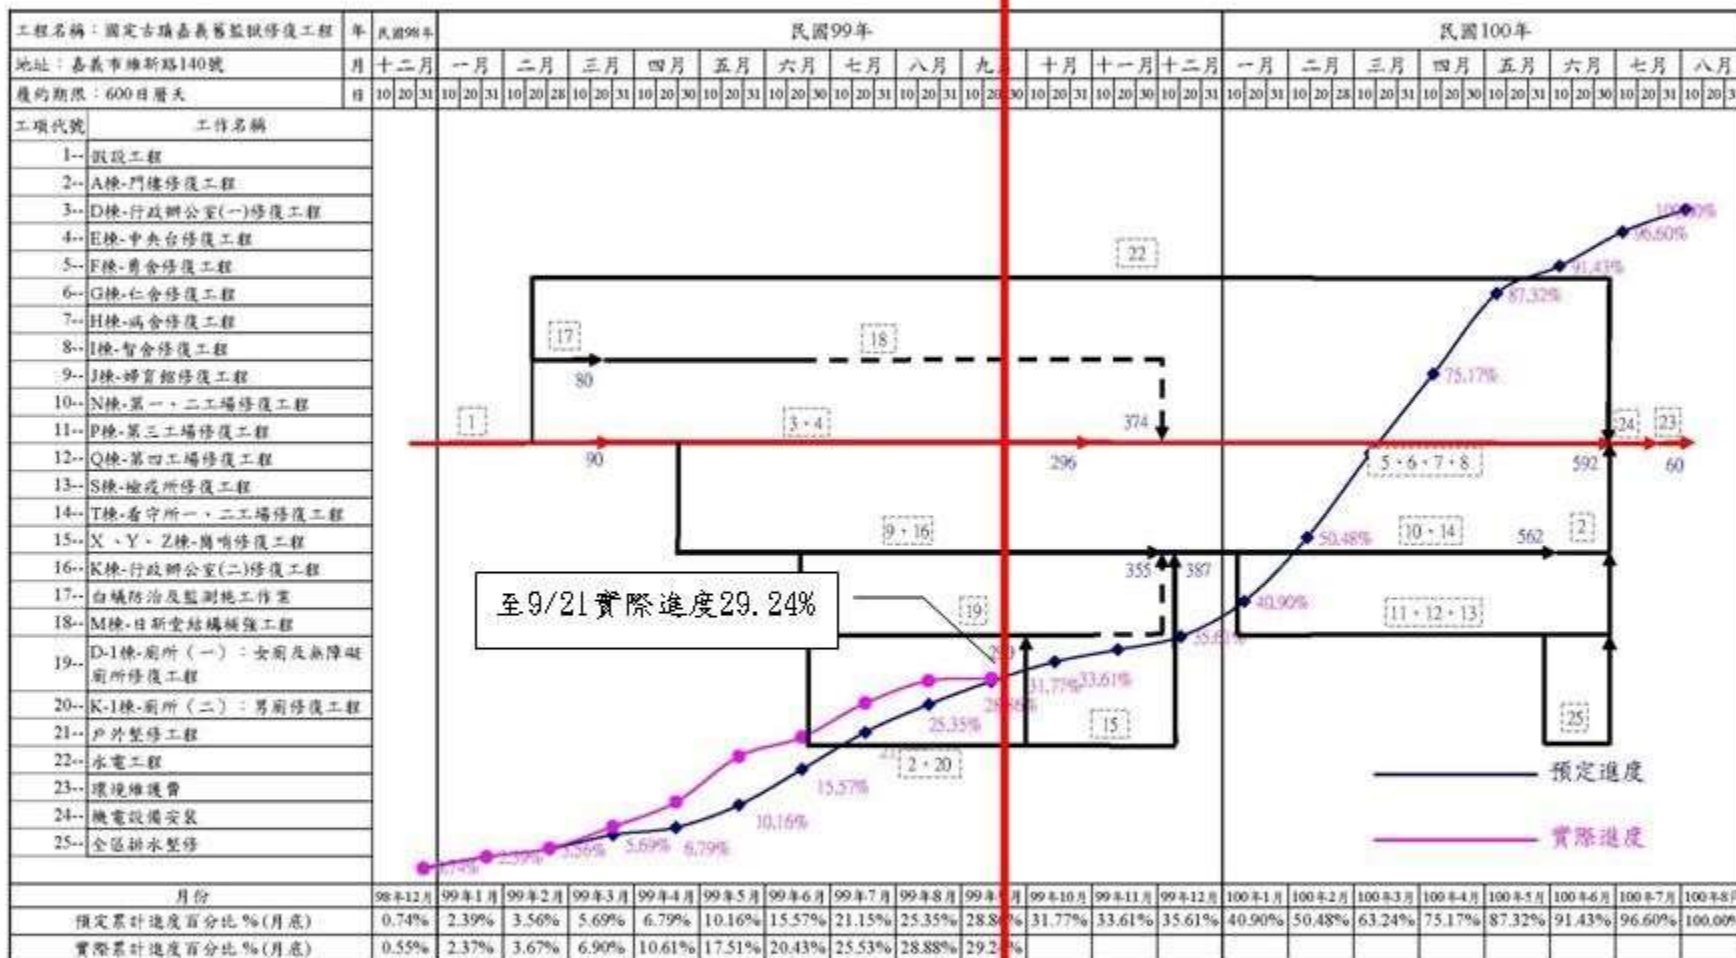

開工日期：98/12/18

備註：98/12/18-100/08/09 共600日曆天，不含相關免計工期。

目前進度

※門樓施作項目：

- 1.水電配管施作。
- 2.門窗整修仿作。



水電配管施作

門樓



水電配管施作

門樓



水電配管施作

門樓



洩水溝槽施作

門樓

※值日官室及會議室

施作項目：

1. 屋架整修仿作。
2. 門窗整修仿作。



屋架整修仿作


門樓

值日官室及會議室



門窗整修仿作

門樓

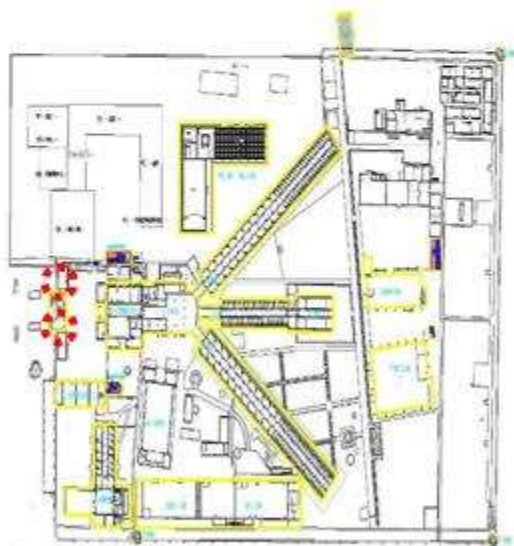

屋架整修仿作

門樓



門窗整修仿作

門樓

行政大樓(二)

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 雨淋板整修施作。
2. 編竹夾泥牆施作。
3. RA防水層施作。
4. 白灰壁施作。
5. 屋架護木油施作。
6. 屋面掛瓦條施作。




RA防水層施作

行政大樓(二)



屋面掛瓦條施作

行政大樓(二)

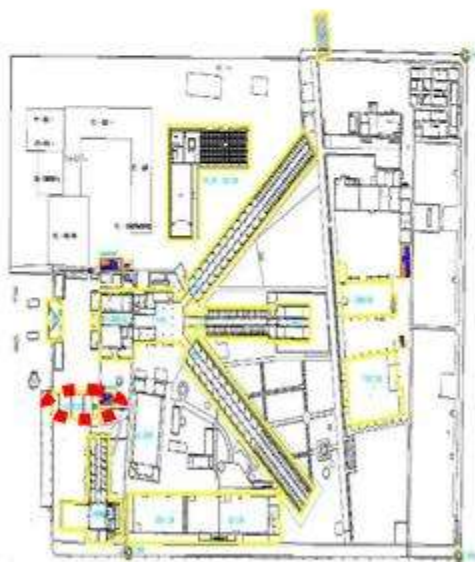

雨淋板整修

行政大樓(二)



白灰壁施作

行政大樓(二)

行政大樓(一)

※行政辦公室(一)施作項目：

1. 電氣配管施作。
2. 屋面板及屋面掛瓦條施作。
3. 白灰壁體鑿修。



屋面掛瓦條施作

行政大樓(一)



屋面板施作

行政大樓(一)



電氣配管

行政大樓(一)



白灰壁體鑿修

行政大樓(一)

※行政辦公室(一)施作項目：

1. 屋面拆除。
2. 雨淋板施作。
3. 屋面板施作




屋面板施作

女廁



屋面板施作

女廁

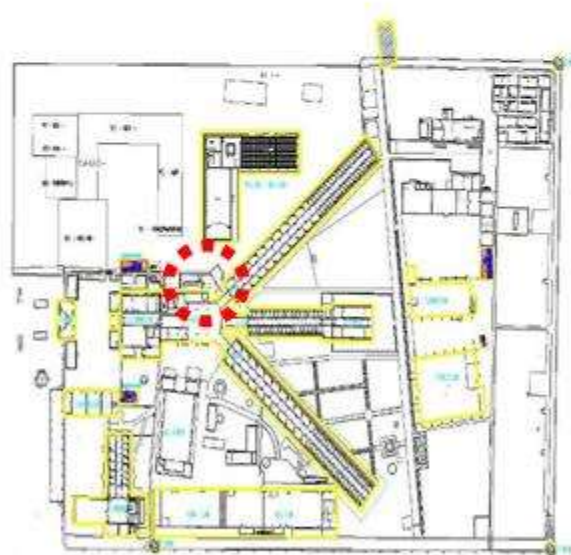

構件防鏽塗佈

女廁



雨淋板施作

女廁

※婦育館施作項目：

1. 屋面掛瓦條及屋瓦鋪設施作。
2. 天花板、雨淋板整修。
3. 門窗整修施作。
4. 編竹夾泥牆仿作。




屋面水泥瓦施作

婦育館



屋面水泥瓦施作

婦育館

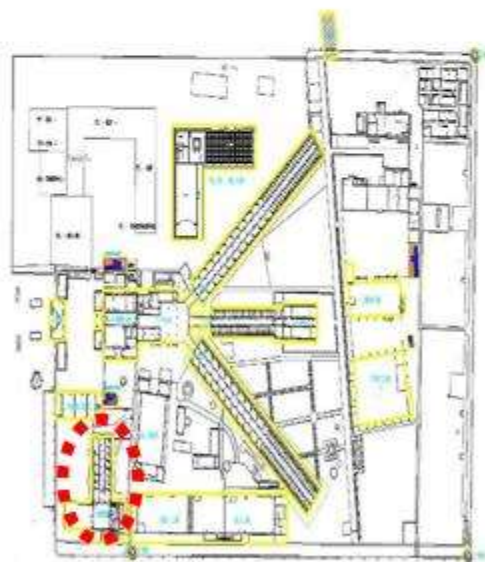

太子樓雨淋板施作

婦育館



門窗整修

婦育館

※日新堂施作項目：

1. 剪力牆及基礎板施作。
2. 屋面髒污清洗。




剪力牆施作

日新堂



剪力牆植筋施作

日新堂

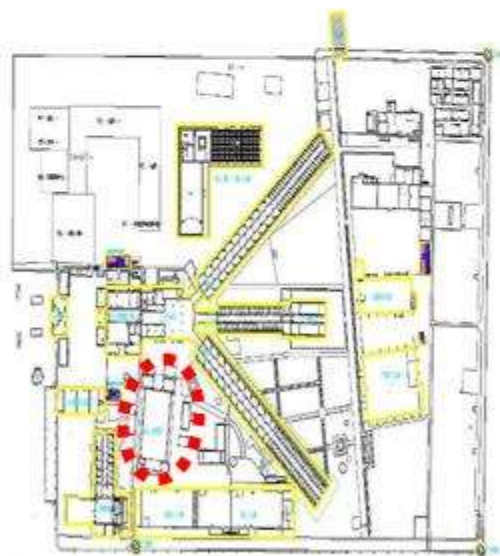

屋面高壓水柱清洗

日新堂



屋面高壓水柱清洗

日新堂

※中央台施作項目：

1. 屋面板安裝施作。
2. 漆食壁面施作。



屋面防水層施作

中央台



屋面掛瓦條施作

中央台




雨淋板修補施作

中央台



漆食壁壁體施作

中央台

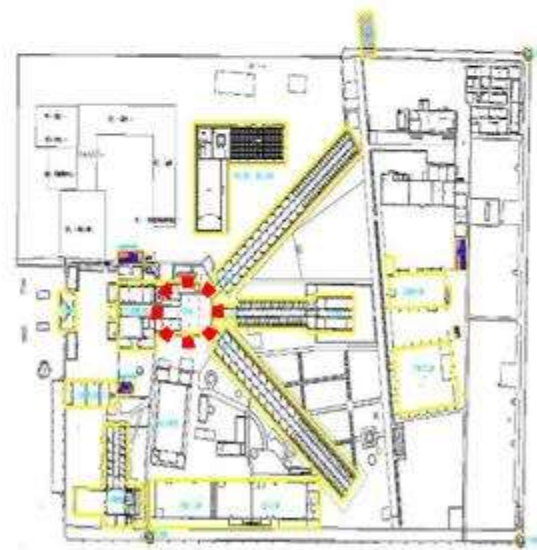

※智舍施作項目：

1. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。




舍房壁體鑿修施作

智舍



舍房壁體鑿修施作

智舍

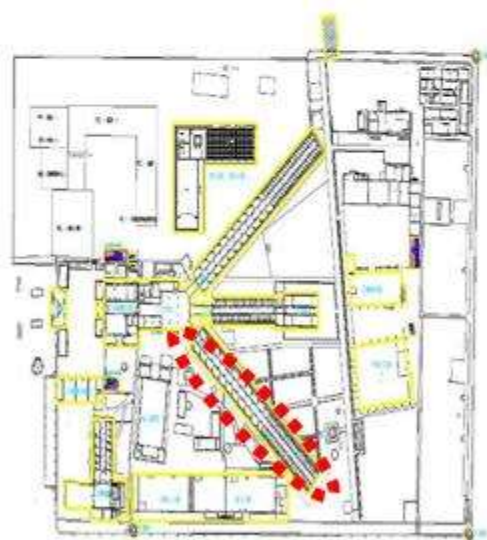

舍房壁體鑿修施作

智舍



舍房壁體粉刷施作

智舍

仁舍

※仁舍施作項目：

1. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。




舍房壁體鑿修施作

仁舍



漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍

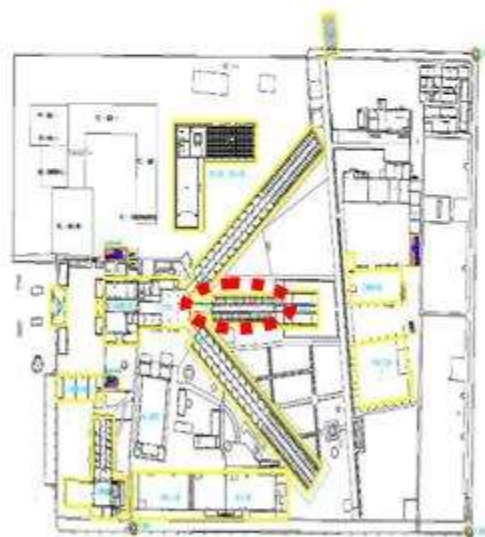

舍房壁體鑿修施作

仁舍




漆食壁壁體粉刷層施作

仁舍

※勇舍施作項目：

1. 舍房白灰壁體(鑿修)粉刷層施作。

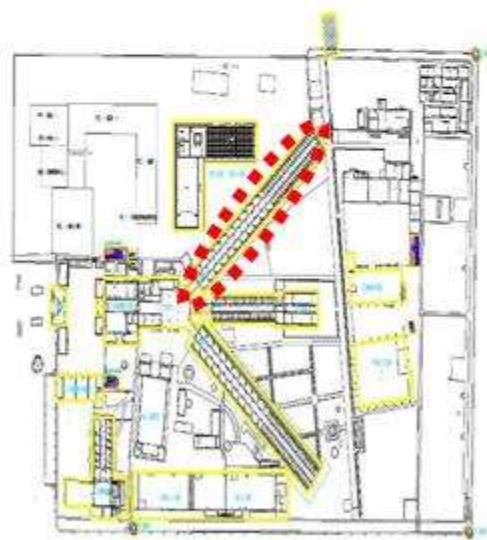

舍房外牆物理噴塗

勇舍



舍房門窗剝漆施作

勇舍



舍房白灰壁體粉刷層施作

勇舍



舍房壁體鑿修

勇舍

第一二工場

※第一二工場施作項目：

1. 木構架拆卸仿作。




木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場

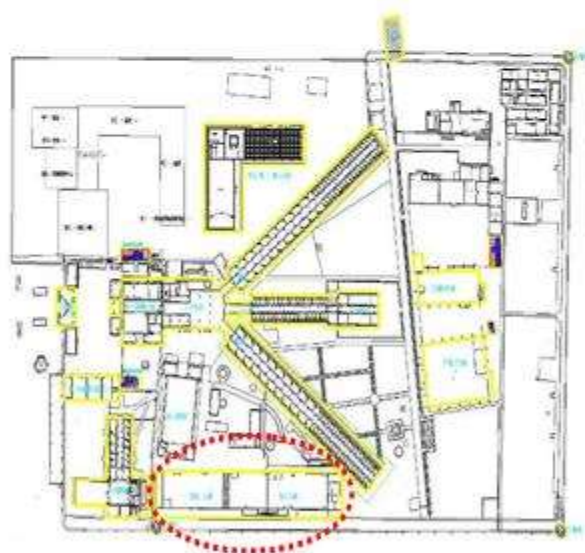

木構架拆卸整修仿作

第一二工場



木構架拆卸整修仿作

第一二工場

※第四工場施作項目：
1.屋架整修仿作。




屋架扶柱整修仿作

第四工場



屋架整修仿作

第四工場

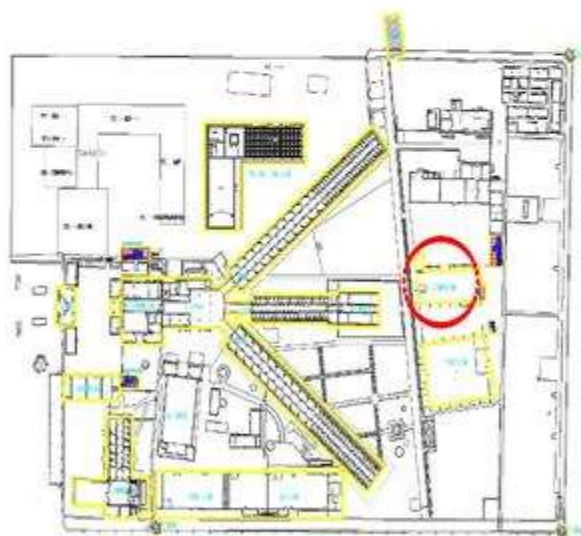

屋架整修仿作

第四工場



屋面板拆卸

第四工場

看守所第一二工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 木構架拆卸整修、仿作。
2. 牆面粉刷層修補施作。
3. 屋面桁木椽條施作。




牆面粉刷層修補施作

看守所第一二工場



木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場

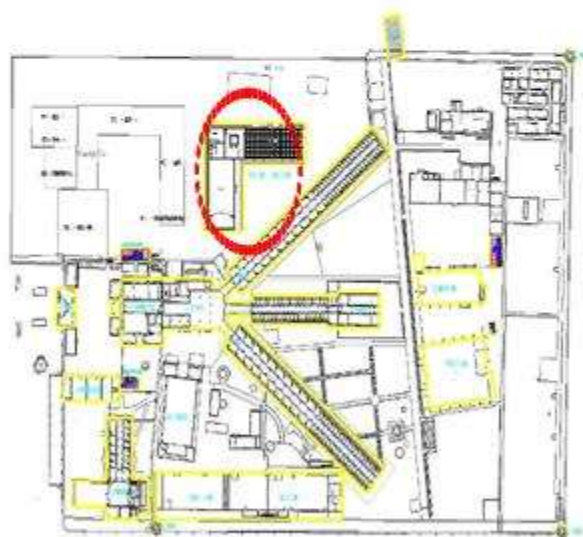

屋面桁木椽條施作

看守所第一二工場



雨遮整修檢修仿作

看守所第一二工場

※材料試作：

1. 白灰養灰。
2. 植筋拉拔試驗。



植筋拉拔試驗

材料試驗

材料試驗



植筋拉拔試驗

材料試驗



植筋拉拔試驗

材料試驗



植筋拉拔試驗

材料試驗

