國定古蹟嘉義舊監獄修復工程

99.08.26工程進度簡報

法務部

工作進度報告

預計進度24.2% 實際進度27.48%（至99/8/22止）

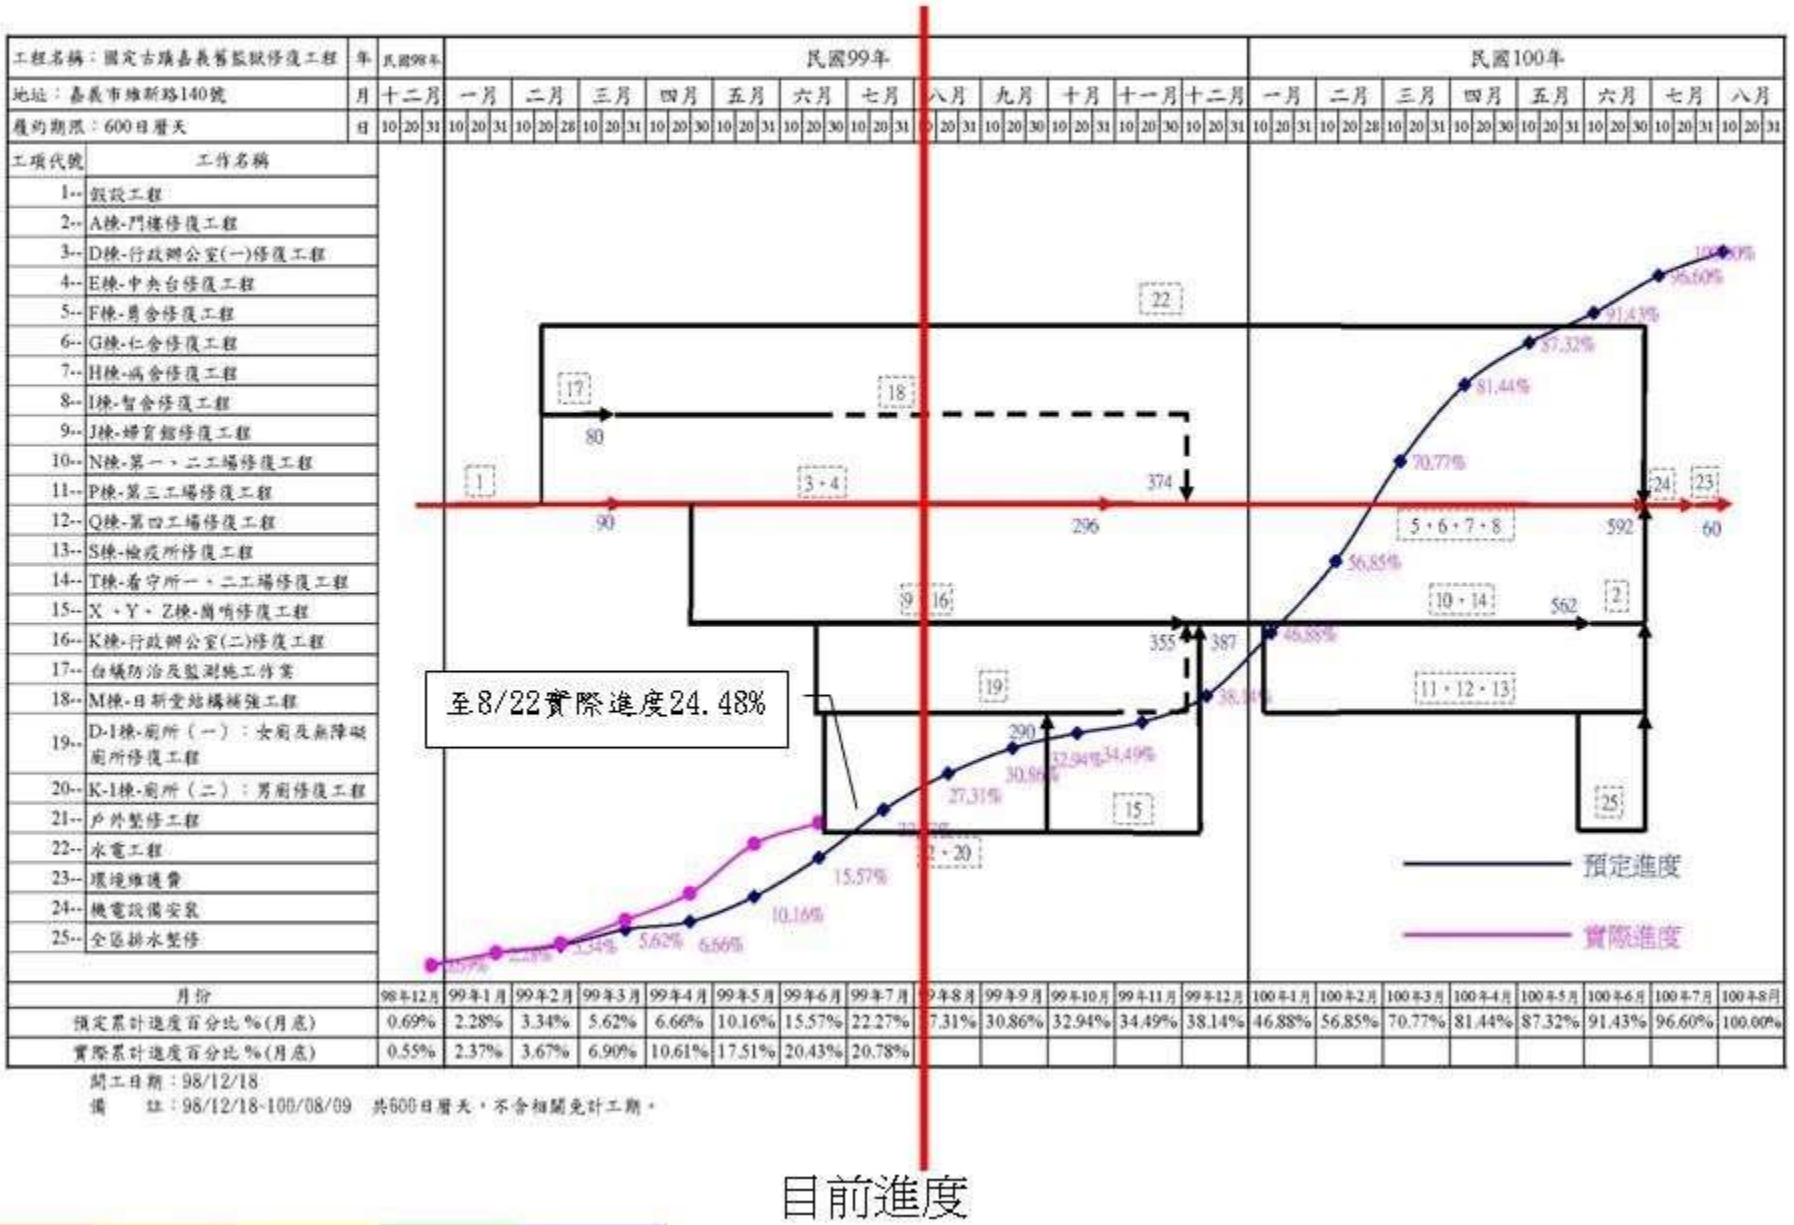

目前進度

※門樓施作項目：

1. 粉刷層浮凸敲除。
2. 鋼筋防鏽處理。
3. 水電配管施作。
4. 門窗整修仿作。
5. RA防水施作。

水電配管施作

門樓

門窗整修仿作

門樓

鋼筋防鏽處理

門樓

RA防水施作

門樓

行政大樓(二)

※行政辦公室(二)施作項目：

1. 雨淋板剝漆施作。
2. 編竹夾泥牆施作。
3. RA防水層施作。
4. 白灰壁施作。
5. 護木油施作。

RA防水層施作

行政大樓(二)

RA防水層施作

行政大樓(二)

雨淋板剝漆施作

行政大樓(二)

白灰壁施作

行政大樓(二)

行政大樓(一)

※行政辦公室(一)施作項目：
1. 門窗天花板剝漆施作。
2. 椽條及屋面板施作。
3. 白灰壁體整修。

屋架修補

行政大樓(一)

屋面板施作

行政大樓(一)

天花板剝漆

行政大樓(一)

白灰壁體整修

行政大樓(一)

婦育館

※婦育館施作項目：
1. 門窗護木油施作。
2. 編竹夾泥牆仿作。
3. 白灰壁體整修。
4. R.A防水層施作。

木編竹夾泥牆仿作

婦育館

R.A防水層施作

婦育館

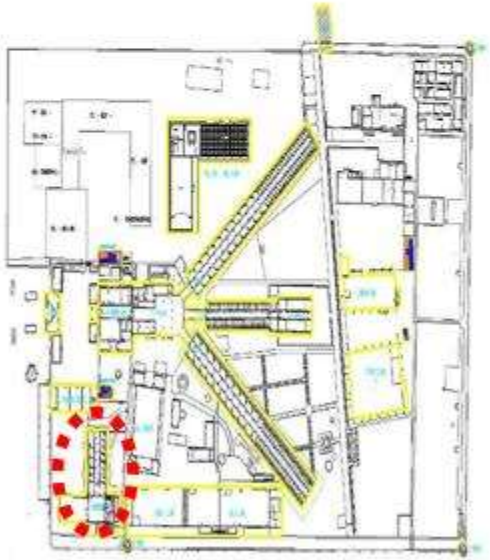

白灰壁體整修

婦育館

護木油塗刷

婦育館

日新堂

※日新堂施作項目：

1. 環氧樹脂補強。
2. 點焊鋼絲網施作。

粉刷層施作

日新堂

點焊鋼絲網焊接

日新堂

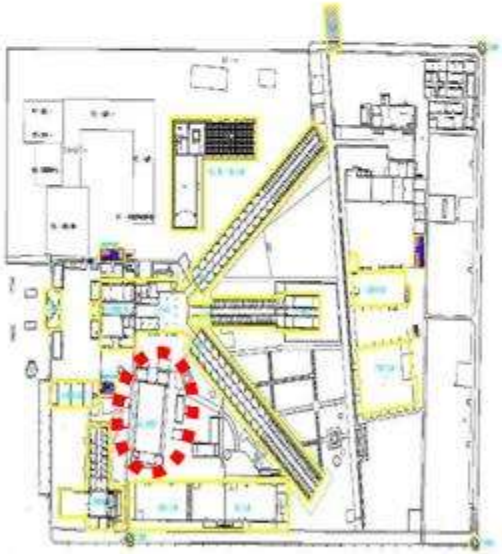

環氧樹脂補強

日新堂

環氧樹脂補強

日新堂

中央台

※中央台施作項目：
1. 門窗天花板剝漆施作。
2. 屋面板安裝施作。
3.漆食壁面施作。

天花板剝漆施作

中央台

漆食壁施作

中央台

銅皮屋瓦試作

中央台

屋面板安裝施作

中央台

※智舍施作項目：

1. 壁體整修施作。

舍房牆面防潮施作

智舍

舍房門窗剝漆施作

智舍

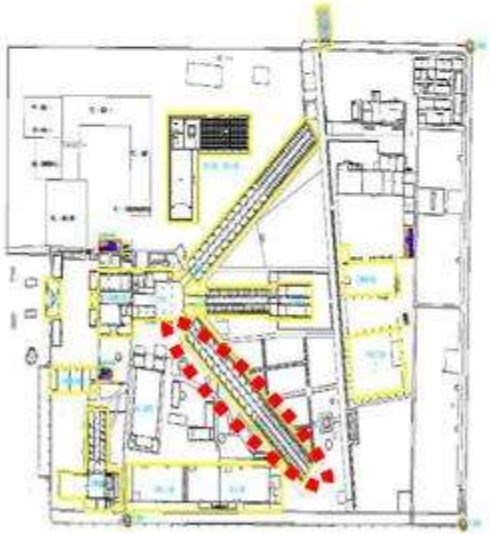

舍房壁體整修施作

智舍

舍房門窗剝漆施作

智舍

第一二工場

※第一二工場施作項目：
1. 牆面物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。
3. 木構架拆卸仿作。

牆面物理噴塗

第一二工場

門窗剝漆施作

第一二工場

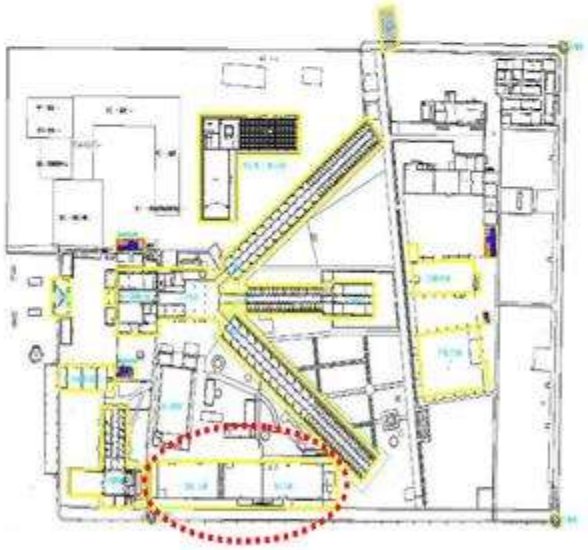

木構架拆卸整修仿作

第一二工場

木構架拆卸整修仿作

第一二工場

第三工場

※第三工場施作項目：

1. 外牆物理噴塗。
2. 門窗剝漆施作。

門窗剝漆施作

第三工場

外牆物理噴塗

第三工場

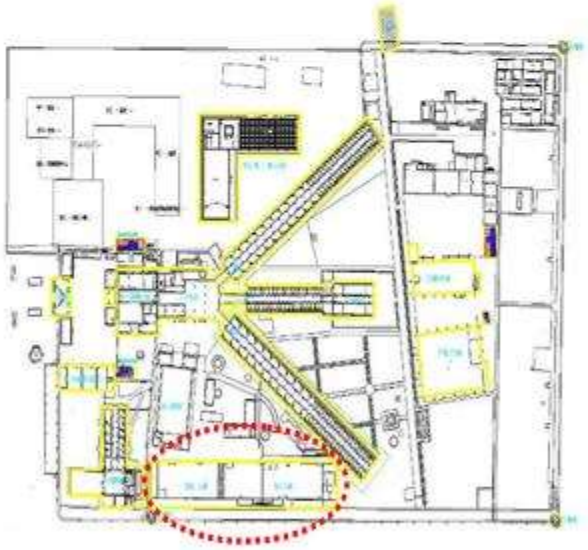

門窗剝漆施作

第三工場

外牆物理噴塗

第三工場

看守所第一二工場

※看守所第一二工場施作項目：

1. 木構架拆卸整修、仿作。

木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場

木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場

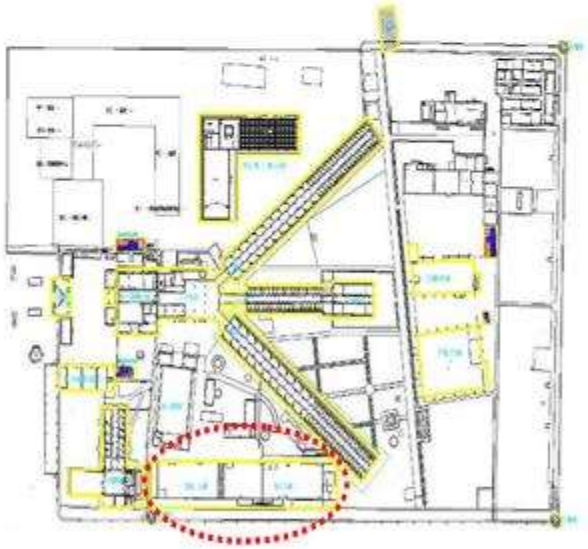

木構架拆卸整修、仿作

看守所第一二工場

雨遮整修檢修仿作

看守所第一二工場

材料試作

※材料試作：

1. 屋瓦樣品試作。
2. 白灰養灰。

編竹夾泥牆

工料進場

白灰養灰

工料進場

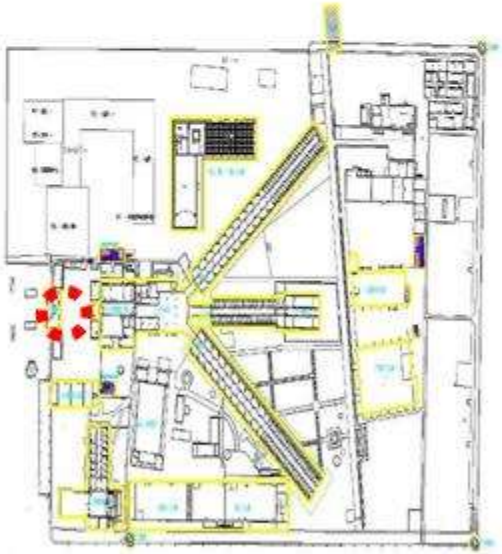

屋瓦試作

工料進場

化學螺栓

工料進場
