「國定古蹟-嘉義舊監獄」舊監獄附屬建物修繕工程

預定進度37.87% 實際進度37.87%(至10/19止)

項次	工作項目	金額(元)	權重	工期日曆天	工期 開始	工期 結束
壹	發包工程費	37,594,870	100.00%			
壹.一	假設工程					
壹.一.2	工地臨時建築設施，工務所設備	237,450	0.63%	22	3月10日	3月31日
壹.一.16	施工輔助設施，施工架	1,915,731	5.10%	30	4月1日	4月30日
壹.一.17	施工輔助設施，臨時防雨棚架	742,645	1.98%	31	5月1日	5月31日
	其他相關假設工程	2,003,406	5.33%	578	4月1日	10月30日
壹.二	拆除工程	2,326,141	6.19%	169	5月16日	12月31日
壹.三	Q2教區					
壹.三.1	結構補強工程	6,810	0.02%	16	8月16日	8月31日
壹.三.2~5	木作及屋頂工程	1,327,987	3.53%	61	9月1日	10月31日
壹.三.6	蟲蟻防治工程	41,879	0.11%	15	10月1日	10月15日
壹.三.7~10	機電工程	288,870	0.77%	30	11月1日	11月30日
壹.四	R營繕倉庫					
壹.四.1~4	木作及屋頂工程	9,078,743	24.15%	334	6月16日	5月15日
壹.四.5	蟲蟻防治工程	373,436	0.99%	61	10月1日	11月1日
壹.四.6~7	機電工程	255,557	0.68%	61	3月16日	5月15日
壹.五	S炊場					
壹.五.1	結構補強工程	40,799	0.11%	15	6月16日	6月30日
壹.五.2	圬工及裝修工程	1,846,104	4.91%	61	6月16日	8月15日
壹.五.3	木門窗修復工程	713,875	1.90%	31	8月16日	9月15日
壹.五.4~5	機電工程	521,512	1.39%	61	9月16日	11月15日
壹.六	T管理宿舍					
壹.六.1	結構補強工程	146,705	0.39%	31	7月16日	8月15日
壹.六.2	圬工及裝修工程	967,816	2.57%	61	8月16日	10月15日
壹.六.3	屋頂整修工程	387,065	1.03%	31	8月16日	9月15日
壹.六.4	木門窗修復工程	447,999	1.19%	31	10月16日	11月15日
壹.六.4~5	機電工程	180,839	0.48%	30	11月15日	12月15日
壹.七	U廁所					
壹.七.1	結構補強	74,018	0.20%	30	9月15日	9月30日
壹.七.2	圬工及裝修工程	584,357	1.55%	30	11月16日	12月15日
壹.七.3	屋頂工程	470,693	1.25%	46	10月1日	11月15日
壹.七.4	蟲蟻防治工程	75,000	0.20%	16	10月16日	10月31日
壹.七.5	門窗修復工程	116,404	0.31%	31	12月16日	1月15日
壹.七.6~9	機電工程	544,577	1.45%	31	1月16日	2月15日
壹.八	V廁所	424,208	1.13%	28	2月16日	3月15日
壹.九	W豬舍	224,349	0.60%	31	3月16日	4月15日
壹.十	庭園景觀	1,389,634	3.70%	91	8月1日	10月30日
壹.十一	本區配管工程	2,003,792	5.33%	122	4月1日	7月31日
壹.十二	本區消防設備工程	2,325,988	6.19%	122	4月1日	7月31日
	利潤、管理費及稅金其他	5,510,481	14.66%	600	4月1日	10月30日

年度	114										115										
月份	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
日期	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	20
累計工期	22	52	83	113	144	175	205	236	266	297	328	352	383	413	444	474	505	536	566	596	617

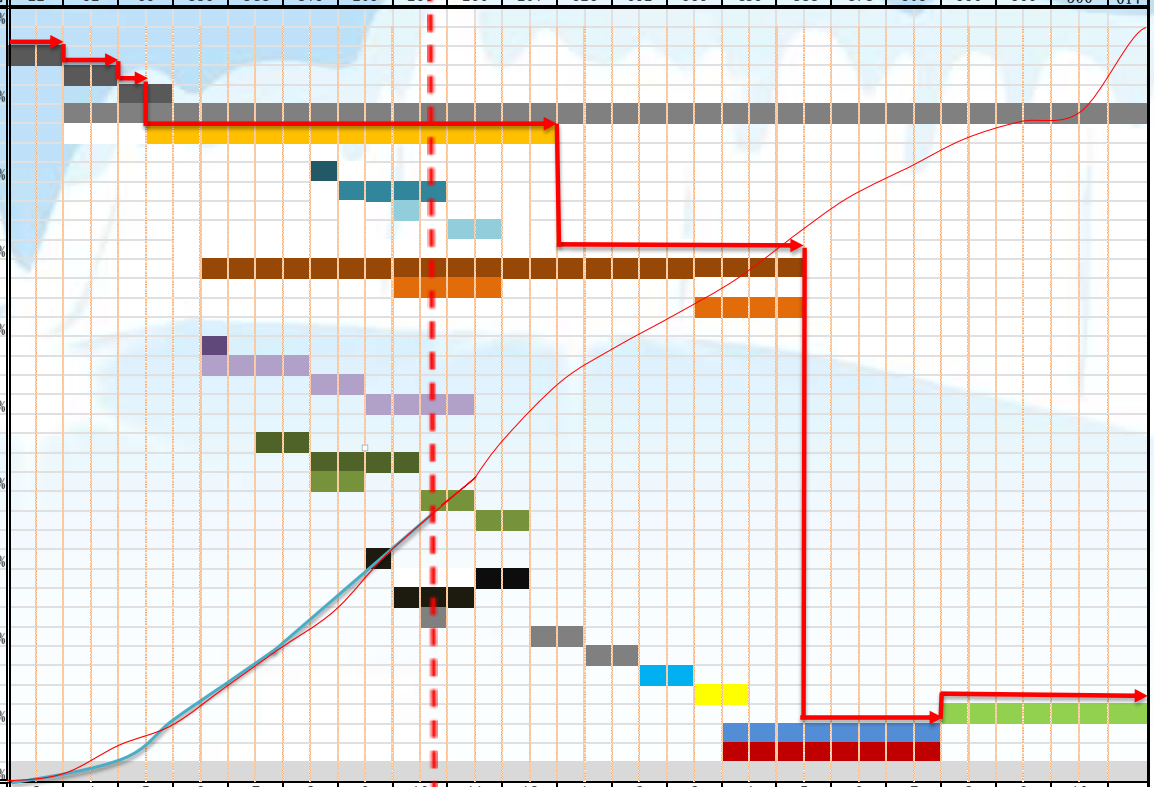

月份	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
預定進度%	1.35%	6.10%	3.39%	4.24%	6.65%	2.68%	9.07%	9.38%	7.71%	5.23%	4.10%	4.51%	4.26%	6.72%	5.16%	3.91%	3.92%	2.23%	2.24%	2.24%	5.77%
累計進度%	1.35%	7.45%	10.84%	15.08%	20.87%	23.55%	32.62%	42.00%	49.71%	54.94%	59.04%	63.55%	67.81%	74.53%	79.69%	83.60%	87.52%	89.75%	91.99%	94.23%	100.00%
累計金額																					
實際進度%	1.01%	2.15%	7.74	4.35	5.7	3.26	8.45														
累計進度%	1.01%	3.16%	10.9	15.25	20.95	24.21	32.66														

預定進度　　實際進度

要 徑　　預定進度　　實際進度

保護棚架

木架拆卸

保護棚架

桁架上漆
